



REGISTRO DE REUNIÃO

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DAS SOLUÇÕES PARA OS PROBLEMAS DE INTERFERÊNCIA NA FAIXA DE 3.625 A 3.700 MHZ - GAISPI

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GAISPI

Data	Horário de Início	Horário de Término	Local
26 de novembro de 2024	08:54	10:05	Plataforma Teams

1. PARTICIPANTES
- 1.1. Membros do GAISPI:

FUNÇÃO	MEMBRO	NOME	Presente na reunião?
Presidente do GAISPI	-	Carlos Manuel Baigorri	NÃO
Secretário Executivo do GAISPI	-	Vinícius Oliveira Caram Guimarães	SIM
Representante do Ministério das Comunicações	Titular	Hermano Barros Tercius	NÃO
	Suplente	Wilson Diniz Wellisch	SIM
Representantes da Proponentes Vencedoras dos Lotes do Tipo B	Titular	Antônio Oscar de Carvalho Petersen	NÃO
	Suplente	Monique Pereira Ibitinga de Barros	SIM
	Titular	Camilla Tedeschi de Toledo Tapias	NÃO
	Suplente	Anderson Emanuel de Azevedo Gonçalves	SIM
	Titular	Mario Girasole	NÃO
	Suplente	Marcelo Concolato Mejias	SIM
Representantes dos Radiodifusores	Titular	Flavio Ferreira de Lara Resende	NÃO
	Suplente	Cristiano Reis Lobato Flores	NÃO
	Titular	Samir Amando Granja Nobre Maia	NÃO
	Suplente	Wender Almeida de Souza	NÃO
	Titular	Luiz Carlos Abrahão	SIM
	Suplente	Carlos Eduardo Neiva Melo	NÃO
Representantes das Exploradoras de Satélites	Titular	Lincoln Amazonas Antunes de Oliveira	SIM
	Suplente	Michelle Machado Caldeira	SIM
	Titular	Fabio Franco Costa de Alencar	SIM
	Suplente	Luis Fernando Barros Costa Fernandes	NÃO
	Titular	Márcio André de Assis Brasil	SIM
	Suplente	Rodrigo Soares Campos	SIM
Representantes das Proponentes Vencedoras dos Lotes C1 a C8 e D1 a D32	Titular	José Roberto Nogueira	NÃO
	Suplente	Katia Costa da Silva Pedroso	NÃO
	Titular	Margaret de Almeida Cadête Moonsammy	SIM
	Suplente	Wagner Zanini Barreira	SIM
	Titular	Vítor Elísio Góes de Oliveira Menezes	SIM

FUNÇÃO	MEMBRO	NOME	Presente na reunião?
	Suplente	Mariana Rezende	NÃO

1.2. Outros Participantes:

Nome	Órgão/Instituição/Empresa
Chirlene Silva	Anatel (terceirizada)
Sidney Nince	Anatel
Henrique Gomes Pinheiro	Anatel/APC - Coordenador do GT-COM
Leandro Enrique Lobo Guerra	EAF
Patrícia de Oliveira Abreu	EAF
Paula Fontelles do Valle	Anatel
Marcos Vieira Baeta Neves	Anatel/SOR -Coordenador do GT-REDE
Paulo Roberto Cruz Cozza	EAF
Sebastiao Sergio de Oliveira Junior	TIM
Dulcidio Elias Oliveira Pedrosa	EAF
Túlio Miranda Barros	Anatel
Rogério Adriano Fernandes	Anatel
Marcos Vinicius Ramos da Cruz	Anatel
Afonso Rocha Ferreira Junior	Anatel
Antonio Parrini Pimenta	EAF
Antonio Celso Guimaraes Teixeira	MCom
Silvio Artur Meira Starling	EAF

2. PAUTA

Item	Descrição
1	ITEM 1 DA PAUTA: APROVAÇÃO DA ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024.
2	ITEM 2 DA PAUTA: INFORME DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE ADMINISTRADORA DA FAIXA DE 3,5 GHz (EAF).
3	ITEM 3 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE MIGRAÇÃO E MITIGAÇÃO – GT-MIGRAÇÃO.
4	ITEM 4 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO SOBRE A ANTECIPAÇÃO DE CIDADES PARA A LIBERAÇÃO DO USO DA FAIXA DE RADIOFREQUÊNCIAS DE 3.300 MHZ A 3.700 MHZ.
5	ITEM 5 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DO PROGRAMA AMAZÔNIA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL – GT-PAIS.
6	ITEM 6 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE REDE PRIVATIVA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL – GT-REDE.
7	ITEM 7 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO – GT-COM.
8	ITEM 8 DA PAUTA: OUTROS ASSUNTOS.
9	ITEM 9 DA PAUTA: DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZEMBRO DE 2024.

3. RELATO DA REUNIÃO

Item	Descrição
Saudação	Inicialmente, o Secretário Executivo do GAISPI, Sr. Vinícius Oliveira Caram Guimarães , deu boas-vindas e agradeceu a presença de todos e informou que devido à excepcional ausência do Presidente do GAISPI, Sr. Carlos Manuel Baigorri , que se encontraria em missão internacional e que, conforme a previsão do art. 15 do Regimento Interno, faria a sua substituição nesta Reunião.
1	O Secretário Executivo do GAISPI informou que a EAF solicitou a substituição do <i>slide</i> 23 da apresentação do Informe da entidade e que, desta forma, a Secretaria Executiva do GAISPI fez o ajuste, incorporando-o na Ata dessa Reunião para que fosse feita essa correção de erro material. Registrou que a informação trazida pela EAF no referido <i>slide</i> sobre os alvarás no tópico de <i>Backbones</i> Terrestres, fazia menção aos à emissão de alvarás pelas prefeituras de Mucajaí e de Caracaraí, quando, na verdade, foram emitidos alvarás apenas pela Prefeitura de Caracaraí. Tendo sido feito o devido ajuste no documento apresentado, questionou os membros do GAISPI se poderiam seguir com a aprovação da Ata com essa correção. Não havendo manifestações, o Secretário Executivo do GAISPI declarou que fica aprovada a Ata da 33ª Reunião Ordinária do GAISPI. Determinou à Secretaria Executiva do GAISPI que efetuasse a devida alteração da minuta anteriormente circulada e que registrasse a nova Ata aprovada nesta Reunião. Concluída a deliberação, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 2 da Pauta.
2	O Secretário Executivo do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Leandro Guerra, para que fizesse o relato das atividades da EAF. O Sr. Leandro Guerra cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes e passou a projetar uma apresentação, cuja agenda do Informe das atividades da EAF abordou os seguintes itens: 1. Migração TVRO; 2. Conclusão Fase VI; 3. Municípios com limpeza da faixa 3,5 GHz concluída; 4. Planejamento TVRO – Plano de Aceleração de Instalação; 5. Projeto PAIS; 6. Projeto Rede Privativa de Governo; 7. Compras Sobre o primeiro item de sua agenda, <u>Migração TVRO</u>, o Sr. Leandro Guerra projetou o <i>slide</i> abaixo reproduzido que apresenta um gráfico que mostra a evolução das instalações de TVRO na Banda Ku:

Item	Descrição																																																																																																
	1. Migração TVRO – Acumulado Instalações Realizadas (26/11/24) The slide displays a map of Brazil with regional percentages: Norte (14%), Nordeste (70%), Centro Oeste (4%), Sudeste (9%), and Sul (3%). Below the map is a line chart showing cumulative installations from Jan/22 to Nov/24. The chart shows a steady increase, reaching 4,400,000 by Nov/24, with a target of 4,420K (Nov/24) indicated by a yellow box. The EAF logo is at the bottom right. <table><caption>Cumulative Installations (Estimated from Chart)</caption><tr><th>Month</th><th>Installations</th></tr><tr><td>Jan/22</td><td>119</td></tr><tr><td>Jul/22</td><td>1,468</td></tr><tr><td>Jan/23</td><td>4,725</td></tr><tr><td>Jul/23</td><td>9,577</td></tr><tr><td>Jan/24</td><td>14,154</td></tr><tr><td>Jul/24</td><td>35,250</td></tr><tr><td>Jan/25</td><td>59,831</td></tr><tr><td>Jul/25</td><td>95,438</td></tr><tr><td>Jan/26</td><td>14,202</td></tr><tr><td>Jul/26</td><td>32,039</td></tr><tr><td>Jan/27</td><td>376,862</td></tr><tr><td>Jul/27</td><td>4,737</td></tr><tr><td>Jan/28</td><td>711,665</td></tr><tr><td>Jul/28</td><td>932,720</td></tr><tr><td>Jan/29</td><td>1,325,715</td></tr><tr><td>Jul/29</td><td>1,555,471</td></tr><tr><td>Jan/30</td><td>1,458,334</td></tr><tr><td>Jul/30</td><td>1,633,152</td></tr><tr><td>Jan/31</td><td>1,881,471</td></tr><tr><td>Jul/31</td><td>2,112,249</td></tr><tr><td>Jan/32</td><td>2,378,295</td></tr><tr><td>Jul/32</td><td>2,650,314</td></tr><tr><td>Jan/33</td><td>2,920,208</td></tr><tr><td>Jul/33</td><td>3,185,997</td></tr><tr><td>Jan/34</td><td>3,414,429</td></tr><tr><td>Jul/34</td><td>3,599,248</td></tr><tr><td>Jan/35</td><td>3,862,537</td></tr><tr><td>Jul/35</td><td>4,132,916</td></tr><tr><td>Nov/24</td><td>4,400,000</td></tr></table> No tocante ao <i>slide</i> acima, o Sr. Leandro Guerra destacou que a EAF superou, em 26 de novembro de 2024, a marca de 4.400.000 milhões de instalações, afirmando que a expectativa da entidade é chegar até o dia 30 de novembro de 2024 na marca 4.420.000 milhões de instalações, em ritmo bastante acelerado. Ressaltou ainda que, do lado direito do slide, é possível ver a distribuição com uma concentração grande de instalações na Região Nordeste, seguido pelo Norte, Sudoeste, Centro-Oeste e Sul, com seus respectivos percentuais. O Sr. Leandro Guerra passou para o segundo item de sua agenda, <u>Conclusão da Fase 6</u>, mostrando o cronograma que vem atualizando mensalmente, ressaltando que se encontra na Fase 6-F, que corresponde a 190 municípios do estado da Bahia que, com a deliberação de hoje, alcançarão então 100% dos municípios com a limpeza da faixa realizada e com a liberação para uso da faixa de 3,5 GHz, como se mostra na imagem abaixo da evolução do projeto: 2. Conclusão Fase VI The slide shows a timeline for the conclusion of Phase VI, from 13/11/24 to 04/11/24. It includes a bar chart for 'Fases V e VI' and a table for 'Etapas' (Stages) A through F. The EAF logo is at the bottom right. <table><caption>Timeline of Phase VI Conclusion</caption><tr><th>Stage</th><th>Start Date</th><th>End Date</th><th>Status</th></tr><tr><td>A</td><td>13/11/24</td><td>08/04/24</td><td>Completed</td></tr><tr><td>B</td><td>08/04/24</td><td>05/05/24</td><td>Completed</td></tr><tr><td>C</td><td>05/05/24</td><td>10/05/24</td><td>Completed</td></tr><tr><td>D</td><td>10/05/24</td><td>01/07/24</td><td>Completed</td></tr><tr><td>E</td><td>01/07/24</td><td>15/07/24</td><td>Completed</td></tr><tr><td>F</td><td>15/07/24</td><td>02/08/24</td><td>Completed</td></tr><tr><td>G</td><td>02/08/24</td><td>01/10/24</td><td>Completed</td></tr><tr><td>H</td><td>01/10/24</td><td>04/11/24</td><td>Completed</td></tr></table> Sobre o Cronograma Macro, o Sr. Leandro Guerra lembrou que as instalações da TVRO se estenderão, conforme deliberação nesta 33ª Reunião Ordinária do GAISPI, até 29 de junho de 2025. Passando para o terceiro item sua agenda, <u>Municípios com Limpeza da Faixa Concluída</u>, o Sr. Leandro Guerra projetou o seguinte <i>slide</i> que detalha a atual Fase 6-F e mostra os 190 municípios, todos do estado da Bahia, distribuídos conforme o seu perfil populacional:	Month	Installations	Jan/22	119	Jul/22	1,468	Jan/23	4,725	Jul/23	9,577	Jan/24	14,154	Jul/24	35,250	Jan/25	59,831	Jul/25	95,438	Jan/26	14,202	Jul/26	32,039	Jan/27	376,862	Jul/27	4,737	Jan/28	711,665	Jul/28	932,720	Jan/29	1,325,715	Jul/29	1,555,471	Jan/30	1,458,334	Jul/30	1,633,152	Jan/31	1,881,471	Jul/31	2,112,249	Jan/32	2,378,295	Jul/32	2,650,314	Jan/33	2,920,208	Jul/33	3,185,997	Jan/34	3,414,429	Jul/34	3,599,248	Jan/35	3,862,537	Jul/35	4,132,916	Nov/24	4,400,000	Stage	Start Date	End Date	Status	A	13/11/24	08/04/24	Completed	B	08/04/24	05/05/24	Completed	C	05/05/24	10/05/24	Completed	D	10/05/24	01/07/24	Completed	E	01/07/24	15/07/24	Completed	F	15/07/24	02/08/24	Completed	G	02/08/24	01/10/24	Completed	H	01/10/24	04/11/24	Completed
Month	Installations																																																																																																
Jan/22	119																																																																																																
Jul/22	1,468																																																																																																
Jan/23	4,725																																																																																																
Jul/23	9,577																																																																																																
Jan/24	14,154																																																																																																
Jul/24	35,250																																																																																																
Jan/25	59,831																																																																																																
Jul/25	95,438																																																																																																
Jan/26	14,202																																																																																																
Jul/26	32,039																																																																																																
Jan/27	376,862																																																																																																
Jul/27	4,737																																																																																																
Jan/28	711,665																																																																																																
Jul/28	932,720																																																																																																
Jan/29	1,325,715																																																																																																
Jul/29	1,555,471																																																																																																
Jan/30	1,458,334																																																																																																
Jul/30	1,633,152																																																																																																
Jan/31	1,881,471																																																																																																
Jul/31	2,112,249																																																																																																
Jan/32	2,378,295																																																																																																
Jul/32	2,650,314																																																																																																
Jan/33	2,920,208																																																																																																
Jul/33	3,185,997																																																																																																
Jan/34	3,414,429																																																																																																
Jul/34	3,599,248																																																																																																
Jan/35	3,862,537																																																																																																
Jul/35	4,132,916																																																																																																
Nov/24	4,400,000																																																																																																
Stage	Start Date	End Date	Status																																																																																														
A	13/11/24	08/04/24	Completed																																																																																														
B	08/04/24	05/05/24	Completed																																																																																														
C	05/05/24	10/05/24	Completed																																																																																														
D	10/05/24	01/07/24	Completed																																																																																														
E	01/07/24	15/07/24	Completed																																																																																														
F	15/07/24	02/08/24	Completed																																																																																														
G	02/08/24	01/10/24	Completed																																																																																														
H	01/10/24	04/11/24	Completed																																																																																														

[illegible]

Item	Descrição																																																																
	Por fim, o Sr. Leandro Guerra projetou o <i>slide</i> que apresenta um panorama geral de liberação da faixa de 3,5 GHz, abaixo reproduzido, que mostra os 5.570 municípios, ou seja 100% do território nacional, com a limpeza da faixa concluída, considerando a deliberação a ser tomada na presente Reunião Ordinária, ressaltando que a conclusão desta fase se deu um ano e dois meses antes do cronograma previsto no Edital, a saber, janeiro de 2026: 3. Liberação Faixa 3,5 GHz (26/11/2024) – 100% do território concluído ✓ REALIZADO - EDITAL <table><tr><th>Fase</th><th>Realizado</th><th>100%</th><th>100%</th></tr><tr><td>Fase I (Finalizada)</td><td>27 Municípios até 26/10/23</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>Fase II (Finalizada)</td><td>26 Municípios até 03/03/23</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>Fase III (Finalizada)</td><td>102 Municípios até 30/06/23</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>Fase IV (Finalizada)</td><td>171 Municípios até 30/06/24</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>Fase V (Finalizada)</td><td>648 Municípios até 03/01/26</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>Fase VI (Finalizada)</td><td>4.396 Municípios</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>Total</td><td>5.570 Municípios</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table> DELIBERAÇÃO - EDITAL <table><tr><th>Fase</th><th>Realizado</th><th>100%</th><th>100%</th></tr><tr><td>Fase I (Finalizada)</td><td>27 Municípios até 26/10/23</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>Fase II (Finalizada)</td><td>26 Municípios até 03/03/23</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>Fase III (Finalizada)</td><td>102 Municípios até 30/06/23</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>Fase IV (Finalizada)</td><td>171 Municípios até 30/06/24</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>Fase V (Finalizada)</td><td>648 Municípios até 03/01/26</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>Fase VI (Finalizada)</td><td>4.396 Municípios</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>Total</td><td>5.570 Municípios</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table> Legenda ✓ Gerente com a liberação dos 190 municípios da Fase VI-F totalizando 5.570 municípios Dando prosseguimento ao seu informe, o Sr. Leandro Guerra passou para o quarto item, <u>Planejamento TVRO – Plano de Aceleração de Instalação</u>, e exibiu o gráfico abaixo reproduzido, reforçando que já vem sendo projetado em Reuniões do GAISPI desde o ano passado: 4. Planejamento TVRO – Plano de Aceleração de Instalação INSTALADOS x DEMANDA POTENCIAL Premissas: - Demanda total de 5.1 MM - Capacidade de entrega de Kits pelo mercado - Antecipação da conclusão da Fase VI em NOV/24 Fases I, II e III: 1.610 Municípios Atendidos Fase IV: 2.068 Municípios Atendidos Fase V: 624 Municípios Fase VI: 1.268 Municípios Distribuição de kits por 180 dias Fin da Dupla Iluminação 80,2% 76,4% Realizado Meta A respeito do Plano de Aceleração, o Sr. Leandro Guerra registrou que ele projetava o trabalho que a EAF executaria conforme a pesquisa realizada pela EAF que apontava 5.1 milhões de instalações, cuja linha vermelha, que naquele momento, projetava-se até março de 2025 essas instalações, em função do prazo editalício de 90 (noventa) dias após o fim da dupla iluminação, que já teria sido estendido para 180 (cento e oitenta) dias, conforme anteriormente comentado, até 29 de junho de 2025. Destacou que a linha azul do gráfico representa o que foi realizado e que, no mês de outubro, a entidade teria alcançado 80,2%, com um ritmo bastante acelerado, permanecendo acima do originalmente planejado, o que seria 76,4% para o referido mês. Passando para o quinto item de sua agenda, <u>Projeto PAIS</u>, o Sr. Leandro Guerra exibiu o <i>slide</i> abaixo reproduzido para mostrar o mapa do projeto Norte Conectado, com as 6 Infovias do Projeto EAF, destacando que a execução ocorre em duas etapas, sendo que as Infovias 02, 03 e 04, compõem a Etapa 1, e as Infovias 05, 06 e 08, compõem a Etapa 2 do projeto:	Fase	Realizado	100%	100%	Fase I (Finalizada)	27 Municípios até 26/10/23	✓	✓	Fase II (Finalizada)	26 Municípios até 03/03/23	✓	✓	Fase III (Finalizada)	102 Municípios até 30/06/23	✓	✓	Fase IV (Finalizada)	171 Municípios até 30/06/24	✓	✓	Fase V (Finalizada)	648 Municípios até 03/01/26	✓	✓	Fase VI (Finalizada)	4.396 Municípios	✓	✓	Total	5.570 Municípios	100%	100%	Fase	Realizado	100%	100%	Fase I (Finalizada)	27 Municípios até 26/10/23	✓	✓	Fase II (Finalizada)	26 Municípios até 03/03/23	✓	✓	Fase III (Finalizada)	102 Municípios até 30/06/23	✓	✓	Fase IV (Finalizada)	171 Municípios até 30/06/24	✓	✓	Fase V (Finalizada)	648 Municípios até 03/01/26	✓	✓	Fase VI (Finalizada)	4.396 Municípios	✓	✓	Total	5.570 Municípios	100%	100%
Fase	Realizado	100%	100%																																																														
Fase I (Finalizada)	27 Municípios até 26/10/23	✓	✓																																																														
Fase II (Finalizada)	26 Municípios até 03/03/23	✓	✓																																																														
Fase III (Finalizada)	102 Municípios até 30/06/23	✓	✓																																																														
Fase IV (Finalizada)	171 Municípios até 30/06/24	✓	✓																																																														
Fase V (Finalizada)	648 Municípios até 03/01/26	✓	✓																																																														
Fase VI (Finalizada)	4.396 Municípios	✓	✓																																																														
Total	5.570 Municípios	100%	100%																																																														
Fase	Realizado	100%	100%																																																														
Fase I (Finalizada)	27 Municípios até 26/10/23	✓	✓																																																														
Fase II (Finalizada)	26 Municípios até 03/03/23	✓	✓																																																														
Fase III (Finalizada)	102 Municípios até 30/06/23	✓	✓																																																														
Fase IV (Finalizada)	171 Municípios até 30/06/24	✓	✓																																																														
Fase V (Finalizada)	648 Municípios até 03/01/26	✓	✓																																																														
Fase VI (Finalizada)	4.396 Municípios	✓	✓																																																														
Total	5.570 Municípios	100%	100%																																																														

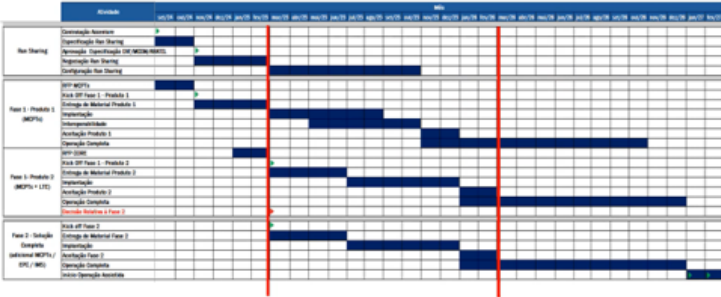
https://sei.anatel.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=8797449&infra_sistema=100000100&infr...

https://sei.anatel.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=8797449&infra_sistema=100000100&infra_sistema=100000100

Item	Descrição																								
	3) A entidade vem monitorando a situação e que a expectativa é de que o lançamento dos cabos subaquáticos inicie em janeiro de 2025. Em seguida, o Sr. Leandro Guerra apresentou um resumo das datas e prazos do projeto no que tange à Etapa 1, conforme <i>slide</i> abaixo reproduzido, reiterando que, nas Infovias 03 e 04, os cabos subaquáticos já foram lançados, aguardando as condições do rio para o lançamento dos cabos da Infovia 02: 5. Status PAIS – Plano de Implantação ✓ Implantação do cabo subaquático <table><tr><th></th><th>DURAÇÃO (lançamento do cabo)</th><th>INÍCIO</th><th>FIM</th><th>RESTRIÇÕES HIDROGRÁFICAS</th><th>RESTRIÇÕES Licença e Autorizações (Status)</th></tr><tr><td>INFOVIA 03</td><td>18 dias</td><td>12/03/24</td><td>30/03/24**</td><td>Sem Restrições</td><td>IBAMA Em processo (0/0) Licença (0/0) SISNAMA Licença (0/0)</td></tr><tr><td>INFOVIA 04</td><td>10 dias</td><td>14/08/24</td><td>23/08/24</td><td>SET a MAR</td><td>IBAMA Licença (0/0) Licença (0/0) SISNAMA Licença (0/0)</td></tr><tr><td>INFOVIA 02</td><td>29 dias</td><td>PREVISÃO INÍCIO D0+10 dias*</td><td>PREVISÃO FIM D0+39 dias</td><td>JUL a NOV</td><td>IBAMA Licença (0/0) Licença (0/0) SISNAMA Licença (0/0)</td></tr></table> * Depende da abertura da janela de operação, devido as condições hidrográficas. ** A Infovia 03 foi implantada com exceção de AFUA e FONIA da FCBAS. (0) Em processo (0/0) - Licença e Plano de Viabilidade, aguardando a monitoração contínua dos dados intermediários (IBAMA, SISNAMA e MTR)  Seguindo para a apresentação da Etapa 2, que abrange as Infovias 05, 06 e 08, o Sr. Leandro Guerra exibiu o seguinte <i>slide</i> contendo a atualização, inicialmente, sobre a execução da Infovia 05: 5. Status PAIS – ETAPA 2 INFOVIA 05 Evolução da Infovia  LEGENDA ● concluído ● em execução ○ planejado Atividades em Execução: Genes ➤ Inspeção Náutica e Terrestre (Estudo de rota): ✓ Inspeção Terrestre Realizada ✓ Inspeção Náutica Realizada ✓ Relatório (náutica e terrestre) em revisão - prev. nov/24 ➤ 8 CMADs fabricados ➤ Cabo Óptico Subaquático: ✓ 100% do cabo COS (Cabo Óptico Subaquático) já fabricado (~1.120 km) ✓ Realização de teste na fábrica - nov/24 ✓ Início de transbordo na fábrica (China) - dez/24 ➤ Iniciado o processo no IBAMA para licenciamento ambiental. ✓ Ficha de Caracterização de Atividade (FCA) - Concluído 03/Set  Sobre a Infovia 05, o Sr. Leandro Guerra fez os seguintes destaques: 1) O Estudo de Viabilidade da Rota e as Inspeções Náuticas e Terrestres já foram realizados e o relatório está em fase final de revisão; 2) Os 8 (oito) CMADs (<i>contêineres</i>) já foram fabricados; 3) O cabo óptico já foi produzido na China pela fabricante HMN e está em fase de testes na fábrica, supervisionados por uma equipe da EAF no local; 4) O início do transbordo do cabo para posterior transporte até o Brasil está previsto para dezembro de 2024; 5) O processo de obtenção de licenças ambientais junto ao Ibama já foi iniciado. Ato contínuo, o Sr. Leandro Guerra projetou o <i>slide</i> abaixo com as informações a respeito da execução das Infovias 06 e 08. Sobre a Infovia 06, destacou que foram realizados o levantamento terrestre e as inspeções terrestre e náutica, com seus relatórios ainda em elaboração. O processo de licenciamento ambiental foi iniciado em novembro junto ao Ibama, que é o FCA (Ficha de Caracterização da Atividade). Já quanto à Infovia 08, afirmou que o progresso está um pouco mais defasado, em função da seca do rio, e que teria uma previsão para iniciar, em dezembro, a inspeção terrestre; e, em janeiro, a inspeção náutica:		DURAÇÃO (lançamento do cabo)	INÍCIO	FIM	RESTRIÇÕES HIDROGRÁFICAS	RESTRIÇÕES Licença e Autorizações (Status)	INFOVIA 03	18 dias	12/03/24	30/03/24**	Sem Restrições	IBAMA Em processo (0/0) Licença (0/0) SISNAMA Licença (0/0)	INFOVIA 04	10 dias	14/08/24	23/08/24	SET a MAR	IBAMA Licença (0/0) Licença (0/0) SISNAMA Licença (0/0)	INFOVIA 02	29 dias	PREVISÃO INÍCIO D0+10 dias*	PREVISÃO FIM D0+39 dias	JUL a NOV	IBAMA Licença (0/0) Licença (0/0) SISNAMA Licença (0/0)
	DURAÇÃO (lançamento do cabo)	INÍCIO	FIM	RESTRIÇÕES HIDROGRÁFICAS	RESTRIÇÕES Licença e Autorizações (Status)																				
INFOVIA 03	18 dias	12/03/24	30/03/24**	Sem Restrições	IBAMA Em processo (0/0) Licença (0/0) SISNAMA Licença (0/0)																				
INFOVIA 04	10 dias	14/08/24	23/08/24	SET a MAR	IBAMA Licença (0/0) Licença (0/0) SISNAMA Licença (0/0)																				
INFOVIA 02	29 dias	PREVISÃO INÍCIO D0+10 dias*	PREVISÃO FIM D0+39 dias	JUL a NOV	IBAMA Licença (0/0) Licença (0/0) SISNAMA Licença (0/0)																				

Item	Descrição																																																							
	Sobre o <i>slide</i> acima, o Sr. Leandro Guerra destacou que existe um alto risco de atraso na entrega de toda a Etapa 2, isto é, para as Infovias 05, 06 e 08, até fevereiro de 2026, em função das próprias situações enfrentadas pela entidade, tais como a seca dos rios, a questão da obtenção de licenças ambientais e operacionais. Citou, como exemplo, a licença operacional da Infovia 03, que foi solicitada há algum tempo, mas ainda não foi emitida, podendo impactar provavelmente a data de fevereiro de 2026, estabelecida pelo edital. Com o objetivo de mostrar o andamento da transferência das infraestruturas e dos ativos das infovias para o Ministério das Comunicações, o Sr. Leandro Guerra exibiu o <i>slide</i> abaixo reproduzido, destacando, no que se refere à Infovia 03, os benefícios do Sistema de Evidências Regulatória (SER), e realizou a leitura das informações nele contidas: 5. PAIS Procedimento padronizado p/ transferência das infraestruturas  Cronograma Infovia 03 Fase1 - Ago/24 - Levantamento das infraestruturas e NF's e evidências de instalação - Ago/24 - Protocolo SEI 12443148 (16/08/24) do Termo de Declaração de entrega e os Anexos p/ ANATEL e MCom - Ago/24 - Encaminhamento para MCom os locais dos Termos de autorização de uso de espaços/terrenos - Set/24 - Versão final do Termo de Declaração Infovia 03 fase 1 - Processo 53500.088928/2021-76 em 19/09 - Set/24 - Apresentação do SER* do módulo inventário - Out/24 - Elaboração do Procedimento operacional dos testes de infraestrutura Óptica definindo os prazos de duração - Nov/24 - Realização do Inventário in loco pelo MCom Cronograma Infovia 04 - Set/24 - Iniciado o processo da Infovia 04, com levantamento das infraestruturas e NFs - Out/24 - Encaminhamento do Termo de Declaração de entrega e os Anexos p/ ANATEL e MCom EAF *Sistema de Evidências Regulatória Na sequência, o Sr. Leandro Guerra passou a reportar o sexto item de sua agenda, <u>Projeto Rede Privativa de Governo</u>, projetando a tabela abaixo que mostra a evolução das RFPs em andamento, também realizando a leitura das informações contidas no <i>slide</i> a seguir: 6. Rede Privativa de Governo - RFPs em andamento <table><tr><th rowspan="2"></th><th>Móvel</th><th colspan="5">Fixa</th></tr><tr><th>MCPTx</th><th>SD-WAN</th><th>GPON</th><th>ROTEADORES</th><th>SWITCH</th><th>Info de PoPs</th></tr><tr><td>Data de publicação</td><td>30/08 ✓</td><td>30/08 ✓</td><td>30/08 ✓</td><td>30/08 ✓</td><td>02/09 ✓</td><td>30/08 ✓</td></tr><tr><td>Envio de questionamentos</td><td>06/09 ✓</td><td>06/09 ✓</td><td>06/09 ✓</td><td>11/09 ✓</td><td>06/09 ✓</td><td>06/09 ✓</td></tr><tr><td>Envio de respostas aos interessados</td><td>11/09 ✓</td><td>23/09 ✓</td><td>30/09 ✓</td><td>23/09 ✓</td><td>23/09 ✓</td><td>23/09 ✓</td></tr><tr><td>Envio de propostas técnicas/comerciais</td><td>26/09 ✓</td><td>30/09 ✓</td><td>11/10 ✓</td><td>30/09 ✓</td><td>30/09 ✓</td><td>02/10 ✓</td></tr><tr><td>Análise das propostas técnicas</td><td>23/10 ✓</td><td>04/11 ✓</td><td>21/11 ✓</td><td>11/11 ✓</td><td>12/11 ✓</td><td>29/10 ✓</td></tr><tr><td>Análise negociação comercial</td><td>27/11</td><td>05/12*</td><td>06/12*</td><td>06/12*</td><td>05/12*</td><td>06/12*</td></tr></table> *Previsto EAF Sobre o tema em apreço, o Sr. Leandro Guerra fez os seguintes destaques: 1) A RFP mais adiantada seria a da Rede Móvel que seria o MCPTx (Plataforma de Missão Crítica), afirmando que estariam concluindo a análise comercial para a subsequente adjudicação do vencedor dessa concorrência;		Móvel	Fixa					MCPTx	SD-WAN	GPON	ROTEADORES	SWITCH	Info de PoPs	Data de publicação	30/08 ✓	30/08 ✓	30/08 ✓	30/08 ✓	02/09 ✓	30/08 ✓	Envio de questionamentos	06/09 ✓	06/09 ✓	06/09 ✓	11/09 ✓	06/09 ✓	06/09 ✓	Envio de respostas aos interessados	11/09 ✓	23/09 ✓	30/09 ✓	23/09 ✓	23/09 ✓	23/09 ✓	Envio de propostas técnicas/comerciais	26/09 ✓	30/09 ✓	11/10 ✓	30/09 ✓	30/09 ✓	02/10 ✓	Análise das propostas técnicas	23/10 ✓	04/11 ✓	21/11 ✓	11/11 ✓	12/11 ✓	29/10 ✓	Análise negociação comercial	27/11	05/12*	06/12*	06/12*	05/12*	06/12*
	Móvel		Fixa																																																					
	MCPTx	SD-WAN	GPON	ROTEADORES	SWITCH	Info de PoPs																																																		
Data de publicação	30/08 ✓	30/08 ✓	30/08 ✓	30/08 ✓	02/09 ✓	30/08 ✓																																																		
Envio de questionamentos	06/09 ✓	06/09 ✓	06/09 ✓	11/09 ✓	06/09 ✓	06/09 ✓																																																		
Envio de respostas aos interessados	11/09 ✓	23/09 ✓	30/09 ✓	23/09 ✓	23/09 ✓	23/09 ✓																																																		
Envio de propostas técnicas/comerciais	26/09 ✓	30/09 ✓	11/10 ✓	30/09 ✓	30/09 ✓	02/10 ✓																																																		
Análise das propostas técnicas	23/10 ✓	04/11 ✓	21/11 ✓	11/11 ✓	12/11 ✓	29/10 ✓																																																		
Análise negociação comercial	27/11	05/12*	06/12*	06/12*	05/12*	06/12*																																																		

Item	Descrição
	2) As demais RFPs, todas da Rede Fixa, estão com a projeção de concluir a análise comercial na primeira semana de dezembro, para que possam também concluir a adjudicação até a primeira quinzena de dezembro, sendo essa a previsão. Ato contínuo, o Sr. Leandro Guerra passou a reportar as informações relacionadas à Rede Fixa, exibindo o <i>slide</i> abaixo: 6. Rede Privativa de Governo – Rede Fixa ✓ Contrato de uso de duto com a VTAL (ORPA) a ser encaminhado para aprovação em AGE. ✓ Somente as prefeituras São Paulo, São Luis, Fortaleza, Florianópolis, João Pessoa, Campo Grande e governos da Paraíba, Sergipe, Rondônia e Goiás responderam e solicitaram mais informações. ✓ Pontos de atenção no cenário de compartilhamento de infra/F.O. com os governos municipais e/ou estaduais com potencial de impacto no prazo de entrega do Edital devido à ausência de: • informações técnicas detalhadas • condições comerciais definidas • instrumentos contratuais aprovados  Com relação à Rede Fixa, o Sr. Leandro Guerra fez os seguintes destaques: 1) Houve uma evolução no contrato com a VTAL, empresa provedora da rede de dutos e PMS na maior parte das capitais, afirmando que ele já estaria pronto para ser encaminhado para a aprovação interna no âmbito da AGE, o que permitirá dar velocidade na implantação das redes nas capitais, na medida em que poderão utilizar os dutos já existentes e com preços de ORPA bem compatíveis com o projeto; 2) Foram abertas negociações com oito capitais, em função da manifestação de interesse. Lembrou que a EAF notificou todas as prefeituras de capitais e governos estaduais sobre o projeto, com o objetivo de verificar se haveria interesse em compartilhar suas respectivas infraestruturas. Registrou que essas oito capitais manifestaram interesse e que estariam desenvolvendo esse trabalho. Ressaltou ainda, quanto ao cronograma da Rede Fixa, que existe uma preocupação quanto ao desenrolar dessas negociações e possíveis impactos no referido cronograma, cujo prazo do edital é fevereiro de 2026. Prosseguindo, o Sr. Leandro Guerra exibiu o <i>slide</i> abaixo transcrito para mostrar cronograma da Rede Rixa em relação aos 320 pontos cujos endereços já estão definidos, incluindo as informações sobre o anel metropolitano e a rede de acesso para esses pontos: 6. Rede Privativa Fixa – Cronograma ref. 320 Pontos nas 27 capitais  (1) Prazo limite informado na nota técnica do MCom para confirmação dos pontos adicionais abr/25 • Quando do recebimento dos pontos adicionais, a EAF irá avaliar os impactos técnicos apresentando o cronograma para atendimento • Caso não haja o fechamento dos contratos nas capitais onde for iniciada a negociação de uso de infra até dez/24, o prazo do edital (fev/26) não será válido 
	Sobre o tema, o Sr. Leandro Guerra fez os seguintes destaques:

Item	Descrição
	1) É importante observar o prazo de abril de 2025, estabelecido em Nota Técnica do Ministério das Comunicações, sob o risco de impactar o prazo final que é fevereiro de 2026, e que aguardarão a definição quanto aos novos pontos para atingir o perímetro do edital que são 6.500 acessos; 2) Algumas cidades, como Vitória, Boa Vista, Rio Branco e Campo Grande, manifestaram formalmente desinteresse em compartilhar infraestrutura. Reforçou a necessidade de concluir as negociações com essas prefeituras e governos estaduais até dezembro de 2024, para não impactar o prazo final de fevereiro de 2026. Em seguida, com relação à Rede Privativa de Governo - Rede Móvel, o Sr. Leandro Guerra exibiu o <i>slide</i> abaixo e realizou a leitura das informações nele contidas: 6. Rede Privativa de Governo – Rede Móvel ✓ EAF contratou a consultoria Accenture para desenvolvimento dos requisitos técnicos necessários para a negociação do acordo de Compartilhamento da Rede de Acesso. ✓ 01/11/24 – EAF encaminhou ao secretário do GAISPI e ao coordenador do GT-Redes, via SEI, a versão final dos requisitos técnicos elaborados pela Accenture, conforme documento 12828025, SEI 53500.088928/2021-76. ✓ EAF apresentou e esclareceu dúvidas ao Mcom e coordenador GT-Redes sobre as especificações técnicas para o compartilhamento de Rede de Acesso. ✓ EAF aguarda da Telebrás o resultado das negociações de compartilhamento da Rede de Acesso com as operadoras.  Ato contínuo, o Sr. Leandro Guerra exibiu o <i>slide</i> a seguir que mostra o cronograma da Rede Móvel, afirmando que há uma expectativa de que a negociação, intitulada de <i>Ran Sharing</i>, mas que, na verdade, seria o modelo Secure MVNO (SMVNO) aconteça, no máximo, até fevereiro de 2025: 6. Rede Privativa Móvel – Cronograma Cronograma edital  Com base nas informações das propostas recebidas no âmbito das RFPs, a definição quanto a execução da Fase 2 deverá ocorrer até fev/25, para garantir o adimplemento do prazo do Edital (fev/26)  Sobre o cronograma da Rede Móvel, registrou que o Produto 1 da Fase 1 (MCPTx) está com prazos controlados, mas ressaltou que tanto o Produto 2 da Fase 1 (Core mínimo) quanto a Fase 2 (Core completo) dependem de definições que não podem ultrapassar o mês de março de 2025, a fim de evitar impactos no prazo final do edital, previsto para fevereiro de 2026. No que tange à criptografia da Rede Privativa, o Sr. Leandro Guerra projetou o <i>slide</i> abaixo, e informou que estão ocorrendo reuniões frequentes entre a EAF, ABIN, Ministério das Comunicações e o Coordenador do GT-Redes para evoluir com essas definições do modelo, escopo e especificação do aplicativo da Rede Móvel. Destacou, quanto às especificações técnicas, que houve um alinhamento inicial, mas que, em 22 de novembro de 2024, a ABIN comunicou que a entidade ainda não estaria autorizada a ir ao mercado com essa informação, sob o argumento de envolver questão de sigilo desse tipo de informação. afirmou que, em função disso, a publicação da RFQ para comparar o orçamento obtido junto à Universidade Federal do Ceará foi adiada, e que a EAF está aguardando essa definição para dar continuidade à RFQ ou outra orientação que o GAISPI venha definir:

https://sei.anatel.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=8797449&infra_sistema=100000100&in... 14/20

https://sei.anatel.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=8797449&infra_sistema=100000100&in... 15/20

https://sei.anatel.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=8797449&infra_sistema=100000100&in... 17/20

Item	Descrição
	se estariam todos de acordo com a proposta. Não havendo manifestações, o Secretário Executivo do GAISPI declarou que fica aprovada a antecipação da liberação do uso da faixa radiofrequência de 3.300 MHz a 3.700 MHz a partir do dia 02 de dezembro de 2024 nas 190 cidades já apresentadas. Também determinou que a Secretaria Executiva do GAISPI anexasse a lista dessas cidades à Ata da presente Reunião. Na sequência, o Secretário Executivo do GAISPI ressaltou que, com a presente deliberação, todos os municípios restantes do estado da Bahia foram liberados, totalizando 26 estados brasileiros. Nesse contexto, o Secretário Executivo do GAISPI relatou que, com orgulho, informaria que chegaram à totalidade dos 5.570 municípios brasileiros completamente liberados para a utilização da faixa de 3,5 GHz para as estações 5G <i>standalone</i> no Brasil. Reiterou que, com essa liberação, ficam todos os municípios brasileiros com a faixa disponível para que as operadoras possam ativar a tecnologia para 100% da população brasileira, isto é, os seus 300,3 milhões de habitantes, que, atualmente, já conta com 240 contratos de linhas móveis, chegando a marca de 35 milhões de assinantes com a tecnologia disponível. O Secretário Executivo do GAISPI enalteceu o trabalho de todos do Grupo, da Anatel e do Ministério das Comunicações. Destacou que essa conquista é fruto de um esforço conjunto iniciado em fevereiro de 2019, quando foi elaborada a primeira minuta do edital e que, após muito esforço e estudo, o leilão foi realizado em novembro de 2021. Prosseguiu afirmando que, quando foi tomada a decisão do uso da faixa de 3.300 MHz a 3.700 MHz, houve um trabalho conjunto, o que despertou uma eficiência no que tange ao uso do espectro, garantindo o uso para as operadoras e a entrada do operador regional, bem como a movimentação do setor satelital, com todo um trabalho conjunto com a radiodifusão, envolvendo o mapeamento de estações, a instalação de filtros, o remanejamento e a relocação do espectro, e a viabilização do uso da faixa para redes privativas entre 3,7 GHz e 3,8 GHz. Nessa esteira, o Secretário Executivo do GAISPI destacou o trabalho conjunto entre diversos setores – radiodifusão, setor satelital, operadoras, Ministério das Comunicações e da Agência – no que tange ao recurso do espectro de radiofrequências, enaltecendo esse trabalho que resultou em um ganho de 14 meses, o que mostra a excelência do trabalho realizado. O Secretário Executivo do GAISPI enalteceu ainda a eficiência de todos os envolvidos nesse trabalho conjunto – governo, servidores, subgrupos, setor privado – merecendo todo o reconhecimento pela excelência do que foi realizado, com destaque para a limpeza da faixa, a instalação de filtros e a instalação e distribuição dos kits para 4,4 milhões de famílias, parabenizando a todos. Finalmente, o Secretário Executivo do GAISPI registrou que é importante lembrar que essas antecipações não alteram o cronograma de atendimento das obrigações de instalação de ERBs, que continua conforme previsão editalícia, tanto para as cidades de maior porte quanto para aquelas com menores populações. Concluída a deliberação, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 5 da Pauta.
5	O Secretário Executivo do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Sidney Azeredo Nince, Coordenador do GT-PAIS, para que fizesse um breve relato sobre as atividades no âmbito do GT. O Sr. Marcos Vieira Baeta Neves pediu a palavra para informar que o Sr. Sidney Azeredo Nince não pôde comparecer a esta Reunião, em virtude de conflito com a sua agenda, e que, portanto, o substituiria. Deu início à apresentação sobre o relato das atividades do GT-PAIS informando que faria um resumo dos principais pontos abordados pela EAF na presente Reunião Ordinária. Quanto à Infovia 02, que conecta Tefé a Atalaia do Norte, informou que já foram emitidas as licenças pelo IBAMA e pelo DNIT e que estariam aguardando as condições de navegabilidade, com previsão para o começo do próximo ano. No que tange às atividades terrestres executadas na maioria das cidades, destacou que já teve cinco redes metropolitanas concluídas. Sobre a Infovia 04, que conecta a Vila de Moura a Boa Vista, o Sr. Marcos Vieira Baeta Neves informou que as licenças de instalação para o trecho terrestre, de Caracará para Boa Vista, já foram emitidas pelo DNIT e que foi iniciado o lançamento a partir de Caracará, com a previsão de 120 dias. Mencionou ainda que as atividades terrestres já foram executadas e que o Termo de Declaração e Entrega do trecho subaquático está em elaboração (Vila de Moura a Caracará). Sobre a Infovia 03, que conecta Macapá a Belém, salientou que o lançamento já foi concluído e que as redes metropolitanas em Breves e Currálinho estão concluídas, e que, em Belém, o anel principal foi concluído e encontra-se na fase de instalação das ramificações e acessos, com conclusão prevista dezembro de 2024. Informou também que a licença de operação aguarda manifestação dos órgãos intervenientes, enquanto o Termo de Declaração de Entrega da rota expressa já foi enviado ao Ministério das Comunicações. O Sr. Marcos Vieira Baeta Neves também destacou que, devido à suspensão do lançamento da Infovia 02 por questões de navegabilidade, as ações da EAF estão direcionadas para outras atividades. Afirmou que, no caso da Infovia 03, o lançamento dos trechos ramificados para o atendimento de Afuá e Ponta de Pedras e,

Item	Descrição
	também, para o aumento da resiliência e proteção devido a área de fundeio do novo Porto de Belém, com o lançamento do trecho em duplicidade entre Ponta de Pedra e Curralinho. Registrou que a entrega do cabo está prevista para março de 2025, e que, na foz do rio, existem condições de navegabilidade para a Infovia 03 o ano todo, assim, as licenças já foram emitidas. Quanto à Infovia 05, reportou que se encontra em andamento o estudo de viabilidade preliminar e que o relatório estaria em análise. Em relação à Infovia 06, informou que o estudo preliminar também já foi executado e que o relatório também estaria em elaboração. Para a Infovia 08, afirmou que se encontra em execução o estudo de viabilidade, com previsão para janeiro de 2025, observando as condições de navegabilidade e de infraestrutura de energia elétrica. Concluída a apresentação, o Secretário Executivo do GAISPI agradeceu ao Sr. Marcos Vieira Baeta Neves pelas informações e, aproveitando a presença do Sr. Antônio Celso Teixeira Guimarães, representando a Secretaria de Telecomunicações, ressaltou a importância da etapa de avaliação do aceite do Ministro das Comunicações em relação à Infovia, uma vez que finalizada a questão de patrimônio e a constituição do consórcio responsável pela operacionalização do que já foi entregue. Registrou também a importância do apoio do Ministério para o procedimento de uma das licenças do Ibama. Concedida a palavra, o Sr. Antônio Celso Guimarães Teixeira informou que internalizaria essas informações junto ao Secretário para verificar como ajudar nesse tema. Concedida a palavra, o Sr. Leandro Guerra reforçou que, no caso da Infovia 03, entre Macapá e Belém, é imprescindível obter a licença de operação (LO), essencial para ela ser colocada à disposição do mercado. Destacou também que é necessária a conclusão do inventário pelo Ministério das Comunicações, informando que toda a documentação em relação a esse ativo dessa primeira etapa já teria sido enviada. O Sr. Leandro Guerra salientou que o apoio do Ministério das Comunicações tem sido muito relevante junto a esse processo do Ibama quanto às licenças ambientais. O Sr. Antônio Celso Guimarães Teixeira informou que levaria o tema ao Secretário e questionou ao Sr. Leandro Guerra se o importante, para esse primeiro trecho da Infovia 03, seria a licença de operação. O Sr. Leandro Guerra confirmou que sim e ressaltou que, nessa etapa, o pedido já foi feito e se encontra em consulta com os intervenientes junto ao Ibama. Destacou que seriam temas paralelos, isto é, a recepção do ativo pelo Ministério das Comunicações é um processo paralelo e independente do processo de obtenção da licença de operação perante o Ibama, embora sejam complementares. Não havendo manifestações adicionais e considerando que este item seria informativo e que não haveria deliberações, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 6 da Pauta.
6	O Secretário Executivo do GAISPI concedeu novamente a palavra ao Sr. Marcos Vieira Baeta Neves, Coordenador do GT-REDE, para que fizesse um relato das atividades. O Sr. Marcos Vieira Baeta Neves destacou que o Sr. Leandro Guerra apresentou de forma clara as atividades relacionadas ao projeto da Rede Privativa e que, portanto, pontuaria alguns itens que o GT tem dado atenção especial. Quanto à Rede Fixa, registrou que o grupo tem que avaliar a interposição de redes de prefeituras e governos estaduais. Afirmou que o Sr. Leandro Guerra compartilhou o <i>status</i> e que o grupo tem em vista que isso pode afetar o cronograma, mas ressaltou que estariam tentando fazer uma avaliação, sob o argumento de que pode ser uma forma de uso mais efetivo e adequado dos recursos, caso consigam utilizar essas redes. O Sr. Marcos Vieira Baeta Neves também mencionou que, em paralelo, o GT estaria avaliando a aquisição de infraestrutura de fibras das PPPs e que estariam em fase inicial de conversas, sendo que essa avaliação será feita nas próximas semanas. Quanto às RFPs, informou que estariam bastante adiantadas, com previsão de conclusão entre o final de novembro e o início de dezembro, pedindo, desta forma, uma atenção especial para evitar atrasos no cronograma, uma vez que estariam em período de final de ano. Em relação à Rede Móvel, o Sr. Marcos Vieira Baeta Neves repisou que os requisitos já foram entregues à Telebrás e enfatizou que deveriam ter bastante atenção, visto que a finalização das negociações da Telebrás com as prestadoras depende da sequência do projeto, solicitando também o auxílio do Ministério das Comunicações junto à Telebrás para avançar nas negociações. Sobre as RFPs da Rede Móvel, o Sr. Marcos Vieira Baeta Neves informou que elas estariam em fase de finalização, com atenção especial à plataforma de missão crítica, que sofreu atrasos devido a renegociações e reduções de preços, ressaltou, porém, que isso foi importante, mas que não poderiam deixar que impacte no projeto. Finalmente, a respeito da criptografia, o Sr. Marcos Vieira Baeta Neves também apontou um atraso, por parte da ABIN, decorrente de preocupações com sigilo e restrição de acesso às informações compartilhadas para a elaboração da RFP, que se trata de um passo necessário para se ter uma pesquisa de mercado. Registrou que o GT estaria trabalhando em conjunto com o MCom e a ABIN para que eles avaliem, tentando também que eles liberem esse acesso para que consigam publicar

Item	Descrição
	a RFP ainda essa semana. Informou que foi realizada, na data de ontem, uma reunião específica com um representante da ABIN para tentar destravar essa questão e buscar publicar até o final desta semana, para não ter impacto significativo no cronograma. Concluída a apresentação, o Secretário Executivo do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apresentado. Não havendo manifestações e considerando que neste item não haveria deliberações, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 7 da Pauta.
7	O Secretário Executivo do GAISPI solicitou ao Sr. Henrique Gomes Pinheiro, Coordenador do GT-COM, que fizesse um breve relato das atividades do GT. O Sr. Henrique Gomes Pinheiro cumprimentou, inicialmente, a todos os presentes, e informou que o GT-COM realizou uma reunião na semana anterior para o acompanhamento bimestral das ações de comunicação da EAF. Nesse sentido, relatou que a comunicação segue fazendo o seu trabalho com as campanhas em todo o território nacional, conforme previsto, com atenção especial ao estado do Rio Grande do Sul, para reinstalação nas cidades onde isso já está sendo permitido. Ressaltou que são poucas as cidades onde isso não é possível iniciar, mas que, na maioria das cidades, esse trabalho já está sendo feito, contando com o apoio da própria radiodifusão. Por fim, o Sr. Henrique Gomes Pinheiro destacou que, após a presente Reunião Ordinária, haveria uma coletiva de imprensa para marcar o atingimento da liberação total do País, em virtude do trabalho realizado pelo Grupo. Concluída a apresentação, o Secretário Executivo do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apresentado. Não havendo manifestações e considerando que neste item não haveria deliberações, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 8 da Pauta.
8	O Secretário Executivo do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se possuíam outro assunto que quisessem tratar na presente Reunião. Não havendo manifestações, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 9 da Pauta.
9	O Secretário Executivo do GAISPI propôs que a próxima Reunião Ordinária do GAISPI seja realizada no dia 17 de dezembro de 2024 (terça-feira) às 10:00h, de forma remota, questionando aos membros do GAISPI se estariam todos de acordo com essa data. Não havendo manifestações, o Secretário Executivo do GAISPI declarou que fica definida a data da 35ª Reunião Ordinária do GAISPI para o dia 17 de dezembro de 2024 (terça-feira) às 10:00h, de forma remota. Concluídos os assuntos constantes da Pauta, o Secretário Executivo do GAISPI agradeceu a presença e o empenho de todos os membros e declarou encerrada a 34ª Reunião Ordinária do Grupo.

4. APROVAÇÃO

4.1. Segue a presente Ata de Reunião assinada eletronicamente pelos participantes acima identificados e aprovada na 35ª Reunião Ordinária do GAISPI, realizada em 28 de janeiro de 2025.
