



REGISTRO DE REUNIÃO

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DAS SOLUÇÕES PARA OS PROBLEMAS DE INTERFERÊNCIA NA FAIXA DE 3.625 A 3.700 MHZ - GAISPI

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GAISPI

Data	Horário de Início	Horário de Término	Local
29 de novembro de 2023.	10:10	12:10	Plataforma Teams

1. PARTICIPANTES

1.1. Membros do GAISPI:

FUNÇÃO	MEMBRO	NOME	Presente na reunião?
Presidente do GAISPI	-	Carlos Manuel Baigorri	SIM
Secretário Executivo do GAISPI	-	Vinicius Oliveira Caram Guimarães	SIM
Representante do Ministério das Comunicações	Titular	Wilson Diniz Wellisch	NÃO
	Suplente	Maximiliano Salvadori Martinhão	SIM
Representantes da Proponentes Vencedoras dos Lotes do Tipo B	Titular	Antônio Oscar de Carvalho Petersen	NÃO
	Suplente	Monique Pereira Ibitinga de Barros	SIM
	Titular	Camilla Tedeschi de Toledo Tapias	NÃO
	Suplente	Anderson Emanuel de Azevedo Gonçalves	SIM
	Titular	Mario Girasole	NÃO
	Suplente	Marcelo Concolato Mejias	SIM
Representantes dos Radiodifusores	Titular	Flavio Ferreira de Lara Resende	NÃO
	Suplente	Cristiano Reis Lobato Flores	NÃO
	Titular	Márcio Silva Novaes	NÃO
	Suplente	Samir Amando Granja Nobre Maia	SIM
	Titular	Luiz Carlos Abrahão	SIM
Representantes das Exploradoras de Satélites	Suplente	Carlos Eduardo Neiva Melo	NÃO
	Titular	Lincoln Amazonas Antunes de Oliveira	NÃO
	Suplente	Michelle Machado Caldeira	NÃO
	Titular	Fabio Franco Costa de Alencar	NÃO
	Suplente	Luis Fernando Barros Costa Fernandes	NÃO
	Titular	Márcio André de Assis Brasil	NÃO
Representantes das Proponentes Vencedoras dos Lotes C1 a C8 e D1 a D32	Suplente	Rodrigo Soares Campos	SIM
	Titular	José Roberto Nogueira	NÃO
	Suplente	Katia Costa da Silva Pedroso	SIM
	Titular	Margaret de Almeida Cadête Moonsammy	SIM
	Suplente	Wagner Zanini Barreira	SIM
	Titular	Vitor Elísio Góes de Oliveira Menezes	SIM
Suplente	Mariana Rezende	NÃO	

1.2. Outros Participantes:

Nome	Órgão/Instituição/Empresa
Alex Pires de Azevedo	Anatel/GCMM - Coordenador do GT-Desocupação
Antonio Parrini Pimenta	EAF
Kely Alvez Costa	Anatel (terceirizada)
Dulcídio Elias Oliveira Pedrosa	EAF
Henrique Gomes Pinheiro	Anatel/APC - Coordenador do GT-COM
Lauro Leandro Rutkowski	Anatel
Leandro Enrique Lobo Guerra	EAF
Marcos Vinicius Ramos da Cruz	Anatel
Martim Jales Hon	Anatel/GCMM - Coordenador do GT-Migração
Patrícia de Oliveira Abreu	EAF
Paulo Roberto Cruz Cozza	EAF
Sebastião Sérgio de Oliveira Júnior	TIM
Sidney Azeredo Nince	Anatel/SOR - Coordenador do GT-Pais
Silvio Artur Meira Starling	EAF
Takeshi Ikeda	Anatel
Karine Karine Medeiros Dias	Anatel
Ricardo Lamongi Dieckmann	EAF
Dulcídio Elias Oliveira Pedrosa	EAF
Oseias Fonseca de Aguilar	Anatel/ORLE - Coordenador do GT/F
Luis Flavio Collares Machado	MCom/GT-PAIS
Raul Lara Campos	CLARO
Renato Bizerra Aguiar	Anatel/ORLE

2. PAUTA

Item	Descrição
1	ITEM 1 DA PAUTA: APROVAÇÃO DA ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2023 ITEM 1 DA PAUTA: APROVAÇÃO DA ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023.
3	ITEM 3 DA PAUTA: INFORMES DOS GRUPOS TÉCNICOS DE MIGRAÇÃO DA BANDA KU – GT-MIGRAÇÃO E DE DESOCUPAÇÃO DO 3,5GHz E MITIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA – ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO GAISPI
2	ITEM 2 DA PAUTA: INFORME DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE ADMINISTRADORA DA FAIXA DE 3,5 GHz (EAF).
4	ITEM 4 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE INCLUSÃO DE CIDADES NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE MIGRAÇÃO ATÉ JUNHO DE 2024.
5	ITEM 5 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO SOBRE A ANTECIPAÇÃO DE CIDADES PARA A LIBERAÇÃO DO USO DA FAIXA DE RADIOFREQUÊNCIAS DE 3.300 MHZ A 3.700 MHZ.
6	ITEM 6: DELIBERAÇÃO ACERCA DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO GAISPI.
7	ITEM 7 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DO PROGRAMA AMAZÔNIA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL – GT-PAIS.
8	ITEM 8 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO ACERCA DOS PONTOS DE ATENDIMENTO DAS INFOVIAS 02, 03 E 04.
9	ITEM 9 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE REDE PRIVATIVA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL – GT-REDE.
10	ITEM 10 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO – GT-F.
11	ITEM 11 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO – GT-COM.
12	ITEM 12 DA PAUTA: OUTROS ASSUNTOS.
13	ITEM 13 DA PAUTA: DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE JANEIRO DE 2024.


3. RELATO DA REUNIÃO

Item	Descrição
Saudação	<p>Inicialmente, o Presidente do GAISPI, o Sr. Carlos Manuel Baigorri, deu boas-vindas e agradeceu a presença de todos à 24ª Reunião Ordinária do GAISPI, afirmando que se trata de sua primeira reunião presidindo o GAISPI, e ressaltou que houve um encontro com o Sr. Leandro Guerra e equipe, ocasião em que foi a ele apresentado um apanhado geral.</p> <p>Ato contínuo, o Presidente do GAISPI informou que não pretende realizar mudanças drásticas em relação ao que vem sendo feito pelo Grupo e enalteceu o grande trabalho realizado pelo Conselheiro Moisés Queiroz de Moreira desde a implementação até a execução do GAISPI, com todos os cronogramas adiantados, aproveitando também para saudar o Sr. Leandro Guerra e equipe pelo trabalho realizado. afirmou que a sua satisfação é imensa e que não teria comentários e/ou algo a criticar, salientando que vem aqui para aprender com todos e dar continuidade naquilo que vem sendo executado de forma tão positiva e exitosa.</p> <p>Feita a sua saudação inicial, o Presidente do GAISPI passou para o item 1 da Pauta</p>
1	<p>O Presidente do GAISPI informou que não foram recebidas solicitações ou manifestações sobre a minuta da Ata previamente circulada. Desta forma, questionou aos presentes se existiriam ajustes em relação à versão encaminhada do documento.</p> <p>Não havendo manifestações, o Presidente do GAISPI declarou que fica aprovada a Ata da 23ª Reunião Ordinária do GAISPI e, ato contínuo, passou para o item 2 da Pauta.</p>
2	<p>O Presidente do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Leandro Guerra, para que fizesse um breve relato sobre as atividades da EAF ao Grupo.</p> <p>O Sr. Leandro Guerra cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes e desejou boas-vindas ao Presidente do GAISPI, ressaltando que o sucesso é de todos os membros do Grupo e que os resultados alcançados foram frutos de muita cooperação e que, desde o início do processo, sempre houve um apoio mútuo que levou o Grupo a alcançar os primeiros resultados e que seguem nessa linha, como sempre vem afirmando.</p> <p>Em seguida, o Sr. Leandro Guerra passou a projetar uma apresentação, cuja agenda do Informe das atividades da EAF abordou os seguintes itens:</p> <ul style="list-style-type: none"> I – Migração TVRO; II – Desocupação e Mitigação FSS; III – Fase 4; IV – Municípios com limpeza da faixa 3,5 GHz concluída; V – Contratação de Serviços de Instalação TVRO; VI – Planejamento TVRO – Plano de Aceleração de Instalação; VII – Projeto PAIS; VIII – Projeto Rede Privativa de Governo; e IX – Informações Financeiras. <p>Sobre o primeiro item de sua agenda, <u>Migração TVRO</u>, o Sr. Leandro Guerra projetou o <i>slide</i> abaixo reproduzido que apresenta um gráfico que mostra o acumulado de instalações realizadas mensalmente, informando que a EAF atingiu a marca de 1 milhão e 440 mil instalações no dia 28 de novembro de 2023, e que estariam projetando, no final deste mês de novembro, atingir aproximadamente 1 milhão e 460 mil instalações, conforme distribuição constante do mapa do Brasil, com forte presença na Região Nordeste:</p>




Ainda sobre esse tema, o **Sr. Leandro Guerra** informou que, neste mês de novembro, é possível notar um pequeno decréscimo em relação aos meses anteriores, principalmente os meses de setembro e outubro, e afirmou que isso aconteceu devido principalmente à existência de menos dias úteis no mês de novembro, com três feriados que acabaram impactando, e ainda por questões de logística de instalação na Região Sul, por causa das chuvas, e na Região Norte, por causa da seca, o que impacta na logística da entidade e no deslocamento, influenciando no volume de instalações. Nesse contexto, o **Sr. Leandro Guerra** também lembrou o fato de o GAISPI ter priorizado a limpeza da faixa na Região Sul, onde teriam cidades com menos instalações, conforme pode ser observado no mapa do Brasil constante do *slide* acima. Finalmente, o **Sr. Leandro Guerra** informou que a EAF estaria projetando terminar o ano com o número acima de 1 milhão e 600 mil instalações no mês de dezembro de 2023.

Passando para o segundo item de sua agenda, **Desocupação e Mitigação FSS**, o **Sr. Leandro Guerra** projetou o *slide* a seguir transcrito, reforçando que a EAF já teria atingido 100% da desocupação, um dos projetos que estava no Edital, e que, portanto, 1.482 estações foram desocupadas no Brasil desde o mês de julho de 2023:

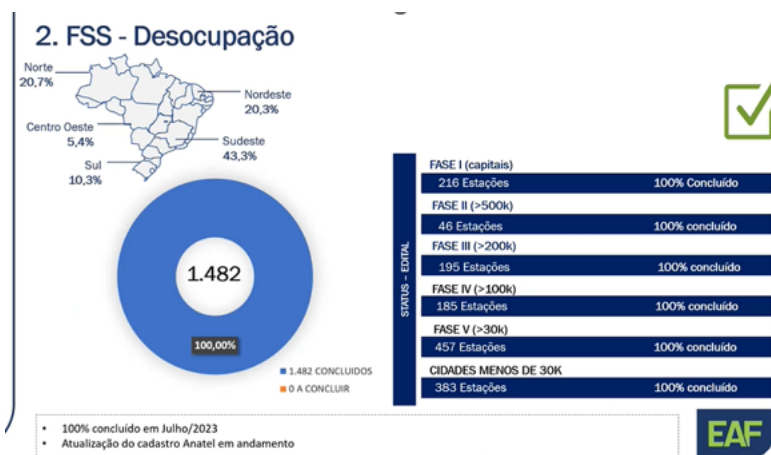


Em seguida, o **Sr. Leandro Guerra** projetou o *slide* abaixo que mostra o *status* FSS – Mitigação, destacando que a EAF já alcançou 95,32% das 19.293 instalações, faltando somente 4,68%, o que representa 902 instalações, e que a entidade pretende concluir esta fase do projeto ainda este ano, afirmando que estariam trabalhando para isso. Informou ainda que o mapa do Brasil abaixo mostra os municípios que estariam totalmente mitigados:

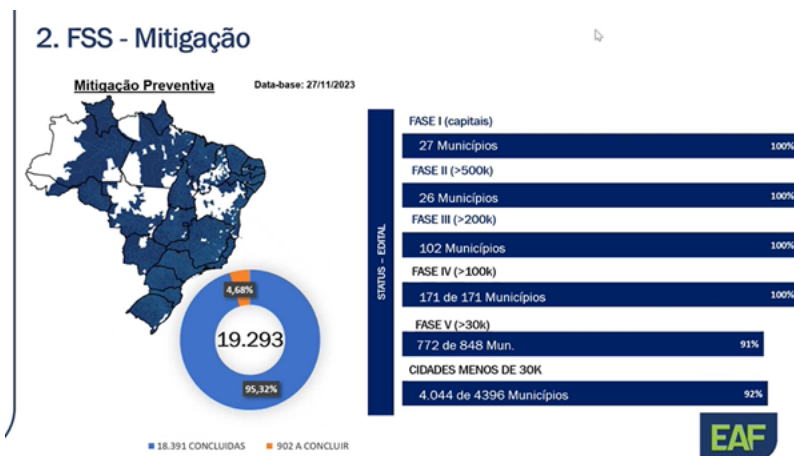

O **Sr. Leandro Guerra** passou para o terceiro item de sua agenda, **Fase 4**, e recordou que, quando a EAF iniciou essa fase, no mês de junho de 2023, havia uma projeção de 2.067 municípios que seriam focados pela entidade em termos de limpeza da faixa. Informou que, nesta Reunião, estariam propondo a antecipação de mais um município que não estava nessa projeção inicial e que se refere ao município de Serrinha/BA, por interesse mercadológico e que, como de costume, antes de iniciar a operação em um município, a EAF submete a proposta ao GAISPI, previamente alinhada no âmbito do **GT-MIGRAÇÃO**. Nesse cenário, projetou o *slide* abaixo reproduzido que mostra a distribuição desses 2.068 municípios por cada Unidade da Federação:

3. Planejamento Fase IV

Atuação da EAF em 2.067 municípios
Proposta de antecipação de + 1 município*



Localidades	
AC	2
AL	62
AM	6
AP	15
BA	97
CE	69
ES	27
GO	61
MA	43
MG	289
MS	21
MT	34
PA	40
PB	52
PE	68
PI	21
PR	275
RJ	22
RN	66
RO	4
RR	8
RS	352
SC	121
SE	29
SP	326
TO	11

CD_MUN	UF	Município
2930501	BA	Serrinha

*A ser aprovado no 24º GAISPI

Ainda no tocante ao Planejamento da Fase 4, o Sr. **Leandro Guerra** projetou um novo *slide* a seguir transcrito que apresenta o Cronograma Macro da referida fase que mostra a atuação da entidade, mês a mês:



Sobre o assunto, informou que a entidade se encontra no mês de novembro, com 356 municípios que estavam previstos, e que, no mês de dezembro, estariam antecipando 267 municípios. Afirmou que a EAF começou a operar o total de 623 municípios agora no mês de novembro e que eles estariam aptos à deliberação pelo uso da faixa e que seriam municípios com a limpeza realizada. Ressaltou que esses 623 municípios representam a soma dos 356 municípios originalmente previstos para o mês de novembro e os 267 municípios do mês de dezembro, que, por sua vez, são compostos por 172 municípios previstos originalmente para o mês de dezembro e mais 95 municípios que foram também antecipados, conforme proposta alinhada com o **GT-MIGRAÇÃO**.

O Sr. **Leandro Guerra** informou ainda que o *slide* acima mostra que a entidade passará a operar em 204 municípios a partir do mês de janeiro de 2024, isto é, os 203 municípios comentados e mais o município de Serrinha/BA. Em seguida, apresentou a lista desses municípios, conforme *slides* abaixo reproduzidos, ressaltando que aqueles destacados em cinza representam os municípios de 30.000 a 100.000 habitantes da Fase 6, projetados para o mês de fevereiro de 2026, e que serão antecipados:


3. Planejamento Fase IV G – Janeiro /24 (204 Municípios)

UF	Município	UF	Município	UF	Município
BA	Conceição do Coque	MS	Chopão	MS	Rio Verde de Mato Grosso
BA	Eucálides da Cunha	MS	Parna Quatro	MS	Selvínia
BA	Itaquara	MS	Parna Vinte	MT	Rena do Bugre
BA	Itaberaba	MS	Patinópolis	MT	Brasão
BA	Lençóis	MS	Pedra Bonita	MT	Cáceres
BA	Maracá	MS	Perdões	MT	Campo Novo do Parecis
BA	Palmeiras	MS	Pirangi	MT	Campo de Jiló
BA	Sabará	MS	Pirangaçu	MT	Cláudia
BA	Serrolândia	MS	Porto Firme	MT	Fátima Natal
MG	Abreópolis	MS	Prado Alegre	MT	Luzes do Rio Verde
MG	Alagoa	MS	Ribeirão Vermelho	MT	Nova Liberdade
MG	Bom Jardim de Minas	MS	Rio Preto	MT	Paranaíta
MG	Bom Sucesso	MS	Rodolfo	MT	Primavera do Leste
MG	Brasão	MS	Santa Margarida	MT	Ribeirão Coque
MG	Carvalhos	MS	Santana do Jacaré	MT	Santa Rita do Triunfo
MG	Carvalhos	MS	Santa Rita de Jacutinga	MT	Sapezal
MG	Castanheira	MS	São João do Maranhão	MT	Sorriso
MG	Castelo	MS	São Sebastião do Rio Verde	PA	Maju
MG	Delmiro Gouveia	MS	Saldade de Minas	PA	Ulianópolis
MG	Diogo de Vasconcelos	MS	Taiara	PB	Alagoa Grande
MG	Eloá Mendes	MS	Tocantins	PB	Alagoa Nova
MG	Guaraná	MS	Três Pontas	PB	Alvarães
MG	Guidoval	MS	Vigário	PB	Algodão de Jandira
MG	Itapecuru	MS	Wanderlândia	PB	Aracá
MG	Jacinto	MS	Antônio João	PB	Areia
MG	Jaraguá	MS	Apaldiana	PB	Areial
MG	Jatobá	MS	Chapadão do Sul	PB	Assaí
MG	Juazeiro	MS	Corguinho	PB	Bom Vista
MG	Leopoldina	MS	Inocência	PB	Cabeceiras
MG	Luziânia	MS	Itapipiranga	PB	Camboá de Arica
MG	Mantena	MS	Laguna Carajá	PB	Calçadão
MG	Marmelópolis	MS	Natividade	PB	Caldas Brandão
MG	Monte Carmelo	MS	Nova Andaraí	PB	Cajupá
MG	Olinda	MS	Ponta Preta	PB	Cuité de Mamanguape

Antec. Fase VI

Item	Descrição																																																																																																																																																																																																																														
	<h3>3. Planejamento Fase IV G- Janeiro /24 (204 Municípios)</h3> <table border="1"><thead><tr><th>UF</th><th>Município</th><th>UF</th><th>Município</th><th>UF</th><th>Município</th></tr></thead><tbody><tr><td>PB</td><td>Curral de Lima</td><td>SE</td><td>Raposo Alegre</td><td>TO</td><td>Colinas do Tocantins</td></tr><tr><td>PE</td><td>Esmeralda</td><td>SE</td><td>Ipaporanga</td><td>TO</td><td>Conto Magalhães</td></tr><tr><td>PE</td><td>Goio do Brejo</td><td>SE</td><td>Itaueira</td><td>TO</td><td>Cristalina</td></tr><tr><td>PE</td><td>Guilherme</td><td>SE</td><td>Laranjeiras</td><td>TO</td><td>Cristalândia</td></tr><tr><td>PE</td><td>Raposo Alegre</td><td>SE</td><td>Matador</td><td>TO</td><td>Distrito do Tocantins</td></tr><tr><td>PE</td><td>Januária</td><td>SE</td><td>Miranim</td><td>TO</td><td>Distrito do Tocantins</td></tr><tr><td>PE</td><td>Juazeiro</td><td>SE</td><td>Natividade</td><td>TO</td><td>Goianorte</td></tr><tr><td>PE</td><td>Jurupiranga</td><td>SE</td><td>Paracuru</td><td>TO</td><td>Gurupi</td></tr><tr><td>PE</td><td>Maranguape</td><td>SE</td><td>Passagem</td><td>TO</td><td>Itambé</td></tr><tr><td>PE</td><td>Mari</td><td>SE</td><td>Praia</td><td>TO</td><td>Itapetininga</td></tr><tr><td>PE</td><td>Mulungu</td><td>SE</td><td>Riachuelo</td><td>TO</td><td>Raposo do Tocantins</td></tr><tr><td>PE</td><td>Natal</td><td>SE</td><td>Ribânia do Café</td><td>TO</td><td>Juarina</td></tr><tr><td>PE</td><td>Oliveiras</td><td>SE</td><td>Salgado</td><td>TO</td><td>Marianópolis do Tocantins</td></tr><tr><td>PE</td><td>Pio XI</td><td>SE</td><td>Santa Luiza do Maranhão</td><td>TO</td><td>Matias</td></tr><tr><td>PE</td><td>Quilândia</td><td>SE</td><td>Santana de São Francisco</td><td>TO</td><td>Maurilândia do Tocantins</td></tr><tr><td>PE</td><td>Ramagim</td><td>SE</td><td>Santa Rosa de Lima</td><td>TO</td><td>Monte Santo do Tocantins</td></tr><tr><td>PE</td><td>Paulista</td><td>SE</td><td>São Domingos</td><td>TO</td><td>Muriciópolis</td></tr><tr><td>PE</td><td>Riacho de Santa Antônia</td><td>SE</td><td>Siri</td><td>TO</td><td>Nova Glória</td></tr><tr><td>PE</td><td>Salgado de São Félix</td><td>TO</td><td>Almoxaranda</td><td>TO</td><td>Novo Acrelândia</td></tr><tr><td>PE</td><td>Santa Carolina</td><td>TO</td><td>Alto do Tocantins</td><td>TO</td><td>Palmeirante</td></tr><tr><td>PE</td><td>São José do Bonfim</td><td>TO</td><td>Aragominas</td><td>TO</td><td>Paulo Afonso</td></tr><tr><td>PE</td><td>São José do Bonfim</td><td>TO</td><td>Araguama</td><td>TO</td><td>Colméia</td></tr><tr><td>PE</td><td>Serra Hedida</td><td>TO</td><td>Araguari</td><td>TO</td><td>Pradópolis do Tocantins</td></tr><tr><td>PE</td><td>Solidão</td><td>TO</td><td>Araguaína</td><td>TO</td><td>Prata</td></tr><tr><td>PE</td><td>Umbuzeiro</td><td>TO</td><td>Araripe</td><td>TO</td><td>Prata</td></tr><tr><td>PE</td><td>Araripe</td><td>TO</td><td>Bela Vista</td><td>TO</td><td>Ponte Alta do Tocantins</td></tr><tr><td>SE</td><td>Aracaju</td><td>TO</td><td>Bandeira do Tocantins</td><td>TO</td><td>Presidente Kennedy</td></tr><tr><td>SE</td><td>Aracaju</td><td>TO</td><td>Bandeira do Tocantins</td><td>TO</td><td>Rio Sono</td></tr><tr><td>SE</td><td>Aracaju</td><td>TO</td><td>Bandeira do Tocantins</td><td>TO</td><td>Santa Fé de Araguaína</td></tr><tr><td>SE</td><td>Aracaju</td><td>TO</td><td>Bandeira do Tocantins</td><td>TO</td><td>Santa Filomena</td></tr><tr><td>SE</td><td>Aracaju</td><td>TO</td><td>Bandeira do Tocantins</td><td>TO</td><td>São Valério</td></tr><tr><td>SE</td><td>Aracaju</td><td>TO</td><td>Bandeira do Tocantins</td><td>TO</td><td>Tupirama</td></tr><tr><td>SE</td><td>Aracaju</td><td>TO</td><td>Bandeira do Tocantins</td><td>TO</td><td>Wanderlândia</td></tr><tr><td>SE</td><td>Aracaju</td><td>TO</td><td>Bandeira do Tocantins</td><td>TO</td><td>Wanderlândia</td></tr><tr><td>SE</td><td>Aracaju</td><td>TO</td><td>Bandeira do Tocantins</td><td>TO</td><td>Wanderlândia</td></tr><tr><td>SE</td><td>Aracaju</td><td>TO</td><td>Bandeira do Tocantins</td><td>TO</td><td>Wanderlândia</td></tr></tbody></table>	UF	Município	UF	Município	UF	Município	PB	Curral de Lima	SE	Raposo Alegre	TO	Colinas do Tocantins	PE	Esmeralda	SE	Ipaporanga	TO	Conto Magalhães	PE	Goio do Brejo	SE	Itaueira	TO	Cristalina	PE	Guilherme	SE	Laranjeiras	TO	Cristalândia	PE	Raposo Alegre	SE	Matador	TO	Distrito do Tocantins	PE	Januária	SE	Miranim	TO	Distrito do Tocantins	PE	Juazeiro	SE	Natividade	TO	Goianorte	PE	Jurupiranga	SE	Paracuru	TO	Gurupi	PE	Maranguape	SE	Passagem	TO	Itambé	PE	Mari	SE	Praia	TO	Itapetininga	PE	Mulungu	SE	Riachuelo	TO	Raposo do Tocantins	PE	Natal	SE	Ribânia do Café	TO	Juarina	PE	Oliveiras	SE	Salgado	TO	Marianópolis do Tocantins	PE	Pio XI	SE	Santa Luiza do Maranhão	TO	Matias	PE	Quilândia	SE	Santana de São Francisco	TO	Maurilândia do Tocantins	PE	Ramagim	SE	Santa Rosa de Lima	TO	Monte Santo do Tocantins	PE	Paulista	SE	São Domingos	TO	Muriciópolis	PE	Riacho de Santa Antônia	SE	Siri	TO	Nova Glória	PE	Salgado de São Félix	TO	Almoxaranda	TO	Novo Acrelândia	PE	Santa Carolina	TO	Alto do Tocantins	TO	Palmeirante	PE	São José do Bonfim	TO	Aragominas	TO	Paulo Afonso	PE	São José do Bonfim	TO	Araguama	TO	Colméia	PE	Serra Hedida	TO	Araguari	TO	Pradópolis do Tocantins	PE	Solidão	TO	Araguaína	TO	Prata	PE	Umbuzeiro	TO	Araripe	TO	Prata	PE	Araripe	TO	Bela Vista	TO	Ponte Alta do Tocantins	SE	Aracaju	TO	Bandeira do Tocantins	TO	Presidente Kennedy	SE	Aracaju	TO	Bandeira do Tocantins	TO	Rio Sono	SE	Aracaju	TO	Bandeira do Tocantins	TO	Santa Fé de Araguaína	SE	Aracaju	TO	Bandeira do Tocantins	TO	Santa Filomena	SE	Aracaju	TO	Bandeira do Tocantins	TO	São Valério	SE	Aracaju	TO	Bandeira do Tocantins	TO	Tupirama	SE	Aracaju	TO	Bandeira do Tocantins	TO	Wanderlândia	SE	Aracaju	TO	Bandeira do Tocantins	TO	Wanderlândia	SE	Aracaju	TO	Bandeira do Tocantins	TO	Wanderlândia	SE	Aracaju	TO	Bandeira do Tocantins	TO	Wanderlândia
UF	Município	UF	Município	UF	Município																																																																																																																																																																																																																										
PB	Curral de Lima	SE	Raposo Alegre	TO	Colinas do Tocantins																																																																																																																																																																																																																										
PE	Esmeralda	SE	Ipaporanga	TO	Conto Magalhães																																																																																																																																																																																																																										
PE	Goio do Brejo	SE	Itaueira	TO	Cristalina																																																																																																																																																																																																																										
PE	Guilherme	SE	Laranjeiras	TO	Cristalândia																																																																																																																																																																																																																										
PE	Raposo Alegre	SE	Matador	TO	Distrito do Tocantins																																																																																																																																																																																																																										
PE	Januária	SE	Miranim	TO	Distrito do Tocantins																																																																																																																																																																																																																										
PE	Juazeiro	SE	Natividade	TO	Goianorte																																																																																																																																																																																																																										
PE	Jurupiranga	SE	Paracuru	TO	Gurupi																																																																																																																																																																																																																										
PE	Maranguape	SE	Passagem	TO	Itambé																																																																																																																																																																																																																										
PE	Mari	SE	Praia	TO	Itapetininga																																																																																																																																																																																																																										
PE	Mulungu	SE	Riachuelo	TO	Raposo do Tocantins																																																																																																																																																																																																																										
PE	Natal	SE	Ribânia do Café	TO	Juarina																																																																																																																																																																																																																										
PE	Oliveiras	SE	Salgado	TO	Marianópolis do Tocantins																																																																																																																																																																																																																										
PE	Pio XI	SE	Santa Luiza do Maranhão	TO	Matias																																																																																																																																																																																																																										
PE	Quilândia	SE	Santana de São Francisco	TO	Maurilândia do Tocantins																																																																																																																																																																																																																										
PE	Ramagim	SE	Santa Rosa de Lima	TO	Monte Santo do Tocantins																																																																																																																																																																																																																										
PE	Paulista	SE	São Domingos	TO	Muriciópolis																																																																																																																																																																																																																										
PE	Riacho de Santa Antônia	SE	Siri	TO	Nova Glória																																																																																																																																																																																																																										
PE	Salgado de São Félix	TO	Almoxaranda	TO	Novo Acrelândia																																																																																																																																																																																																																										
PE	Santa Carolina	TO	Alto do Tocantins	TO	Palmeirante																																																																																																																																																																																																																										
PE	São José do Bonfim	TO	Aragominas	TO	Paulo Afonso																																																																																																																																																																																																																										
PE	São José do Bonfim	TO	Araguama	TO	Colméia																																																																																																																																																																																																																										
PE	Serra Hedida	TO	Araguari	TO	Pradópolis do Tocantins																																																																																																																																																																																																																										
PE	Solidão	TO	Araguaína	TO	Prata																																																																																																																																																																																																																										
PE	Umbuzeiro	TO	Araripe	TO	Prata																																																																																																																																																																																																																										
PE	Araripe	TO	Bela Vista	TO	Ponte Alta do Tocantins																																																																																																																																																																																																																										
SE	Aracaju	TO	Bandeira do Tocantins	TO	Presidente Kennedy																																																																																																																																																																																																																										
SE	Aracaju	TO	Bandeira do Tocantins	TO	Rio Sono																																																																																																																																																																																																																										
SE	Aracaju	TO	Bandeira do Tocantins	TO	Santa Fé de Araguaína																																																																																																																																																																																																																										
SE	Aracaju	TO	Bandeira do Tocantins	TO	Santa Filomena																																																																																																																																																																																																																										
SE	Aracaju	TO	Bandeira do Tocantins	TO	São Valério																																																																																																																																																																																																																										
SE	Aracaju	TO	Bandeira do Tocantins	TO	Tupirama																																																																																																																																																																																																																										
SE	Aracaju	TO	Bandeira do Tocantins	TO	Wanderlândia																																																																																																																																																																																																																										
SE	Aracaju	TO	Bandeira do Tocantins	TO	Wanderlândia																																																																																																																																																																																																																										
SE	Aracaju	TO	Bandeira do Tocantins	TO	Wanderlândia																																																																																																																																																																																																																										
SE	Aracaju	TO	Bandeira do Tocantins	TO	Wanderlândia																																																																																																																																																																																																																										

Na sequência, o Sr. **Leandro Guerra** passou a reportar as informações quanto ao quarto item de sua agenda que diz respeito aos **municípios com limpeza da faixa de 3,5 GHz concluída** e, para tanto, projetou o **slide** abaixo reproduzido que mostra os 623 municípios em que a desocupação e a mitigação, incluindo a franja de 20 km, foram concluídas e a instalação TVRO iniciada, ressaltando a sua distribuição por Unidades da Federação, bem como o perfil desses municípios por fases do projeto, com destaque para os 325 municípios de São Paulo:

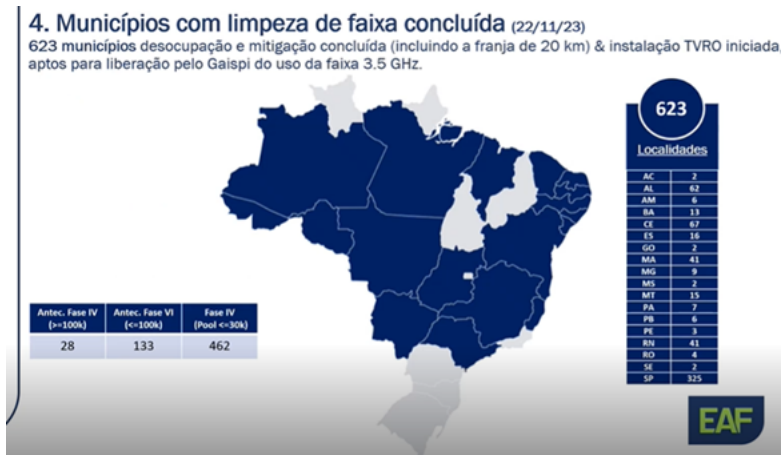

Nesse sentido, o Sr. **Leandro Guerra** apresentou a relação dos 623 municípios em apreço, conforme **slides** a seguir transcritos, reiterando que os municípios destacados em cinza se referem à antecipação da Fase 6 do projeto:

4. Municípios com limpeza de faixa concluída

356 (06/11) e 267 (22/11) municípios desocupação e mitigação concluída (incluindo a franja de 20 km) & instalação TVRO iniciada

UF	Município	UF	Município	UF	Município
AM	Maná	SP	Agua da Prata	SP	Bom Sucesso de Itararé
GO	Aracapan	SP	Agua de Lindoia	SP	Borboleta
GO	Bom Jesus de Goiás	SP	Agua de Santa Bárbara	SP	Buriti
MG	Campo Belo	SP	Alfândega	SP	Buritizeiro
MG	Carvalhos	SP	Alfândega	SP	Caracara Paulista
MG	Fronteira	SP	Alfândega	SP	Carandá
MG	Itaúba	SP	Alfândega	SP	Catanduva
MG	Itaúba	SP	Alfândega	SP	Catanduva
MG	Lagoa da Prata	SP	Alfândega	SP	Catanduva
MG	São Lourenço	SP	Alfândega	SP	Catanduva
MT	Barra do Garças	SP	Alfândega	SP	Catanduva
MT	Campo Verde	SP	Alfândega	SP	Catanduva
MT	Dom Aquino	SP	Alfândega	SP	Catanduva
MT	Nova Mutum	SP	Alfândega	SP	Catanduva
MT	Ponte de Areia	SP	Alfândega	SP	Catanduva
MT	Ponte de Areia	SP	Alfândega	SP	Catanduva
PA	Ponte de Areia	SP	Alfândega	SP	Catanduva
PB	Algodão	SP	Alfândega	SP	Catanduva
PB	Catinga	SP	Alfândega	SP	Catanduva
PB	Guarabira	SP	Alfândega	SP	Catanduva
PB	Piões	SP	Alfândega	SP	Catanduva
PB	Piões	SP	Alfândega	SP	Catanduva
PE	Carajás	SP	Alfândega	SP	Catanduva
RN	Agua Nova	SP	Alfândega	SP	Catanduva
RN	Escande	SP	Alfândega	SP	Catanduva
RN	Francisco Dantas	SP	Alfândega	SP	Catanduva
RN	Paulo Fernandes	SP	Alfândega	SP	Catanduva
RN	São Francisco do Oeste	SP	Alfândega	SP	Catanduva
SE	Rafaelia	SP	Alfândega	SP	Catanduva
SP	Adrianópolis	SP	Alfândega	SP	Catanduva
SP	Adolfo	SP	Alfândega	SP	Catanduva
SP	Agulhas	SP	Alfândega	SP	Catanduva
		SP	Alfândega	SP	Catanduva

Item
Descrição

4. Municípios com limpeza de faixa concluída

356 (06/11) e 267 (22/11) municípios desocupação e mitigação concluída (incluindo a franja de 20 km) & instalação TVRO iniciada

UF	Município	UF	Município	UF	Município
ES	Goianá	MA	Miracul	PA	Taiobá
ES	Banhão	MA	Monte Alto	PA	Taurumã
ES	Blumenau	MA	Nova Religiosa	PA	Patos
ES	Inapi	MA	Palmeirópolis	PE	Caranhato
ES	Sina	MA	Paulino Neves	PE	Santa Cruz do Capibaribe
ES	Monte Freixo	MA	Fort Mafra	RN	Alcides Bezerra
ES	Rio Bonanal	MA	Porto Rico do Maranhão	RN	Alfo de Rodrigues
ES	Santa Teresinha	MA	Presidente Vargas	RN	Bento Fernandes
ES	São Roque do Canaã	MA	Primeira Cruz	RN	Caçara do Norte
ES	Solânea	MA	Ribamar Figueira	RN	Caranduí
ES	Venda Nova do Imigrante	MA	Santana do Maranhão	RN	Felipe Guerra
MA	Açailândia	MA	Santo Amaro do Maranhão	RN	Galvão
MA	Água Doce do Maranhão	MA	São Benedito do Rio Preto	RN	Governador Dix Seixas
MA	Adriães Alves	MA	São João Batista	RN	Guamantã
MA	Anajás	MA	São Luís Gonzaga do Maranhão	RN	Umarizal
MA	Apicumã	MA	Serra do Maranhão	RN	Bomfim
MA	Araripe	MA	Turilândia	RN	Jardim de Angicos
MA	Bacabal	MA	Uruçuca	RN	Júlio César
MA	Bacanga	MG	Uruçuca	RN	Lagoa de Velhos
MA	Bacurituba	MG	Nova Friburgo	RN	Milagres
MA	Bacuri	MS	Casagrande	RN	Montanhas
MA	Bela Vista	MS	Rio Brilhante	RN	Paraíba
MA	Belmonte	MT	Comodoro	RN	Santa Maria
MA	Belmonte	MT	Lambari D'Oeste	RN	Pedra Grande
MA	Belmonte	MT	Reserva do Cabajal	RN	Pedra Preta
MA	Belmonte	MT	Santa Carmem	RN	Pedra Verde
MA	Belmonte	MT	São João do Rio Preto	RN	Pedrinhas
MA	Belmonte	MT	Santo Antônio do Leite	RN	Porto do Mangue
MA	Belmonte	MT	Val de São Domingos	RN	Serra Caiada
MA	Belmonte	MT	Vera	RN	Riachão
MA	Belmonte	PA	Abacuruba	RN	Santa Helena
MA	Belmonte	PA	Cametá	RN	São Bento do Norte
MA	Belmonte	PA	Rathbun	RN	São José do Campestre
MA	Belmonte	PA	Paragominas	RN	São Paulo do Potengi

4. Municípios com limpeza de faixa concluída


356 (06/11) e 267 (22/11) municípios desocupação e mitigação concluída (incluindo a franja de 20 km) & instalação TVRO iniciada

UF	Município
RN	Senador Elói de Souza
RN	Serra Negra
RN	Tangará
RN	Touros
RN	Upanema
RN	Vitória
RO	Colorado do Oeste
RO	Presidente Médici
RO	Chaparrão
RO	Monte Negro
SE	Lagarto

4. Estudo mitigação da franja para liberação do uso da faixa

3.300 a 3.700 MHz (Fase IV-E)

Ex. Alambari, Boituva, Cerquilha, Itapetininga, Quadra, Sarapuí e Tatuí - SP

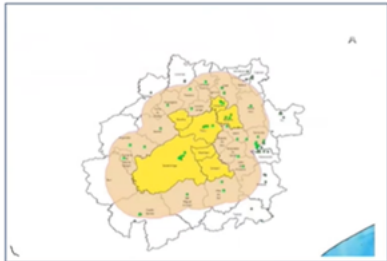

Municípios analisados

Município	Data de liberação original	Data de início da migração
Alambari	Menos de 30 mil	06/11/2023
Boituva	01/01/2026	06/11/2023
Cerquilha	01/01/2026	06/11/2023
Itapetininga	30/06/2024	06/11/2023
Quadra	Menos de 30 mil	06/11/2023
Sarapuí	Menos de 30 mil	06/11/2023
Tatuí	30/06/2024	06/11/2023

• Processo 53500.100409/2023-55 CT 148/23 de 10/11/2023 – Fase IV - E

7 municípios mitigados com 29 municípios na franja 20km

- Fronteira de 20 km do Município
- Estações FSS dentro do raio de 20 km (franja)
- Estações FSS fora do raio de 20 km

Ainda a respeito desse tema, o Sr. **Leandro Guerra** trouxe um exemplo de limpeza da faixa no caso da mitigação, salientando que existe uma diretriz de desocupação e mitigação referente à premissa de que todas as estações FSS que estejam em torno da área do município que se pretende liberar e realizar a limpeza da faixa, em uma franja de 20 km, devem necessariamente ser também atendidas. Trouxe, em seu exemplo, 7 municípios do interior do Estado de São Paulo (Alambari, Boituva, Cerquilha, Itapetininga, Quadra, Sarapuí e Tatuí) da fase de novembro e em que houve a limpeza da faixa de 3,5 GHz e que estão aptos a serem liberados, com mais 29 municípios em torno da mencionada franja de 20 km, cujas estações estão totalmente protegidas, conforme *slide* a seguir transcrito:


O Sr. **Leandro Guerra** apresentou outro exemplo relativo à fase de dezembro (4-F) e em relação a 7 municípios do Estado do Ceará (Graça, Hidrolândia, Mucambo, Pacujá, Pires Ferreira, Reriutaba e Varjota) com 19 municípios na franja de 20 km, onde estariam as estações FSS devidamente mitigadas, e que são municípios preparados para a deliberação pelo uso da faixa, nos termos do seguinte *slide*:

https://sei.anatel.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=12744064&infra... 7/21

Item | **Descrição**

4. Estudo mitigação da franja para liberação do uso da faixa 3.300 a 3.700 MHz (Fase IV-F)

Ex. Graça, Hidrolândia, Mucambo, Pacujá, Pires Ferreira, Reriutaba e Varjota - CE




Municípios analisados

Município	Data de liberação original ¹	Data de início da migração
Graça	Menos de 30 mil - 30/06/24	22/11/2023
Hidrolândia	Menos de 30 mil - 30/06/24	22/11/2023
Mucambo	Menos de 30 mil - 30/06/24	22/11/2023
Pacujá	Menos de 30 mil - 30/06/24	22/11/2023
Pires Ferreira	Menos de 30 mil - 30/06/24	22/11/2023
Reriutaba	Menos de 30 mil - 30/06/24	22/11/2023
Varjota	Menos de 30 mil - 30/06/24	22/11/2023

• Processo 53500.100409/2023-55 CT 151 e 152/23 de 22/11/2023 - Fase IV - F

7 municípios mitigados com 19 municípios na franja 20km

● Fronteira de 20 km do Município
● Estações FSS dentro do raio de 20 km (franja)
● Estações FSS fora do raio de 20 km



Por fim, o Sr. **Leandro Guerra** projetou um *slide* que apresenta um panorama geral de liberação da faixa de 3,5 GHz, abaixo reproduzido, salientando que essas informações consideram as liberações a serem tomadas na presente Reunião Ordinária em relação aos 623 municípios, mostrando, portanto, qual o cenário a EAF pretende atingir, chegando ao total de 3.079 municípios liberados, conforme a distribuição por Unidade da Federação. Esclareceu que as barras ao centro do *slide* demonstram como se encontra o atendimento da limpeza e da liberação da faixa sob a ótica original da obrigação do Edital de Licitação do 5G, e citou as informações nelas contidas:

4. Panorama Geral Liberação Faixa 3,5 GHz (29/11/23)

3.079

Localidades	Quantidade
AC	11
AL	102
AM	75
AP	16
BA	60
CE	120
DF	1
ES	52
GO	84
MA	69
MG	215
MS	38
MT	47
PA	53
PB	43
PE	41
PI	19
PR	399
RJ	92
RN	79
RO	13
RR	15
RS	472
SC	295
SE	10
SP	645
TO	35

REALIZAÇÃO - EDITAL

Fase	Quantidade	Atendimento	Prazo
Fase I (Obrigatório)	27 Municípios	100%	até 28/10/22
Fase II	26 Municípios	100%	até 01/01/23
Fase III	102 Municípios	100%	até 30/06/23
Fase IV (143 Municípios)	143 Municípios	84% / 100%	até 30/06/24
Fase V (142 Municípios)	142 Municípios	40% / 56% / 47%	até 01/01/26
Poço 30K (1.818 Municípios)	1.818 Municípios	41% / 52%	(3.208)


OBRIGAÇÃO - EDITAL

- 27 Municípios até 28/10/22 ✓
- 26 Municípios até 01/01/23 ✓
- 102 Municípios até 30/06/23 ✓
- 171 Municípios até 30/06/24 ✓
- 848 Municípios até 01/01/26

4.206 Municípios


- 25% até 30/06/23 - Fase III
- 50% até 30/06/24 - Fase IV
- 75% até 30/06/25 - Fase V
- 100% até 01/01/26 - Fase VI

UFs com liberação em todo o território - AL e SP neste Gaispi



• A EAF está atuando em 3.079 municípios.
 • Faixa liberada em 100% dos municípios dos estados: AL, AP, DF, PR, RJ, RR, RS, SC e SP
 • Antecipado em 7 meses do cumprimento da obrigação editalícia referente a Fase IV (171 municípios > 300K + 50% do pool de 30K)

Legenda: Cenário com a liberação dos 623 municípios da Fase IV-E e F, totalizando 3.079 municípios



Relativamente ao Panorama Geral, o Sr. **Leandro Guerra** destacou, em primeiro passo, que a EAF estaria atingindo a Fase 4 do Edital agora no mês de novembro de 2023, antecipando, desta forma, o atendimento dessa fase em sete meses em relação ao que estava projetado no Edital para o mês de junho de 2024. Destacou também que o mapa do Brasil à direita do *slide* mostra os estados em que houve 100% da liberação da faixa, sendo que, inicialmente, o Distrito Federal, seguido do Rio de Janeiro, dos três estados da Região Sul, de Roraima e do Amapá, e que, com a deliberação de hoje, a EAF alcançará 100% dos estados de Alagoas e de São Paulo, tornando-se um marco desse projeto.

Passando para o quinto item da agenda de Informe da EAF, Contratação de Serviços de Instalação TVRO, o Sr. **Leandro Guerra** afirmou que não haveria muitas novidades e projetou o *slide* a seguir transcrito, registrando que na medida em que a entidade evolui com as instalações, como de praxe, é trazida ao GAISPI a informação sobre novo processo de contratação, com um volume de 120 mil instalações, de acordo com a projeção da pesquisa realizada. Afirmou que são três fornecedores que estariam sendo contratados e no valor total de 25 milhões de reais para 54 municípios, conforme informações contidas no *slide* projetado. Ressaltou que essa questão da instalação tem sido um grande desafio da EAF, na medida em que avançam para o interior do País, tendo em vista que a tendência é que os custos aumentem, consignando, no entanto, que a entidade tem conseguido manter níveis de custos até abaixo da média, que é o caso da contratação abaixo identificada:


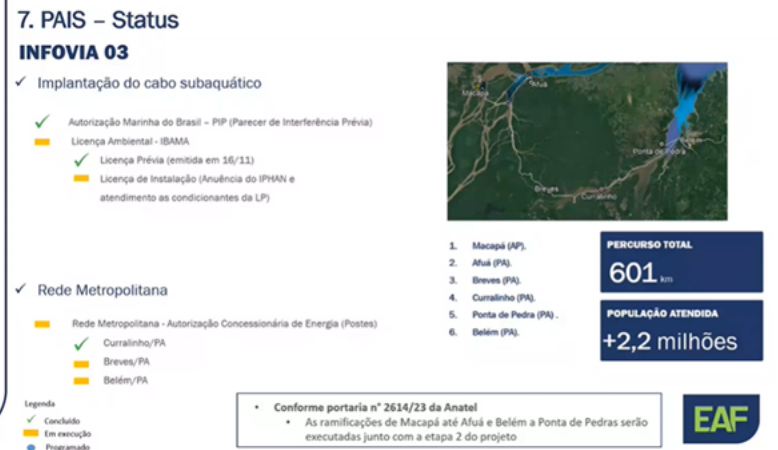

5. Processo de Instalação TVRO



Processo	Objeto	Qtde de Municípios	Volume Instalações Previstas	Fornecedor	Total	média Geral
EAF_23_0175	Serviço de Instalação de TVRO - Fase IV complementar plus	54	119.517	Vivensis Sky Visiontec	R\$ 25.113.364,70	R\$ 210,12



Em seguida, o Sr. **Leandro Guerra** passou para o sexto item da agenda, Planejamento TVRO – Plano de Aceleração de Instalação, e projetou um gráfico, abaixo reproduzido e que é compartilhado desde o mês de julho de 2023 a pedido do GAISPI, que mostra uma projeção das instalações, mês a mês, com um plano para chegar até o mês de outubro e ter realizado as 5 milhões e 500 mil instalações apontadas pela pesquisa realizada pela entidade como demanda de TVRO pelos beneficiários do Cadastro Único:

Item	Descrição
	<p style="text-align: center;">6. Planejamento TVRO – Plano de Aceleração de Instalação</p> <p style="text-align: center;">Instalados/Demanda Potencial*</p> <p>* considera resultado da atual pesquisa de aprox. 5.5 MM</p> <p>... Redução do prazo de implementação da Fase VI para Out/25</p>  <p>Nesse contexto, o Sr. Leandro Guerra informou que, no mês de novembro, atingiram 25,9% da demanda total, praticamente o que está acima do que estava projetado (24,3%), e que, no mês de dezembro, a entidade projeta chegar a 29% da demanda total, isto é, 3 pontos acima do planejado, e assim por diante, sendo essa a estratégia de aceleração já compartilhada anteriormente.</p> <p>Prosseguindo com a sua apresentação, o Sr. Leandro Guerra passou a reportar informações sobre o sétimo ponto da agenda da EAF, Projeto PAIS e, para tanto, apresentou o <i>slide</i> abaixo reproduzido para mostrar uma realidade que a entidade vem enfrentando em relação à seca na Região Norte, a partir de notícias divulgadas recentemente:</p> <p style="text-align: center;">7. Matérias – Seca na Região Norte novembro/2023</p>  <p>No que se refere ao tema, o Sr. Leandro Guerra afirmou que essa situação tem impactado o projeto, em especial o lançamento das Infovias 02 e 04, tendo em vista que tanto o Rio Solimões como o Rio Branco estão sendo muito impactados com a seca, salientando tratar-se de uma seca histórica que há mais de 100 anos não acontecia na Região. Informou que os impactos estão relacionados à logística e à recepção dos insumos em todos os projetos da EAF, inclusive nas instalações de kits de TVRO.</p> <p>Nesse cenário, projetou <i>slide</i> que mostra o mapa do projeto Norte Conectado, com as 6 Infovias do Projeto EAF, destacando que a execução ocorre em duas etapas, sendo que as Infovias 02, 03 e 04, hachuradas em vermelho, compõem a primeira etapa, e as Infovias 05, 06 e 08, compõem a segunda etapa do projeto:</p> <p style="text-align: center;">NORTE CONECTADO > As 6 Infovias do Projeto EAF</p>  <p>Afirmou que as Infovias 05, 06 e 08, também estariam sendo impactadas pela seca, e que o planejamento original do levantamento da rota (EVR – Estudo de Viabilidade da Rota) passou a ter previsão para o início do próximo ano, assim que houver condições.</p> <p>O Sr. Leandro Guerra projetou os <i>slides</i> abaixo reproduzidos que mostram detalhes da etapa 1, a começar pelas informações a respeito da Infovia 03:</p>

Item	Descrição
	<div data-bbox="335 107 1117 548"> <h3>7. Projeto PAIS: Etapa 1</h3> <h4>INFOVIA 03</h4> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Concluído – Implantação da Infraestrutura de Passagem e Ancoragem (IPA). ✓ Concluído – Implantação do Centro Móvel de Alta Disponibilidade (CMAD).* ✓ Concluído – Implantação do Sistema de Transmissão Óptica (STO/DWDM). <p><small>* CMAD em processo de instalação na cidade de Breves/PA.</small></p>  </div> <div data-bbox="335 604 1117 1052"> <h3>7. PAIS – Status</h3> <h4>INFOVIA 03</h4> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Implantação do cabo subaquático <ul style="list-style-type: none"> ✓ Autorização Marinha do Brasil – PIP (Parecer de Interferência Prévia) ✓ Licença Ambiental - IBAMA ✓ Licença Prévia (emitida em 16/11) ✓ Licença de Instalação (Anúncio do IPHAN e atendimento as condicionantes da LP) ✓ Rede Metropolitana <ul style="list-style-type: none"> Rede Metropolitana - Autorização Concessionária de Energia (Postes) ✓ Curralinho/PA ✓ Breves/PA ✓ Belém/PA <p>PERCURSO TOTAL 601 km</p> <p>POPULAÇÃO ATENDIDA +2,2 milhões</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Macapá (AP). 2. Açuá (PA). 3. Breves (PA). 4. Curralinho (PA). 5. Ponta de Pedra (PA). 6. Belém (PA). <p>Legenda ✓ Concluído ■ Em execução ● Programado</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>• Conforme portaria nº 2614/23 da Anatel • As ramificações de Macapá até Açuá e Belém a Ponta de Pedras serão executadas junto com a etapa 2 do projeto</p> </div>  </div>
	<div data-bbox="335 1075 1117 1209"> <p>Quanto à Infovia 03, o Sr. Leandro Guerra destacou que a partir da emissão da Licença de Instalação, a EAF conseguiria, no prazo de 10 (dez) dias, iniciar o lançamento da Infovia a partir de Belém.</p> </div> <div data-bbox="335 1220 1117 1265"> <p>Passando para a Infovia 04, o Sr. Leandro Guerra ressaltou que o prazo final desse projeto é fevereiro de 2026, segundo o Edital de Licitação, e exibiu os seguintes <i>slides</i> que detalham as informações sobre a execução da Infovia, afirmando que todo o esforço da EAF é no sentido de antecipar essas obrigações editalícias:</p> </div> <div data-bbox="335 1276 1117 1680"> <h3>7. Projeto PAIS: Etapa 1</h3> <h4>INFOVIA 04</h4> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Concluído – Implantação da Infraestrutura de Passagem e Ancoragem (IPA). ✓ Em execução – Implantação do Centro Móvel de Alta Disponibilidade (CMAD). ✓ Em execução – Implantação do Sistema de Transmissão Óptica (STO/DWDM).  </div>

Item	Descrição
	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <h3>7. PAIS – Status</h3> <h4>INFOVIA 04</h4> <p>✓ Implantação do cabo subaquático</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Autorização Marinha do Brasil – PIP (Parecer de Interferência Prévia) ✓ Licença Ambiental Federal – IBAMA <ul style="list-style-type: none"> Estudo Ambiental Simplificado ● Licença de Prévia (LP) ● Licença de Instalação (LI) ✓ Autorização DNIT – Backbone Terrestre <p>✓ Rede Metropolitana</p> <ul style="list-style-type: none"> Rede Metropolitana - Autorização Concessionária de Energia (Postes) <p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Concluído ● Em execução ● Programado  <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vila de Moura (AM). 2. Santa Maria do Boiaçu (RR). 3. Caracará (RR). 4. Boa Vista (RR). <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #2c5e8c; color: white;"> <p>PERCURSO TOTAL 655 km</p> <p>495 km rota subaquática 160 km rota terrestre</p> <p>POPULAÇÃO ATENDIDA +488 mil</p>  </div> </div> </div>

Ato contínuo, o Sr. **Leandro Guerra** exibiu os slides abaixo reproduzidos que passam a detalhar as informações sobre a execução da Infovia 02, ressaltando tratar-se de uma Infovia muito importante porque faz ligação com o PAC do Exército até a tríplice fronteira com a Colômbia e Peru, na região de Tabatinga:

7. PAIS – Status

INFOVIA 02

✓ Implantação do cabo subaquático

- ✓ Autorização para IPA (Infraestrutura de Passagem e Ancoragem)
- ✓ Autorização para CMAD (Centro Móvel de Alta Disponibilidade)
- ✓ Autorização Marinha do Brasil – PIP (Parecer de Interferência Prévia)
- ✓ Licença Ambiental Federal – IBAMA
 - Estudo Ambiental Simplificado
- Licença de Prévia (LP)
- Licença de Instalação (LI)
- ✓ Autorização DNIT – Backbone Terrestre

✓ Rede Metropolitana

- Rede Metropolitana - Autorização Concessionária de Energia (Postes)

Legenda

- ✓ Concluído
- Em execução
- Programado



1. Tefé (AM).
2. Abaralés (AM).
3. Uariní (AM).
4. Forte Boa (AM).
5. Jitai (AM).
6. Tomantina (AM).
7. Santo Antônio do Içá (AM).
8. Amaturá (AM).
9. São Paulo de Olivença (AM).
10. Belém de Solimões (AM).
11. Tabatinga (AM).
12. Benjamin Constant (AM).
13. Atalaia do Norte (AM).

PERCURSO TOTAL 1.100 km

POPULAÇÃO ATENDIDA +370 mil



Ainda sobre a Infovia 02, registrou a presença de um trecho terrestre que liga Benjamin Constant (AM) até Atalaia do Norte (AM), que é o último trecho dessa Infovia, assim como na Infovia 03 há a presença de um trecho terrestre de Curralinho (PA) a Boa Vista (AP). Registrou também que a Infovia 02 encontra-se no início e que é a maior Infovia dessa primeira etapa, possuindo mais localidades e exigindo um trabalho maior da entidade.

Em seguida, o Sr. **Leandro Guerra** apresentou as informações sobre o Plano de Lançamento da Etapa 1 que envolve as Infovias 02, 03 e 04, cujo cronograma sobre a implantação do cabo subaquático e da Rede Metropolitana, com o prazo de duração, previsões de início e de fim, bem como a presença de restrições hidrográficas e outras, encontra-se no slide abaixo reproduzido e por ele exibido, com a leitura das informações nele contidas:

7. Projeto PAIS: Etapa 1 Plano de Lançamento

✓ Implantação do cabo subaquático

	DURAÇÃO (lançamento do cabo)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	RESTRIÇÕES HIDROGRÁFICAS	RESTRIÇÕES Licença e Autorizações (Status)
INFOVIA 03	26 dias	D0+10 dias*	D0+36 dias	Sem Restrições	IBAMA LI/Em processo MARANHÃO Emiteido
INFOVIA 04	11 dias	D1+10 dias*	D1+21 dias	SET a DEZ	IBAMA Em processo MARANHÃO Emiteido
INFOVIA 02	29 dias	D2+10 dias*	D2+39 dias	SET a JAN	IBAMA Em processo MARANHÃO Em processo

*As datas planejadas de início de lançamento dependem essencialmente da emissão das licenças ambientais pelo IBAMA, autorização da Marinha e das condições hidrográficas.

✓ Implantação da Rede Metropolitana**

	PROJETOS E AUTORIZAÇÕES (Entrada no cronograma)	PREVISÃO INÍCIO IMPLANTAÇÃO***	PREVISÃO FIM IMPLANTAÇÃO
INFOVIA 03	20/10/2023	D3+90 dias	D3+170 dias
INFOVIA 04	27/10/2023	D4+90 dias	D4+170 dias
INFOVIA 02	11/12/2023	D5+90 dias	D5+280 dias

**Considera o cronograma da 3ª Rede Metropolitana da Infovia
***Depende da aprovação quantitativa e localização dos pontos de atendimento da Rede Metropolitana



Seguindo com as informações a respeito do Projeto PAIS, o Sr. **Leandro Guerra** projetou o slide a seguir transcrito que mostra os Pontos de Atendimento de cada uma das Redes Metropolitanas a partir de um quadro quantitativo e registrou que anexo à sua apresentação será colocada a lista de endereços individualizada para cada um dos pontos (escolas, fóruns da Justiça, prefeituras, hospitais e Forças Armadas):

Item	Descrição						
	7. Projeto PAIS: Pontos de Atendimentos*						
	Pontos de Atendimento – Rede Metropolitana* (Conforme Anexo IV-B item 2.2 do Edital 5G)						
	Cidades	Escolas	CNU	Prefeituras	Hospitais	Forças Armadas	Total
	Tefé	26	1	1	1	3	32
	Alvarães	6	1	1	1	-	9
	Uarini	8	1	1	1	-	11
	Fonte Boa	9	1	1	1	-	12
	Jutai	9	1	1	1	-	12
	Tomantins	10	1	1	1	-	13
	Santo Antonio do Iça	11	1	1	1	-	14
	Amaturá	4	1	1	1	-	7
	São Paulo de Olivença	9	1	1	1	-	12
	Belém do Solimões	3	-	-	1	-	4
	Tabatinga	18	1	1	1	3	24
	Benjamin Constant	11	1	1	1	-	14
	Atalaia do Norte	6	1	1	1	-	9
	Total – Infovias 02	130	12	12	13	6	173
	Belém	15	1	1	1	3	21
	Ponta de Pedras****	10	1	1	1	N/A	13
	Curralinho	5	1	1	1	N/A	8
	Breves	15	1	1	1	N/A	18
	Afuá****	5	1	1	1	N/A	8
	Macapá**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	São Sebastião da Boa Vista***	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Bagre****	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total – Infovias 03	50	5	5	5	3	68
	Boavista	29	1	1	1	2	34
	Caracará	7	1	1	1	1	11
	Santa Maria do Boaçu	2	-	-	1	-	3
	Vila de Moura / Barcelos -AM	2	-	-	1	-	3
	Total – Infovias 04	40	2	3	4	4	53
	Pontos de atendimento	220	19	20	22	13	294

*Conforme alinhado no GT-PAIS em 22/11/2023, lista em anexo.

Infovias:
 - Contrato de uso do postamento, será realizado em nome de implementador, durante o período de construção e transição para o MCOM.

**Somente CMAD; rede metropolitana já atendida pela infovias 00

***Não aplicável, sem instalação de CMAD e Rede Metropolitana

****Conforme portaria n° 2614/23 da Anatel

Sobre os Pontos de Atendimentos, chamou atenção para a questão das escolas para informar que, no projeto, o Edital de Licitação exige, em algumas localidades, a instalação de acesso à Rede Metropolitana em 10 escolas por localidade em que há abertura e que, no total do projeto, são 48 localidades. Nesse cenário, ressaltou que estaria se referindo apenas à fase 1, que envolve as Infovias 02, 03 e 04. O Sr. **Leandro Guerra** ainda deu o exemplo da localidade de Alvarães que possui somente 6 escolas, informando que o procedimento adotado pela EAF, alinhado com o entendimento do GT, é completar o total, multiplicando por 10 a quantidade de localidades e compensando aqueles municípios que têm menos escolas em outros municípios que têm mais escolas, como é caso de Tefé em que a entidade instalará acesso em 26 escolas.

Prosseguindo nesse tema, o Sr. **Leandro Guerra** exibiu o slide a seguir transcrito e informou que, a partir de amanhã, a EAF disponibilizará no endereço eletrônico abaixo identificado um novo portal específico desse grande projeto, com as seguintes informações:

7. Site Infovias

O objetivo deste ambiente é concentrar informações e dar visibilidade a evolução do projeto.




- Principais números
- Fases de implementação
- Mapa e ficha técnica de cada infovia
- Evolução do projeto por etapas-macro
- Documentos e relatório
- Conteúdos técnicos em texto, fotos e vídeos

www.eaf.org.br/infovias

Nesse ponto, o Sr. **Leandro Guerra** concedeu a palavra à Sr. **Patrícia de Oliveira Abreu**, Diretora de Comunicação da entidade, para que ela fizesse uma breve navegação no site em apreço para que os membros do Grupo pudessem conhecer melhor.

Na sequência, a Sra. **Patrícia de Oliveira Abreu** realizou a demonstração requerida, ressaltando que se trata de um site simples, mas com muita possibilidade de crescimento, que apresenta várias informações para cada uma das infovias do projeto, seja quanto à Rede Metropolitana, seja a respeito da instalação de infraestrutura e dos lançamentos dos cabos em si. Durante a navegação, a Sra. **Patrícia de Oliveira Abreu** mostrou que o site exibe informações desde uma visão geral do projeto, tais como as cidades atendidas, os km de cabos subaquáticos e a quantidade de hospitais, escolas e prefeituras atendidas, bem como informações mais detalhadas de cada infovia para as Fases 1 e 2 do projeto, a exemplo das cidades de início e fim, das localidades interligadas, até o detalhamento dos elementos que compõem o projeto, mapas, etapas de implementação e evolução das infovias. Informou também que o site possui uma área de documentação técnica que responde às obrigações do Edital e que podem ser usadas para dar transparência ao processo como um todo; e uma área com notícias, fotos e etc. A Sra. **Patrícia de Oliveira Abreu** finalizou a navegação afirmando que o site proporciona maior visibilidade para o projeto tão grandioso e que impactará tanto a população, quanto a sociedade formadora de opinião em geral.

Finalizando a sua apresentação sobre o Projeto PAIS, o Sr. **Leandro Guerra** projetou o slide abaixo reproduzido que mostra os dois processos de contratação de serviços de construção de Rede Óptica, realizando a leitura das informações nele contidas:

Item	Descrição																															
	<h3>7. Projeto PAIS - Serviços de Construção de Rede Óptica</h3> <table border="1"> <tr> <td>Processo</td> <td colspan="2">Infovias</td> </tr> <tr> <td>EAF_23_0161</td> <td>Construção do backbone Inclusão (Benjamin Constant até Atalaia do Norte)</td> <td>R\$ 5.987.420,35</td> </tr> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Processo</th> <th colspan="3">Aluguel de Pontos e Fiação (Postes)</th> <th rowspan="2">R\$ 10.600.183,20</th> </tr> <tr> <th>Qte de Pontos / Infovia Estimado</th> <th>Vigência Estimada (meses)</th> <th>Total 24 meses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">EAF_23_0180</td> <td>39.500</td> <td>24</td> <td>R\$ 7.756.183,20</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Gestão de infraestrutura e Monitoramento</td> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Qte de metros Enlaces Ópticos / Infovia Estimado</th> <th>Vigência Estimada (meses)</th> <th>Total 24 meses</th> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>1.185.000</td> <td>24</td> <td>R\$ 2.844.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">TOTAL R\$ 16.587.603,55</p> 	Processo	Infovias		EAF_23_0161	Construção do backbone Inclusão (Benjamin Constant até Atalaia do Norte)	R\$ 5.987.420,35	Processo	Aluguel de Pontos e Fiação (Postes)			R\$ 10.600.183,20	Qte de Pontos / Infovia Estimado	Vigência Estimada (meses)	Total 24 meses	EAF_23_0180	39.500	24	R\$ 7.756.183,20	Gestão de infraestrutura e Monitoramento					Qte de metros Enlaces Ópticos / Infovia Estimado	Vigência Estimada (meses)	Total 24 meses			1.185.000	24	R\$ 2.844.000,00
Processo	Infovias																															
EAF_23_0161	Construção do backbone Inclusão (Benjamin Constant até Atalaia do Norte)	R\$ 5.987.420,35																														
Processo	Aluguel de Pontos e Fiação (Postes)			R\$ 10.600.183,20																												
	Qte de Pontos / Infovia Estimado	Vigência Estimada (meses)	Total 24 meses																													
EAF_23_0180	39.500	24	R\$ 7.756.183,20																													
	Gestão de infraestrutura e Monitoramento																															
		Qte de metros Enlaces Ópticos / Infovia Estimado	Vigência Estimada (meses)	Total 24 meses																												
		1.185.000	24	R\$ 2.844.000,00																												

Ato contínuo, o Sr. **Leandro Guerra** passou a reportar o oitavo item de sua agenda, Projeto Rede Privativa de Governo, projetando o seguinte slide e realizando a leitura de cada uma das informações nele contidas sobre as Redes Móvel e Fixa, sem tecer outros comentários


8. Rede Privativa de Governo

REDE MÓVEL

- Diretrizes Técnicas aprovadas no GAISPI em 06/09
- RFPs em andamento:
 - MCPTx, publicada em 22/09, propostas recebidas em 03/11
 - Aluguel de Torres publicada em 17/10, propostas recebidas em 07/11
 - Core/Ran publicada em 29/09, propostas recebidas em 17/11
 - Rádio Microondas publicada em 05/10, propostas recebidas em 21/11
 - Rede Roteadores IP publicada em 04/10, propostas recebidas em 21/11
- Principais RFPs planejadas:
 - eMBMS será publicada em 29/11, com entrega das propostas finais em 27/12
 - Criptografia (em testes e elaboração)

REDE FIXA

- Diretrizes Técnicas aprovadas no GAISPI em 13/09
- 2° Workshop com órgãos do governo realizado em 16/11
- Necessidade de informação dos endereços dos 6.500 pontos a serem atendidos pelo projeto, conforme Anexo IV-B item 5. b) do Edital 5G
- A demanda deve ser informada até 12/2023 para que seja possível o cumprimento do prazo do projeto até fev/26




Também sobre o Projeto Rede Privativa de Governo, o Sr. **Leandro Guerra** informou que os processos de concorrência estariam em andamento e que a EAF teria recebido a maioria das RFPs, e que gostaria de destacar um tema importante que se refere à Portaria nº 1.924/SEI-MCOM, de 29 de janeiro de 2021, projetando os slides abaixo reproduzidos:

8. Rede Privativa de Governo



- A EAF ratifica o entendimento apresentado quanto aos requisitos para atendimento de governança nos processos de contratação (formulário abaixo):
 - Previsão: artigo 2º, § 10 da Portaria n.º 1.924/SEI-MCOM, de 29 de janeiro de 2021;
 - Aplicabilidade: equipamentos projetados, desenvolvidos, fabricados ou fornecidos por empresas que observem padrões de governança corporativa compatíveis com os exigidos no mercado acionário brasileiro;
 - Análise quanto ao atendimento pelos proponentes do formulário abaixo com os requisitos baseado nas normas e boas práticas relativas à governança corporativa no Brasil: Carta EAF encaminhada ao GAISPI e SETEL/MCOM em 29/09/23.

Tema	Prática de Governança
Demonstrações Financeiras	A empresa elabora demonstrações financeiras conforme os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil?
Aprovação de Contas dos Administradores	A empresa faz anualmente reunião de sócios e/ou Assembleia Geral de Acionistas para aprovação (i) das demonstrações financeiras do exercício; (ii) da destinação de lucros, quando aplicável e (iii) distribuição de dividendos, quando aplicável?
Capital Social e Direito a Voto	O capital sem direito a voto é limitado a 50% do capital total, quando aplicável?
Reuniões e Assembleias - Registro de atas perante a Junta Comercial	A empresa dá publicidade às suas atas de reunião de sócios/assembleias gerais e atas de reunião do conselho de administração (se houver) que tenham efeito perante terceiros por meio do registro na Junta Comercial/cartório, quando aplicável?
Estatuto Social e Atos Constitutivos	A empresa mantém seus atos constitutivos atualizados e disponíveis publicamente mediante o registro na Junta Comercial competente/cartório, quando aplicável?
Segregação de funções	Há uma matriz de segregação de funções das principais atividades da empresa?

Tema	Prática de Governança
Documentos Corporativos - Atualizações	A empresa realiza todas as adequações societárias necessárias e os devidos registros de documentos sempre que necessário?
Acesso a Informações	A empresa assegura o acesso à informação pelos sócios/acionistas com igual nível de profundidade e com simultaneidade, sem conferir tratamento privilegiado a parte ou grupo?
Aprovação de Contas dos Administradores - Proposta de Administração	> Caso a empresa seja uma Sociedade por ações, é elaborada e apresentada proposta da administração antes da Assembleia Geral Ordinária? > Caso a empresa seja uma Sociedade Limitada, as reuniões de sócios descrevem as questões abordadas e discutidas em suas atas?
Registro de Sócios	A empresa confere amplamente aos seus sócios acesso às informações sobre o registro de sócios, quando aplicável?
Publicação das Demonstrações Financeiras	A empresa está sujeita à obrigação legal de publicar suas demonstrações financeiras? Caso positivo, a empresa publica suas demonstrações financeiras em conformidade com a lei?
Código de Conduta Ética, Programa de Integridade e Canal de Denúncias	> A empresa possui código de conduta ética e programa de integridade aplicável à sua administração e ao corpo de funcionários?
Conselho de Administração e Conselho Fiscal	A empresa possui Conselho de Administração e/ou Conselho Fiscal, se aplicável?
Auditoria Independente	A empresa possui auditoria independente, se aplicável?



Item	Descrição																																																																																																																		
	<p>O Sr. Leandro Guerra informou que a referida Portaria estabelece a necessidade de atendimento pelos proponentes de que as suas práticas de governança corporativa sejam compatíveis com as exigidas no mercado acionário brasileiro, e que estaria falando, portanto, dos fornecedores de equipamentos projetados, desenvolvidos, fabricados ou fornecidos pelas empresas que participarem desse processo de concorrência. Nesse contexto, registrou que a EAF teria encaminhado uma carta ao GAISPI e à STEL/MCOM no final do mês de setembro, apresentando o formulário constante dos <i>slides</i> acima que contém os 14 requisitos que serão utilizados pela EAF na análise das propostas, com o objetivo de garantir o atendimento da Portaria nº 1.924/SEI-MCOM, de 29 de janeiro de 2021, e que gostaria de deixar esse registro em sua apresentação, para ciência do GAISPI.</p> <p>Em seguida, o Sr. Leandro Guerra projetou <i>slide</i> que mostra o cronograma das RFPs em andamento no que diz respeito à Rede Móvel:</p> <div data-bbox="319 336 1197 851" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <h3 style="text-align: center;">8. Rede Movel – Cronograma RFPs em andamento</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Objeto</th> <th>Processo</th> <th>Em Análise</th> <th>Atividade</th> <th>Data</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">Objeto: Plataformas MCFIX</td> <td rowspan="5">Processo: EAF_23_034</td> <td rowspan="5">42 dias</td> <td>Envio RFP Para Compras</td> <td>21/set</td> <td>Concluído</td> </tr> <tr> <td>Envio RFP Para o Mercado</td> <td>22/set</td> <td>Concluído</td> </tr> <tr> <td>Recolhimento das Perguntas</td> <td>24/set</td> <td>Concluído</td> </tr> <tr> <td>Envio das Respostas</td> <td>05/out</td> <td>Concluído</td> </tr> <tr> <td>Recolhimento das Propostas</td> <td>05/nov</td> <td>Concluído</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Objeto: Espaço de Infraestruturas de telecomunicação</td> <td rowspan="5">Processo: EAF_23_032</td> <td rowspan="5">21 dias</td> <td>Envio RFP Para Compras</td> <td>17/set</td> <td>Concluído</td> </tr> <tr> <td>Envio RFP Para o Mercado</td> <td>17/set</td> <td>Concluído</td> </tr> <tr> <td>Recolhimento das Perguntas</td> <td>20/set</td> <td>Concluído</td> </tr> <tr> <td>Envio das Respostas</td> <td>26/out</td> <td>Concluído</td> </tr> <tr> <td>Recolhimento das Propostas</td> <td>07/nov</td> <td>Concluído</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Objeto: Core EPC / IMS / Ran</td> <td rowspan="5">Processo: EAF_23_011</td> <td rowspan="5">49 dias</td> <td>Envio RFP Para Compras</td> <td>28/set</td> <td>Concluído</td> </tr> <tr> <td>Envio RFP Para o Mercado</td> <td>28/set</td> <td>Concluído</td> </tr> <tr> <td>Recolhimento das Perguntas</td> <td>25/out</td> <td>Concluído</td> </tr> <tr> <td>Envio das Respostas</td> <td>31/out</td> <td>Concluído</td> </tr> <tr> <td>Recolhimento das Propostas</td> <td>17/nov</td> <td>Concluído</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Objeto: Rede de Transporte (Radio Mirc-onodes)</td> <td rowspan="5">Processo: EAF_23_010</td> <td rowspan="5">46 dias</td> <td>Envio RFP Para Compras</td> <td>04/out</td> <td>Concluído</td> </tr> <tr> <td>Envio RFP Para o Mercado</td> <td>05/out</td> <td>Concluído</td> </tr> <tr> <td>Recolhimento das Perguntas</td> <td>25/out</td> <td>Concluído</td> </tr> <tr> <td>Envio das Respostas</td> <td>31/out</td> <td>Concluído</td> </tr> <tr> <td>Recolhimento das Propostas</td> <td>22/nov</td> <td>Concluído</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Objeto: Rede de Transporte (Roteadores)</td> <td rowspan="5">Processo: EAF_23_009</td> <td rowspan="5">47 dias</td> <td>Envio RFP Para Compras</td> <td>04/out</td> <td>Concluído</td> </tr> <tr> <td>Envio RFP Para o Mercado</td> <td>04/out</td> <td>Concluído</td> </tr> <tr> <td>Recolhimento das Perguntas</td> <td>25/out</td> <td>Concluído</td> </tr> <tr> <td>Envio das Respostas</td> <td>31/out</td> <td>Concluído</td> </tr> <tr> <td>Recolhimento das Propostas</td> <td>22/nov</td> <td>Concluído</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Objeto: eMBMS</td> <td rowspan="5">Processo: EAF_23_000</td> <td rowspan="5">29 dias</td> <td>Envio RFP Para Compras</td> <td>28/nov</td> <td>Concluído</td> </tr> <tr> <td>Envio RFP Para o Mercado</td> <td>29/nov</td> <td>Concluído</td> </tr> <tr> <td>Recolhimento das Perguntas</td> <td>04/dez</td> <td>Concluído</td> </tr> <tr> <td>Envio das Respostas</td> <td>11/dez</td> <td>Concluído</td> </tr> <tr> <td>Recolhimento das Propostas</td> <td>27/dez</td> <td>Concluído</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>O Presidente do GAISPI interrompeu a apresentação para questionar um aspecto levantado pelo Sr. Leandro Guerra anteriormente e que diz respeito à definição dos pontos da Rede Privativa da parte fixa, informando que gostaria de conceder à palavra ao Sr. Maximiliano Salvadori Martinhão, com o objetivo de saber se já conseguiria ter alguma sinalização ou formalização do lado do Ministério das Comunicações sobre esse tema.</p> <p>O Sr. Maximiliano Salvadori Martinhão esclareceu que o Ministério das Comunicações tem realizado muitas reuniões sobre esse tema com o Ministério da Gestão e Inovação e informou que foi encaminhado um Ofício para o Secretário Mascarenhas, no qual solicitou a identificação desses pontos e que estaria aguardando a resposta por parte do MGI. Consignou ainda que, enquanto o Ministério das Comunicações não recebe essa resposta, ao longo dessas últimas semanas, a Telebrás realizou em conjunto com o Ministério dois <i>workshops</i> para tratar da Rede Privativa e disponibilizou um formulário para todos os interessados de Governo que participaram, para que apontassem os pontos que eles teriam interesse de compor a Rede Privativa, e informou que a Telebrás estaria consolidando as respostas. O Sr. Maximiliano Salvadori Martinhão afirmou que, ontem, houve uma reunião com o Ministro das Comunicações e o Presidente da Telebrás e o MGI, cujo tema era a Rede Privativa, e que acredita que, nos próximos dias, deve ter um avanço nessa questão. Por fim, ressaltou que entende importante, de toda forma, esse alerta colocado pelo Sr. Leandro Guerra sobre a questão de prazo, para que essa preocupação com os prazos fique registrada em Ata, para que o Ministério possa alertar para essa necessidade de se ter uma resposta o quanto antes a respeito desses pontos.</p> <p>O Presidente do GAISPI agradeceu os esclarecimentos feitos pelo Sr. Maximiliano Salvadori Martinhão e informou que também entende importante esse registro em Ata e afirmou que, considerando essa perspectiva de prazo colocada pelo Sr. Leandro Guerra nesta Reunião, também gostaria de colocar na mesma proposta o seguinte: que o Sr. Maximiliano Salvadori Martinhão enviasse, ao final do mês de dezembro, as informações que tiverem para que possam se planejar para tanto e na medida em que ocorrerem adaptações, elas serão faseadas, ressaltando que, ainda que esse número não seja definitivo, a EAF já poderia dar início e depois realizaria incrementos marginais. Nesse contexto, o Presidente do GAISPI questionou ao Sr. Leandro Guerra se a questão poderia ser encaminhada nesses moldes propostos por ele ou se seria melhor aguardar as informações completas.</p> <p>O Sr. Leandro Guerra afirmou que, em sua visão, faria sentido a proposta do Presidente do GAISPI, ressaltando que não resolveria totalmente, mas que a EAF conseguiria dar início ao desenvolvimento das RFPs a partir de uma primeira informação, reforçando que o ideal seria que a entidade tivesse todas as informações e que, mesmo tendo as informações parciais, seria possível iniciar os trabalhos.</p> <p>O Presidente do GAISPI registrou que o que ele tem acompanhado é que a Telebrás e o Ministério vêm movimentando e que, portanto, imagina que, até 31 de dezembro, já tenham informações suficientes e, posteriormente, teriam algo incremental, afirmando que aqueles que ingressam no incremental deverão entender que ficarão para um segundo momento, ficando nessa condição, salientando que, seguindo a sua proposta, ao menos já seria possível iniciar o processo e ele não ficaria parado.</p> <p>O Sr. Leandro Guerra consignou que, quando a EAF tiver uma demanda complementar e dependendo do estágio em que estiver o desenvolvimento, talvez a entidade tenha que realizar ramificações dessa rede, não seria, portanto, um <i>anel/topologia</i> ideal. Salientou, por fim, que conseguiriam iniciar e depois realizar os ajustes necessários para uma segunda etapa, e que o importante seria ter uma primeira demanda já com os endereços para que possam começar os trabalhos.</p> <p>O Presidente do GAISPI registrou que, em algum momento, essa janela deve ser fechada mesmo, uma vez que o Governo continuará existindo e terá demandas por mais pontos sempre, no entanto, não seria possível aguardar essas informações fecharem, pois isso nunca acontecerá. Concluiu afirmando que, até 12 de dezembro, deve ser enviado um número, e se dirigiu ao Sr. Maximiliano Salvadori Martinhão, informando que depois poderia ser avaliado o estabelecimento de uma nova janela para envio de demandas.</p> <p>O Sr. Maximiliano Salvadori Martinhão esclareceu que essa é a perspectiva que o Ministério vem trabalhando no caso de não obterem resposta, isto é, passar os pontos que já foram recebidos e trabalhar no restante na medida em que chegarem, e afirmou ainda que prefere aguardar em função das reuniões que foram realizadas nessa última semana, antes de começar a trabalhar nessa perspectiva que, em sua visão, trata-se de um “plano B”.</p> <p>Quanto a esse ponto, finalmente, o Presidente do GAISPI propôs que a informação que o Ministério das Comunicações tiver até o final do mês de dezembro, ainda que não seja definitiva, seja encaminhada e informada que essa é a demanda até aquela data, para que se possa iniciar o trabalho e posteriormente proceder os ajustes.</p> <p>Outro ponto questionado pelo Presidente do GAISPI diz respeito à necessidade de criptografia e a ABIN e que gostaria de saber como se encontra esse aspecto. O Sr. Leandro Guerra esclareceu que no projeto de criptografia estão sendo desenvolvidos testes junto com a ABIN e</p>	Objeto	Processo	Em Análise	Atividade	Data	Status	Objeto: Plataformas MCFIX	Processo: EAF_23_034	42 dias	Envio RFP Para Compras	21/set	Concluído	Envio RFP Para o Mercado	22/set	Concluído	Recolhimento das Perguntas	24/set	Concluído	Envio das Respostas	05/out	Concluído	Recolhimento das Propostas	05/nov	Concluído	Objeto: Espaço de Infraestruturas de telecomunicação	Processo: EAF_23_032	21 dias	Envio RFP Para Compras	17/set	Concluído	Envio RFP Para o Mercado	17/set	Concluído	Recolhimento das Perguntas	20/set	Concluído	Envio das Respostas	26/out	Concluído	Recolhimento das Propostas	07/nov	Concluído	Objeto: Core EPC / IMS / Ran	Processo: EAF_23_011	49 dias	Envio RFP Para Compras	28/set	Concluído	Envio RFP Para o Mercado	28/set	Concluído	Recolhimento das Perguntas	25/out	Concluído	Envio das Respostas	31/out	Concluído	Recolhimento das Propostas	17/nov	Concluído	Objeto: Rede de Transporte (Radio Mirc-onodes)	Processo: EAF_23_010	46 dias	Envio RFP Para Compras	04/out	Concluído	Envio RFP Para o Mercado	05/out	Concluído	Recolhimento das Perguntas	25/out	Concluído	Envio das Respostas	31/out	Concluído	Recolhimento das Propostas	22/nov	Concluído	Objeto: Rede de Transporte (Roteadores)	Processo: EAF_23_009	47 dias	Envio RFP Para Compras	04/out	Concluído	Envio RFP Para o Mercado	04/out	Concluído	Recolhimento das Perguntas	25/out	Concluído	Envio das Respostas	31/out	Concluído	Recolhimento das Propostas	22/nov	Concluído	Objeto: eMBMS	Processo: EAF_23_000	29 dias	Envio RFP Para Compras	28/nov	Concluído	Envio RFP Para o Mercado	29/nov	Concluído	Recolhimento das Perguntas	04/dez	Concluído	Envio das Respostas	11/dez	Concluído	Recolhimento das Propostas	27/dez	Concluído
Objeto	Processo	Em Análise	Atividade	Data	Status																																																																																																														
Objeto: Plataformas MCFIX	Processo: EAF_23_034	42 dias	Envio RFP Para Compras	21/set	Concluído																																																																																																														
			Envio RFP Para o Mercado	22/set	Concluído																																																																																																														
			Recolhimento das Perguntas	24/set	Concluído																																																																																																														
			Envio das Respostas	05/out	Concluído																																																																																																														
			Recolhimento das Propostas	05/nov	Concluído																																																																																																														
Objeto: Espaço de Infraestruturas de telecomunicação	Processo: EAF_23_032	21 dias	Envio RFP Para Compras	17/set	Concluído																																																																																																														
			Envio RFP Para o Mercado	17/set	Concluído																																																																																																														
			Recolhimento das Perguntas	20/set	Concluído																																																																																																														
			Envio das Respostas	26/out	Concluído																																																																																																														
			Recolhimento das Propostas	07/nov	Concluído																																																																																																														
Objeto: Core EPC / IMS / Ran	Processo: EAF_23_011	49 dias	Envio RFP Para Compras	28/set	Concluído																																																																																																														
			Envio RFP Para o Mercado	28/set	Concluído																																																																																																														
			Recolhimento das Perguntas	25/out	Concluído																																																																																																														
			Envio das Respostas	31/out	Concluído																																																																																																														
			Recolhimento das Propostas	17/nov	Concluído																																																																																																														
Objeto: Rede de Transporte (Radio Mirc-onodes)	Processo: EAF_23_010	46 dias	Envio RFP Para Compras	04/out	Concluído																																																																																																														
			Envio RFP Para o Mercado	05/out	Concluído																																																																																																														
			Recolhimento das Perguntas	25/out	Concluído																																																																																																														
			Envio das Respostas	31/out	Concluído																																																																																																														
			Recolhimento das Propostas	22/nov	Concluído																																																																																																														
Objeto: Rede de Transporte (Roteadores)	Processo: EAF_23_009	47 dias	Envio RFP Para Compras	04/out	Concluído																																																																																																														
			Envio RFP Para o Mercado	04/out	Concluído																																																																																																														
			Recolhimento das Perguntas	25/out	Concluído																																																																																																														
			Envio das Respostas	31/out	Concluído																																																																																																														
			Recolhimento das Propostas	22/nov	Concluído																																																																																																														
Objeto: eMBMS	Processo: EAF_23_000	29 dias	Envio RFP Para Compras	28/nov	Concluído																																																																																																														
			Envio RFP Para o Mercado	29/nov	Concluído																																																																																																														
			Recolhimento das Perguntas	04/dez	Concluído																																																																																																														
			Envio das Respostas	11/dez	Concluído																																																																																																														
			Recolhimento das Propostas	27/dez	Concluído																																																																																																														

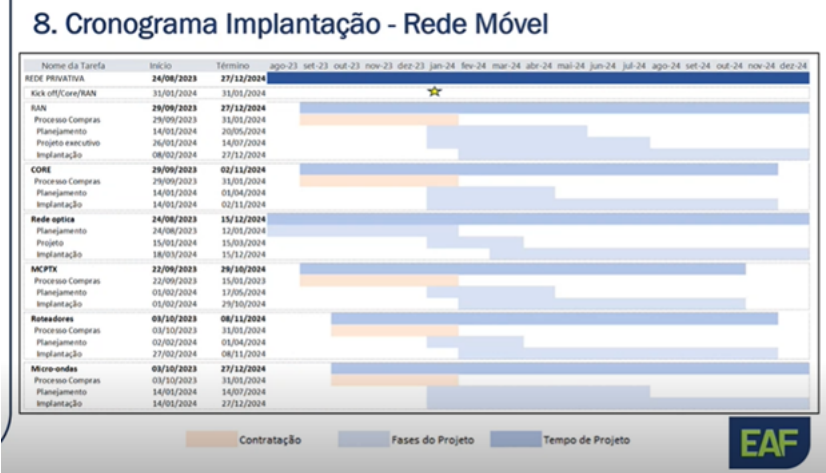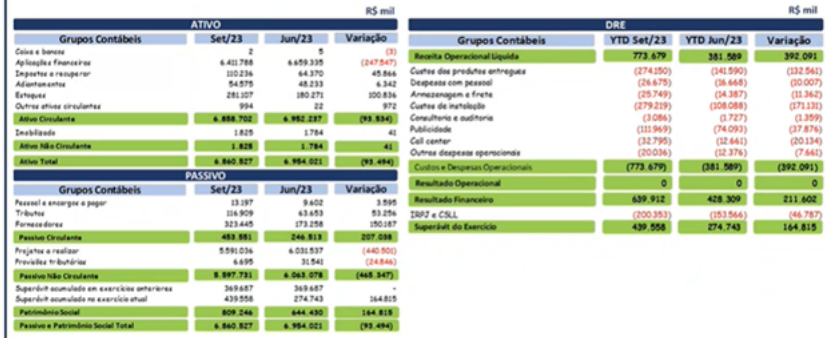Item	Descrição																																																																																																																																																																																																														
	<p>potenciais fornecedores e que se encontra bem adiantado e que a entidade estaria em constante diálogo com eles também. Com relação a esse ponto, o Sr. Antônio Carlos Parrini também esclareceu que ainda há uma conversa de que a ABIN cobraria como se fosse um <i>royalty</i> pelo algoritmo da criptografia. O Sr. Leandro Guerra informou que qualquer ponto que mereça mais atenção sobre esse tema seria sinalizado ao GAISPI.</p> <p>Prosseguindo com a sua apresentação, o Sr. Leandro Guerra projetou o <i>slide</i> a seguir transcrito que mostra o Cronograma da Implantação da Rede Móvel, afirmando que a previsão de conclusão seria o mês de dezembro de 2024, podendo ter um escape para o primeiro trimestre de 2025, ressaltando que ela se encontra dentro de um controle de cronograma:</p>																																																																																																																																																																																																														
	<p>8. Cronograma Implantação - Rede Móvel</p>  <p>Nome da Tarefa Início Término</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome da Tarefa</th> <th>Início</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REDE PRIVATIVA</td> <td>24/08/2023</td> <td>27/12/2024</td> </tr> <tr> <td>kick off/Conexão</td> <td>31/01/2024</td> <td>31/01/2024</td> </tr> <tr> <td>SAK</td> <td>29/09/2023</td> <td>27/12/2024</td> </tr> <tr> <td>Processo Compras</td> <td>29/09/2023</td> <td>31/01/2024</td> </tr> <tr> <td>Planejamento</td> <td>14/01/2024</td> <td>20/05/2024</td> </tr> <tr> <td>Projeto executivo</td> <td>26/01/2024</td> <td>14/07/2024</td> </tr> <tr> <td>Implantação</td> <td>08/02/2024</td> <td>27/12/2024</td> </tr> <tr> <td>CORE</td> <td>29/09/2023</td> <td>02/11/2024</td> </tr> <tr> <td>Processo Compras</td> <td>29/09/2023</td> <td>31/01/2024</td> </tr> <tr> <td>Planejamento</td> <td>14/01/2024</td> <td>01/04/2024</td> </tr> <tr> <td>Implantação</td> <td>14/01/2024</td> <td>02/11/2024</td> </tr> <tr> <td>Rede optica</td> <td>24/08/2023</td> <td>15/12/2024</td> </tr> <tr> <td>Planejamento</td> <td>24/08/2023</td> <td>12/01/2024</td> </tr> <tr> <td>Projeto</td> <td>15/01/2024</td> <td>15/03/2024</td> </tr> <tr> <td>Implantação</td> <td>16/01/2024</td> <td>15/12/2024</td> </tr> <tr> <td>MCPT</td> <td>22/09/2023</td> <td>26/10/2024</td> </tr> <tr> <td>Processo Compras</td> <td>22/09/2023</td> <td>15/01/2023</td> </tr> <tr> <td>Planejamento</td> <td>01/02/2024</td> <td>17/05/2024</td> </tr> <tr> <td>Implantação</td> <td>01/02/2024</td> <td>29/10/2024</td> </tr> <tr> <td>Rádios base</td> <td>01/02/2023</td> <td>08/11/2024</td> </tr> <tr> <td>Processo Compras</td> <td>01/02/2023</td> <td>31/01/2024</td> </tr> <tr> <td>Planejamento</td> <td>02/02/2024</td> <td>01/04/2024</td> </tr> <tr> <td>Implantação</td> <td>27/02/2024</td> <td>08/11/2024</td> </tr> <tr> <td>Micro-ondas</td> <td>01/10/2023</td> <td>27/12/2024</td> </tr> <tr> <td>Processo Compras</td> <td>01/10/2023</td> <td>31/01/2024</td> </tr> <tr> <td>Planejamento</td> <td>14/01/2024</td> <td>14/07/2024</td> </tr> <tr> <td>Implantação</td> <td>14/01/2024</td> <td>27/12/2024</td> </tr> </tbody> </table> <p>Contratação Fases do Projeto Tempo de Projeto</p> <p>EAF</p>	Nome da Tarefa	Início	Término	REDE PRIVATIVA	24/08/2023	27/12/2024	kick off/Conexão	31/01/2024	31/01/2024	SAK	29/09/2023	27/12/2024	Processo Compras	29/09/2023	31/01/2024	Planejamento	14/01/2024	20/05/2024	Projeto executivo	26/01/2024	14/07/2024	Implantação	08/02/2024	27/12/2024	CORE	29/09/2023	02/11/2024	Processo Compras	29/09/2023	31/01/2024	Planejamento	14/01/2024	01/04/2024	Implantação	14/01/2024	02/11/2024	Rede optica	24/08/2023	15/12/2024	Planejamento	24/08/2023	12/01/2024	Projeto	15/01/2024	15/03/2024	Implantação	16/01/2024	15/12/2024	MCPT	22/09/2023	26/10/2024	Processo Compras	22/09/2023	15/01/2023	Planejamento	01/02/2024	17/05/2024	Implantação	01/02/2024	29/10/2024	Rádios base	01/02/2023	08/11/2024	Processo Compras	01/02/2023	31/01/2024	Planejamento	02/02/2024	01/04/2024	Implantação	27/02/2024	08/11/2024	Micro-ondas	01/10/2023	27/12/2024	Processo Compras	01/10/2023	31/01/2024	Planejamento	14/01/2024	14/07/2024	Implantação	14/01/2024	27/12/2024																																																																																																																										
Nome da Tarefa	Início	Término																																																																																																																																																																																																													
REDE PRIVATIVA	24/08/2023	27/12/2024																																																																																																																																																																																																													
kick off/Conexão	31/01/2024	31/01/2024																																																																																																																																																																																																													
SAK	29/09/2023	27/12/2024																																																																																																																																																																																																													
Processo Compras	29/09/2023	31/01/2024																																																																																																																																																																																																													
Planejamento	14/01/2024	20/05/2024																																																																																																																																																																																																													
Projeto executivo	26/01/2024	14/07/2024																																																																																																																																																																																																													
Implantação	08/02/2024	27/12/2024																																																																																																																																																																																																													
CORE	29/09/2023	02/11/2024																																																																																																																																																																																																													
Processo Compras	29/09/2023	31/01/2024																																																																																																																																																																																																													
Planejamento	14/01/2024	01/04/2024																																																																																																																																																																																																													
Implantação	14/01/2024	02/11/2024																																																																																																																																																																																																													
Rede optica	24/08/2023	15/12/2024																																																																																																																																																																																																													
Planejamento	24/08/2023	12/01/2024																																																																																																																																																																																																													
Projeto	15/01/2024	15/03/2024																																																																																																																																																																																																													
Implantação	16/01/2024	15/12/2024																																																																																																																																																																																																													
MCPT	22/09/2023	26/10/2024																																																																																																																																																																																																													
Processo Compras	22/09/2023	15/01/2023																																																																																																																																																																																																													
Planejamento	01/02/2024	17/05/2024																																																																																																																																																																																																													
Implantação	01/02/2024	29/10/2024																																																																																																																																																																																																													
Rádios base	01/02/2023	08/11/2024																																																																																																																																																																																																													
Processo Compras	01/02/2023	31/01/2024																																																																																																																																																																																																													
Planejamento	02/02/2024	01/04/2024																																																																																																																																																																																																													
Implantação	27/02/2024	08/11/2024																																																																																																																																																																																																													
Micro-ondas	01/10/2023	27/12/2024																																																																																																																																																																																																													
Processo Compras	01/10/2023	31/01/2024																																																																																																																																																																																																													
Planejamento	14/01/2024	14/07/2024																																																																																																																																																																																																													
Implantação	14/01/2024	27/12/2024																																																																																																																																																																																																													
	<p>Ato contínuo, o Sr. Leandro Guerra passou para o último item de sua agenda, <u>Informações Financeiras</u>, e concedeu a palavra ao Sr. Paulo Roberto Cozza, Diretor Financeiro da EAF, para que realizasse essa parte da apresentação.</p> <p>O Sr. Paulo Roberto Cozza cumprimentou, inicialmente, a todos, e informou que começaria fazendo a apresentação que foi feita na reunião do GT-F do dia 14 com relação ao Terceiro Trimestre de 2023 que foi concluído e, para tanto, projetou o <i>slide</i> a seguir transcrito que mostra as demonstrações financeiras e contábeis, atendo-se às informações sobre ativo e passivo nele contidas:</p>																																																																																																																																																																																																														
	<p>9. Demonstração Financeira 3TRI/2023</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ATIVO</th> <th colspan="3">DRE</th> </tr> <tr> <th>Grupos Contábeis</th> <th>Set/23</th> <th>Jun/23</th> <th>Variação</th> <th>Grupos Contábeis</th> <th>YTD Set/23</th> <th>YTD Jun/23</th> <th>Variação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caixa e banco</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>(3)</td> <td>Receita Operacional Líquida</td> <td>773.679</td> <td>381.569</td> <td>392.091</td> </tr> <tr> <td>Aplicações Financeiras</td> <td>6.411.788</td> <td>6.659.335</td> <td>(247.547)</td> <td>Curtas de produtos entregues</td> <td>(274.250)</td> <td>(341.590)</td> <td>(132.561)</td> </tr> <tr> <td>Debitos a recuperar</td> <td>102.236</td> <td>64.370</td> <td>43.866</td> <td>Despesas com pessoal</td> <td>(26.675)</td> <td>(26.444)</td> <td>(2.007)</td> </tr> <tr> <td>Adiantamentos</td> <td>56.575</td> <td>48.233</td> <td>8.342</td> <td>Armazenagem e frete</td> <td>(25.749)</td> <td>(34.387)</td> <td>(11.362)</td> </tr> <tr> <td>Étapes</td> <td>281.127</td> <td>180.271</td> <td>100.856</td> <td>Curtas de material</td> <td>(279.219)</td> <td>(308.088)</td> <td>(371.131)</td> </tr> <tr> <td>Outras dívidas circulantes</td> <td>934</td> <td>22</td> <td>912</td> <td>Consultoria e auditoria</td> <td>(3.086)</td> <td>(1.727)</td> <td>(1.359)</td> </tr> <tr> <td>Ativos Circulantes</td> <td>6.854.702</td> <td>6.992.237</td> <td>(137.535)</td> <td>Publicidade</td> <td>(111.969)</td> <td>(74.093)</td> <td>(37.876)</td> </tr> <tr> <td>Imobilizado</td> <td>1.823</td> <td>1.794</td> <td>29</td> <td>Call center</td> <td>(32.795)</td> <td>(32.641)</td> <td>(20.134)</td> </tr> <tr> <td>Ativos Não Circulantes</td> <td>1.823</td> <td>1.794</td> <td>29</td> <td>Outras despesas operacionais</td> <td>(20.036)</td> <td>(32.376)</td> <td>(7.641)</td> </tr> <tr> <td>Ativos Total</td> <td>6.856.525</td> <td>6.994.031</td> <td>(137.506)</td> <td>Contas a Despesas Operacionais</td> <td>(773.679)</td> <td>(381.569)</td> <td>(392.091)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Resultado Operacional</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <th colspan="4">PASSIVO</th> <th colspan="3">Resultado Financeiro</th> </tr> <tr> <th>Grupos Contábeis</th> <th>Set/23</th> <th>Jun/23</th> <th>Variação</th> <th>DRE a CSLL</th> <td>(200.351)</td> <td>(153.566)</td> <td>(46.787)</td> </tr> <tr> <td>Pessoal e encargos a pagar</td> <td>13.197</td> <td>9.602</td> <td>3.595</td> <td>Superávit do Exercício</td> <td>437.568</td> <td>274.743</td> <td>164.815</td> </tr> <tr> <td>Tributos</td> <td>116.909</td> <td>63.650</td> <td>53.259</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reserva de risco</td> <td>323.445</td> <td>171.156</td> <td>152.289</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Passivos Circulantes</td> <td>453.551</td> <td>244.408</td> <td>209.143</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Projetos a realizar</td> <td>5.591.036</td> <td>6.031.537</td> <td>(440.501)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Previdência Inibitória</td> <td>6.699</td> <td>31.741</td> <td>(24.842)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Superávit Operacional</td> <td>6.397.781</td> <td>6.048.276</td> <td>(349.505)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Superávit acumulado no exercício anterior</td> <td>369.687</td> <td>369.687</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Superávit acumulado no exercício atual</td> <td>439.558</td> <td>274.743</td> <td>164.815</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Provisão Social</td> <td>809.246</td> <td>644.430</td> <td>164.816</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Passivos e Patrimônio Social Total</td> <td>6.856.525</td> <td>6.994.031</td> <td>(137.506)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Processo SEI 5.3500.088928/2021-76 CT 150/23 de 16/11/23</p> <p>EAF</p>	ATIVO				DRE			Grupos Contábeis	Set/23	Jun/23	Variação	Grupos Contábeis	YTD Set/23	YTD Jun/23	Variação	Caixa e banco	2	5	(3)	Receita Operacional Líquida	773.679	381.569	392.091	Aplicações Financeiras	6.411.788	6.659.335	(247.547)	Curtas de produtos entregues	(274.250)	(341.590)	(132.561)	Debitos a recuperar	102.236	64.370	43.866	Despesas com pessoal	(26.675)	(26.444)	(2.007)	Adiantamentos	56.575	48.233	8.342	Armazenagem e frete	(25.749)	(34.387)	(11.362)	Étapes	281.127	180.271	100.856	Curtas de material	(279.219)	(308.088)	(371.131)	Outras dívidas circulantes	934	22	912	Consultoria e auditoria	(3.086)	(1.727)	(1.359)	Ativos Circulantes	6.854.702	6.992.237	(137.535)	Publicidade	(111.969)	(74.093)	(37.876)	Imobilizado	1.823	1.794	29	Call center	(32.795)	(32.641)	(20.134)	Ativos Não Circulantes	1.823	1.794	29	Outras despesas operacionais	(20.036)	(32.376)	(7.641)	Ativos Total	6.856.525	6.994.031	(137.506)	Contas a Despesas Operacionais	(773.679)	(381.569)	(392.091)					Resultado Operacional	0	0	0	PASSIVO				Resultado Financeiro			Grupos Contábeis	Set/23	Jun/23	Variação	DRE a CSLL	(200.351)	(153.566)	(46.787)	Pessoal e encargos a pagar	13.197	9.602	3.595	Superávit do Exercício	437.568	274.743	164.815	Tributos	116.909	63.650	53.259					Reserva de risco	323.445	171.156	152.289					Passivos Circulantes	453.551	244.408	209.143					Projetos a realizar	5.591.036	6.031.537	(440.501)					Previdência Inibitória	6.699	31.741	(24.842)					Superávit Operacional	6.397.781	6.048.276	(349.505)					Superávit acumulado no exercício anterior	369.687	369.687	-					Superávit acumulado no exercício atual	439.558	274.743	164.815					Provisão Social	809.246	644.430	164.816					Passivos e Patrimônio Social Total	6.856.525	6.994.031	(137.506)				
ATIVO				DRE																																																																																																																																																																																																											
Grupos Contábeis	Set/23	Jun/23	Variação	Grupos Contábeis	YTD Set/23	YTD Jun/23	Variação																																																																																																																																																																																																								
Caixa e banco	2	5	(3)	Receita Operacional Líquida	773.679	381.569	392.091																																																																																																																																																																																																								
Aplicações Financeiras	6.411.788	6.659.335	(247.547)	Curtas de produtos entregues	(274.250)	(341.590)	(132.561)																																																																																																																																																																																																								
Debitos a recuperar	102.236	64.370	43.866	Despesas com pessoal	(26.675)	(26.444)	(2.007)																																																																																																																																																																																																								
Adiantamentos	56.575	48.233	8.342	Armazenagem e frete	(25.749)	(34.387)	(11.362)																																																																																																																																																																																																								
Étapes	281.127	180.271	100.856	Curtas de material	(279.219)	(308.088)	(371.131)																																																																																																																																																																																																								
Outras dívidas circulantes	934	22	912	Consultoria e auditoria	(3.086)	(1.727)	(1.359)																																																																																																																																																																																																								
Ativos Circulantes	6.854.702	6.992.237	(137.535)	Publicidade	(111.969)	(74.093)	(37.876)																																																																																																																																																																																																								
Imobilizado	1.823	1.794	29	Call center	(32.795)	(32.641)	(20.134)																																																																																																																																																																																																								
Ativos Não Circulantes	1.823	1.794	29	Outras despesas operacionais	(20.036)	(32.376)	(7.641)																																																																																																																																																																																																								
Ativos Total	6.856.525	6.994.031	(137.506)	Contas a Despesas Operacionais	(773.679)	(381.569)	(392.091)																																																																																																																																																																																																								
				Resultado Operacional	0	0	0																																																																																																																																																																																																								
PASSIVO				Resultado Financeiro																																																																																																																																																																																																											
Grupos Contábeis	Set/23	Jun/23	Variação	DRE a CSLL	(200.351)	(153.566)	(46.787)																																																																																																																																																																																																								
Pessoal e encargos a pagar	13.197	9.602	3.595	Superávit do Exercício	437.568	274.743	164.815																																																																																																																																																																																																								
Tributos	116.909	63.650	53.259																																																																																																																																																																																																												
Reserva de risco	323.445	171.156	152.289																																																																																																																																																																																																												
Passivos Circulantes	453.551	244.408	209.143																																																																																																																																																																																																												
Projetos a realizar	5.591.036	6.031.537	(440.501)																																																																																																																																																																																																												
Previdência Inibitória	6.699	31.741	(24.842)																																																																																																																																																																																																												
Superávit Operacional	6.397.781	6.048.276	(349.505)																																																																																																																																																																																																												
Superávit acumulado no exercício anterior	369.687	369.687	-																																																																																																																																																																																																												
Superávit acumulado no exercício atual	439.558	274.743	164.815																																																																																																																																																																																																												
Provisão Social	809.246	644.430	164.816																																																																																																																																																																																																												
Passivos e Patrimônio Social Total	6.856.525	6.994.031	(137.506)																																																																																																																																																																																																												
	<p>Em seguida, o Sr. Paulo Roberto Cozza projetou <i>slide</i> que exhibe os resultados do Terceiro Trimestre de 2023 e aponta as demonstrações propriamente ditas, e destacou as informações nele contidas quanto às receitas, custos e despesas, bem como os números dos resultados financeiros referentes ao rendimento das aplicações financeiras, e salientou as principais variações identificadas por projeto, cujas informações foram consignadas do lado direito do <i>slide</i>:</p>																																																																																																																																																																																																														

Item	Descrição																																																																																																																																																
	9. Resultado 3TRI/2023																																																																																																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DRE</th> <th>Orçado YTD Set/23</th> <th>YTD Set/23</th> <th>Variação</th> <th>YTD Jun/23</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita Diferida Líquida</td> <td>1.309,73</td> <td>772,84</td> <td>(536,88)</td> <td>381,59</td> </tr> <tr> <td>TVRO</td> <td>964,00</td> <td>639,97</td> <td>(324,03)</td> <td>314,49</td> </tr> <tr> <td>FSS</td> <td>37,46</td> <td>30,89</td> <td>(6,57)</td> <td>26,87</td> </tr> <tr> <td>PAIS</td> <td>138,91</td> <td>95,61</td> <td>(43,30)</td> <td>34,78</td> </tr> <tr> <td>REDE PRIVATIVA</td> <td>168,76</td> <td>6,37</td> <td>(162,39)</td> <td>5,44</td> </tr> <tr> <td>Custo</td> <td>(1.071,25)</td> <td>(627,01)</td> <td>444,24</td> <td>(286,60)</td> </tr> <tr> <td>TVRO</td> <td>(1.023,78)</td> <td>(591,95)</td> <td>431,83</td> <td>(257,89)</td> </tr> <tr> <td>FSS</td> <td>(47,47)</td> <td>(34,30)</td> <td>13,17</td> <td>(28,73)</td> </tr> <tr> <td>PAIS</td> <td>0,00</td> <td>99,11</td> <td>(99,11)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>REDE PRIVATIVA</td> <td>0,00</td> <td>(0,64)</td> <td>(0,64)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesa</td> <td>(238,48)</td> <td>(145,84)</td> <td>92,64</td> <td>(94,99)</td> </tr> <tr> <td>Compliance e Governança</td> <td>(7,33)</td> <td>(5,20)</td> <td>2,13</td> <td>(3,08)</td> </tr> <tr> <td>Comunicação</td> <td>(194,55)</td> <td>(118,63)</td> <td>79,92</td> <td>(77,97)</td> </tr> <tr> <td>Cooperativa</td> <td>(24,75)</td> <td>(16,09)</td> <td>8,66</td> <td>(30,21)</td> </tr> <tr> <td>Genf</td> <td>(7,80)</td> <td>(6,91)</td> <td>0,89</td> <td>(3,74)</td> </tr> <tr> <td>Outros</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Resultado Operacional</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Resultado Financeiro</td> <td>553,25</td> <td>658,17</td> <td>104,92</td> <td>426,31</td> </tr> <tr> <td>IRRF e CSLL</td> <td>(188,10)</td> <td>(218,62)</td> <td>(30,52)</td> <td>(53,57)</td> </tr> <tr> <td>Resultado do Exercício</td> <td>365,14</td> <td>439,55</td> <td>74,40</td> <td>274,74</td> </tr> <tr> <td>ESTOQUE EM CONSTRUÇÃO</td> <td>Orçado YTD Set/23</td> <td>YTD Set/23</td> <td>Variação</td> <td>YTD Jun/23</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>389,87</td> <td>112,48</td> <td>(277,39)</td> <td>42,96</td> </tr> <tr> <td>PAIS</td> <td>176,02</td> <td>106,05</td> <td>(69,98)</td> <td>37,35</td> </tr> <tr> <td>REDE PRIVATIVA</td> <td>213,85</td> <td>6,44</td> <td>(207,41)</td> <td>5,61</td> </tr> <tr> <td>ATIVO FIXO</td> <td>Orçado YTD Set/23</td> <td>YTD Set/23</td> <td>Variação</td> <td>YTD Jun/23</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1,75</td> <td>1,83</td> <td>0,08</td> <td>1,78</td> </tr> <tr> <td>ADMINISTRATIVO</td> <td>1,75</td> <td>1,83</td> <td>0,08</td> <td>1,78</td> </tr> </tbody> </table>					DRE	Orçado YTD Set/23	YTD Set/23	Variação	YTD Jun/23	Receita Diferida Líquida	1.309,73	772,84	(536,88)	381,59	TVRO	964,00	639,97	(324,03)	314,49	FSS	37,46	30,89	(6,57)	26,87	PAIS	138,91	95,61	(43,30)	34,78	REDE PRIVATIVA	168,76	6,37	(162,39)	5,44	Custo	(1.071,25)	(627,01)	444,24	(286,60)	TVRO	(1.023,78)	(591,95)	431,83	(257,89)	FSS	(47,47)	(34,30)	13,17	(28,73)	PAIS	0,00	99,11	(99,11)	0,00	REDE PRIVATIVA	0,00	(0,64)	(0,64)	0,00	Despesa	(238,48)	(145,84)	92,64	(94,99)	Compliance e Governança	(7,33)	(5,20)	2,13	(3,08)	Comunicação	(194,55)	(118,63)	79,92	(77,97)	Cooperativa	(24,75)	(16,09)	8,66	(30,21)	Genf	(7,80)	(6,91)	0,89	(3,74)	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	Resultado Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	Resultado Financeiro	553,25	658,17	104,92	426,31	IRRF e CSLL	(188,10)	(218,62)	(30,52)	(53,57)	Resultado do Exercício	365,14	439,55	74,40	274,74	ESTOQUE EM CONSTRUÇÃO	Orçado YTD Set/23	YTD Set/23	Variação	YTD Jun/23	TOTAL	389,87	112,48	(277,39)	42,96	PAIS	176,02	106,05	(69,98)	37,35	REDE PRIVATIVA	213,85	6,44	(207,41)	5,61	ATIVO FIXO	Orçado YTD Set/23	YTD Set/23	Variação	YTD Jun/23	TOTAL	1,75	1,83	0,08	1,78	ADMINISTRATIVO	1,75	1,83	0,08	1,78
DRE	Orçado YTD Set/23	YTD Set/23	Variação	YTD Jun/23																																																																																																																																													
Receita Diferida Líquida	1.309,73	772,84	(536,88)	381,59																																																																																																																																													
TVRO	964,00	639,97	(324,03)	314,49																																																																																																																																													
FSS	37,46	30,89	(6,57)	26,87																																																																																																																																													
PAIS	138,91	95,61	(43,30)	34,78																																																																																																																																													
REDE PRIVATIVA	168,76	6,37	(162,39)	5,44																																																																																																																																													
Custo	(1.071,25)	(627,01)	444,24	(286,60)																																																																																																																																													
TVRO	(1.023,78)	(591,95)	431,83	(257,89)																																																																																																																																													
FSS	(47,47)	(34,30)	13,17	(28,73)																																																																																																																																													
PAIS	0,00	99,11	(99,11)	0,00																																																																																																																																													
REDE PRIVATIVA	0,00	(0,64)	(0,64)	0,00																																																																																																																																													
Despesa	(238,48)	(145,84)	92,64	(94,99)																																																																																																																																													
Compliance e Governança	(7,33)	(5,20)	2,13	(3,08)																																																																																																																																													
Comunicação	(194,55)	(118,63)	79,92	(77,97)																																																																																																																																													
Cooperativa	(24,75)	(16,09)	8,66	(30,21)																																																																																																																																													
Genf	(7,80)	(6,91)	0,89	(3,74)																																																																																																																																													
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																													
Resultado Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																													
Resultado Financeiro	553,25	658,17	104,92	426,31																																																																																																																																													
IRRF e CSLL	(188,10)	(218,62)	(30,52)	(53,57)																																																																																																																																													
Resultado do Exercício	365,14	439,55	74,40	274,74																																																																																																																																													
ESTOQUE EM CONSTRUÇÃO	Orçado YTD Set/23	YTD Set/23	Variação	YTD Jun/23																																																																																																																																													
TOTAL	389,87	112,48	(277,39)	42,96																																																																																																																																													
PAIS	176,02	106,05	(69,98)	37,35																																																																																																																																													
REDE PRIVATIVA	213,85	6,44	(207,41)	5,61																																																																																																																																													
ATIVO FIXO	Orçado YTD Set/23	YTD Set/23	Variação	YTD Jun/23																																																																																																																																													
TOTAL	1,75	1,83	0,08	1,78																																																																																																																																													
ADMINISTRATIVO	1,75	1,83	0,08	1,78																																																																																																																																													
	<p>Principais Variações</p> <ul style="list-style-type: none"> TVRO <ul style="list-style-type: none"> Custo médio (economia de R\$ 134Milhões) <ul style="list-style-type: none"> Estimado R\$ 616 Realizado R\$ 484 Instalações (economia de R\$ 244Milhões): <ul style="list-style-type: none"> Estimado R\$ 1.500k Realizado R\$ 1.127k Escalonamento temporal do Call Center (economia de R\$ 22Milhões) FSS <ul style="list-style-type: none"> Instalações: <ul style="list-style-type: none"> Estimado R\$ 9k Realizado R\$ 5,8k Comunicação – Maior eficiência no direcionamento das campanhas Resultado Financeiro – melhora em função da não realização do caixa projetado e das melhores taxas de aplicação negociadas: <ul style="list-style-type: none"> Estimado 1,00%/am Realizado 1,06%/am (média) PAIS <ul style="list-style-type: none"> 3ª Parcela da Infovia (parcela de 10% paga em Agosto/2023) Instalação dos Cabos (aguardando melhora nas condições climáticas e liberação das licenças ambientais). Rede Privativa – em processo de RFP 																																																																																																																																																

Na sequência, o Sr. Paulo Roberto Cozza exibiu novo slide abaixo reproduzido que mostra o que a entidade já teve de consumo em cada projeto e o rateio que foi feito das áreas corporativas em cada um dos projetos, e lembrou que toda parte de comunicação, Call Center e TI relativa especificamente ao projeto de TVRO já é aplicada diretamente dentro do projeto de TVRO, sem realizar o rateio, e que as demais despesas, sim, são rateadas, e realizou a leitura das informações a seguir: Na sequência, o Sr. Paulo Roberto Cozza exibiu novo slide abaixo reproduzido que mostra o que a entidade já teve de consumo em cada projeto e o rateio que foi feito das áreas corporativas em cada um dos projetos, e lembrou que toda parte de comunicação, Call Center e TI relativa especificamente ao projeto de TVRO já é aplicada diretamente dentro do projeto de TVRO, sem realizar o rateio, e que as demais despesas, sim, são rateadas, e realizou a leitura das informações a seguir:

9. Rateio e Consumo do Projeto																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Projeto</th> <th>Base Rateio</th> <th>% Rateio</th> <th>Valor Rateado</th> <th>Total com Rateio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>(858,12)</td> <td>100,0%</td> <td>(27,20)</td> <td>(885,32)</td> </tr> <tr> <td>TVRO</td> <td>(710,50)</td> <td>82,8%</td> <td>(22,53)</td> <td>(733,11)</td> </tr> <tr> <td>FSS</td> <td>(34,30)</td> <td>4,0%</td> <td>(1,09)</td> <td>(35,39)</td> </tr> <tr> <td>PAIS + REDE PRIVATIVA</td> <td>(113,32)</td> <td>13,2%</td> <td>(3,58)</td> <td>(116,90)</td> </tr> <tr> <td>PAIS</td> <td>(106,18)</td> <td>12,4%</td> <td>(3,37)</td> <td>(109,55)</td> </tr> <tr> <td>REDE PRIVATIVA</td> <td>(7,00)</td> <td>0,8%</td> <td>(0,20)</td> <td>(7,30)</td> </tr> </tbody> </table>				Projeto	Base Rateio	% Rateio	Valor Rateado	Total com Rateio	Total	(858,12)	100,0%	(27,20)	(885,32)	TVRO	(710,50)	82,8%	(22,53)	(733,11)	FSS	(34,30)	4,0%	(1,09)	(35,39)	PAIS + REDE PRIVATIVA	(113,32)	13,2%	(3,58)	(116,90)	PAIS	(106,18)	12,4%	(3,37)	(109,55)	REDE PRIVATIVA	(7,00)	0,8%	(0,20)	(7,30)																					
Projeto	Base Rateio	% Rateio	Valor Rateado	Total com Rateio																																																								
Total	(858,12)	100,0%	(27,20)	(885,32)																																																								
TVRO	(710,50)	82,8%	(22,53)	(733,11)																																																								
FSS	(34,30)	4,0%	(1,09)	(35,39)																																																								
PAIS + REDE PRIVATIVA	(113,32)	13,2%	(3,58)	(116,90)																																																								
PAIS	(106,18)	12,4%	(3,37)	(109,55)																																																								
REDE PRIVATIVA	(7,00)	0,8%	(0,20)	(7,30)																																																								
	<p>Critério de Rateio</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão de toda a despesa de comunicação, Call center e de TI (softwares e serviços) no projeto TVRO Inclusão dos valores incorridos do PAIS e Rede Privativa que são Capex no custo dos respectivos projetos Demais despesas rateadas em função dos % calculados ao lado 																																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Projeto</th> <th>Valor Aportado</th> <th>Consumo 2022</th> <th>Consumo 2023</th> <th>Consumo Projeto</th> <th>Saldo do Projeto</th> <th>% Saldo</th> <th>Consumo Total Jun/23</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>6.313,37</td> <td>(199,18)</td> <td>(885,32)</td> <td>(1.084,50)</td> <td>5.228,87</td> <td>82,82%</td> <td>(623,72)</td> </tr> <tr> <td>TVRO</td> <td>3.579,68</td> <td>(143,73)</td> <td>(733,11)</td> <td>(876,84)</td> <td>2.702,84</td> <td>75,50%</td> <td>(493,63)</td> </tr> <tr> <td>FSS</td> <td>391,43</td> <td>(50,44)</td> <td>(35,39)</td> <td>(85,83)</td> <td>305,60</td> <td>78,07%</td> <td>(80,34)</td> </tr> <tr> <td>PAIS + REDE PRIVATIVA</td> <td>2.342,26</td> <td>(5,01)</td> <td>(116,82)</td> <td>(121,83)</td> <td>2.220,43</td> <td>94,80%</td> <td>(49,76)</td> </tr> <tr> <td>PAIS</td> <td>1.344,75</td> <td>(2,77)</td> <td>(109,55)</td> <td>(112,29)</td> <td>1.232,46</td> <td>91,65%</td> <td>(41,47)</td> </tr> <tr> <td>REDE PRIVATIVA</td> <td>997,51</td> <td>(2,24)</td> <td>(7,30)</td> <td>(8,54)</td> <td>988,97</td> <td>99,04%</td> <td>(8,29)</td> </tr> </tbody> </table>				Projeto	Valor Aportado	Consumo 2022	Consumo 2023	Consumo Projeto	Saldo do Projeto	% Saldo	Consumo Total Jun/23	Total	6.313,37	(199,18)	(885,32)	(1.084,50)	5.228,87	82,82%	(623,72)	TVRO	3.579,68	(143,73)	(733,11)	(876,84)	2.702,84	75,50%	(493,63)	FSS	391,43	(50,44)	(35,39)	(85,83)	305,60	78,07%	(80,34)	PAIS + REDE PRIVATIVA	2.342,26	(5,01)	(116,82)	(121,83)	2.220,43	94,80%	(49,76)	PAIS	1.344,75	(2,77)	(109,55)	(112,29)	1.232,46	91,65%	(41,47)	REDE PRIVATIVA	997,51	(2,24)	(7,30)	(8,54)	988,97	99,04%	(8,29)
Projeto	Valor Aportado	Consumo 2022	Consumo 2023	Consumo Projeto	Saldo do Projeto	% Saldo	Consumo Total Jun/23																																																					
Total	6.313,37	(199,18)	(885,32)	(1.084,50)	5.228,87	82,82%	(623,72)																																																					
TVRO	3.579,68	(143,73)	(733,11)	(876,84)	2.702,84	75,50%	(493,63)																																																					
FSS	391,43	(50,44)	(35,39)	(85,83)	305,60	78,07%	(80,34)																																																					
PAIS + REDE PRIVATIVA	2.342,26	(5,01)	(116,82)	(121,83)	2.220,43	94,80%	(49,76)																																																					
PAIS	1.344,75	(2,77)	(109,55)	(112,29)	1.232,46	91,65%	(41,47)																																																					
REDE PRIVATIVA	997,51	(2,24)	(7,30)	(8,54)	988,97	99,04%	(8,29)																																																					


Sobre o slide acima, ao comentar os saldos constantes da segunda tabela, o Sr. Paulo Roberto Cozza lembrou que não estão os rendimentos das aplicações financeiras e a correção do aporte inicial que é com relação à segunda parcela feita pelas operadoras.

Prosseguindo com a sua apresentação, o Sr. Paulo Roberto Cozza projetou slide que exhibe o Fluxo de Caixa do Terceiro Trimestre de 2023, também realizando a leitura das informações nele contidas quanto às entradas e saídas, bem como as principais variações:

9. Fluxo de Caixa 3TRI/2023																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entradas</th> <th>Orçado</th> <th>YTR Set</th> <th>Variação</th> <th>YTD JUN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saldo Inicial</td> <td>6.810,89</td> <td>6.810,89</td> <td>0,00</td> <td>6.810,89</td> </tr> <tr> <td>Receita Financeira</td> <td>575,26</td> <td>668,62</td> <td>93,55</td> <td>448,19</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>7.386,16</td> <td>7.479,51</td> <td>93,55</td> <td>7.259,09</td> </tr> </tbody> </table>				Entradas	Orçado	YTR Set	Variação	YTD JUN	Saldo Inicial	6.810,89	6.810,89	0,00	6.810,89	Receita Financeira	575,26	668,62	93,55	448,19	TOTAL	7.386,16	7.479,51	93,55	7.259,09																									
Entradas	Orçado	YTR Set	Variação	YTD JUN																																													
Saldo Inicial	6.810,89	6.810,89	0,00	6.810,89																																													
Receita Financeira	575,26	668,62	93,55	448,19																																													
TOTAL	7.386,16	7.479,51	93,55	7.259,09																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Saídas</th> <th>Orçado</th> <th>YTR Set</th> <th>Variação</th> <th>YTD JUN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação</td> <td>(409,06)</td> <td>(201,24)</td> <td>207,84</td> <td>(79,81)</td> </tr> <tr> <td>Compra Equipamentos</td> <td>(218,90)</td> <td>(248,32)</td> <td>(29,42)</td> <td>(106,30)</td> </tr> <tr> <td>PAIS + Rede Privativa</td> <td>(318,11)</td> <td>(107,26)</td> <td>210,84</td> <td>(56,37)</td> </tr> <tr> <td>Publicidade</td> <td>(182,08)</td> <td>(126,90)</td> <td>55,18</td> <td>(95,05)</td> </tr> <tr> <td>Tributos</td> <td>(279,73)</td> <td>(274,83)</td> <td>4,90</td> <td>(198,65)</td> </tr> <tr> <td>Outros</td> <td>(172,18)</td> <td>(109,37)</td> <td>62,82</td> <td>(83,56)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>(1.640,09)</td> <td>(1.067,92)</td> <td>572,17</td> <td>(599,75)</td> </tr> <tr> <td>SALDO</td> <td>5.746,07</td> <td>6.411,79</td> <td>665,72</td> <td>6.659,34</td> </tr> </tbody> </table>				Saídas	Orçado	YTR Set	Variação	YTD JUN	Instalação	(409,06)	(201,24)	207,84	(79,81)	Compra Equipamentos	(218,90)	(248,32)	(29,42)	(106,30)	PAIS + Rede Privativa	(318,11)	(107,26)	210,84	(56,37)	Publicidade	(182,08)	(126,90)	55,18	(95,05)	Tributos	(279,73)	(274,83)	4,90	(198,65)	Outros	(172,18)	(109,37)	62,82	(83,56)	TOTAL	(1.640,09)	(1.067,92)	572,17	(599,75)	SALDO	5.746,07	6.411,79	665,72	6.659,34
Saídas	Orçado	YTR Set	Variação	YTD JUN																																													
Instalação	(409,06)	(201,24)	207,84	(79,81)																																													
Compra Equipamentos	(218,90)	(248,32)	(29,42)	(106,30)																																													
PAIS + Rede Privativa	(318,11)	(107,26)	210,84	(56,37)																																													
Publicidade	(182,08)	(126,90)	55,18	(95,05)																																													
Tributos	(279,73)	(274,83)	4,90	(198,65)																																													
Outros	(172,18)	(109,37)	62,82	(83,56)																																													
TOTAL	(1.640,09)	(1.067,92)	572,17	(599,75)																																													
SALDO	5.746,07	6.411,79	665,72	6.659,34																																													
	<p>Principais Variações</p> <ul style="list-style-type: none"> Resultado Financeiro – melhora em função da não realização do caixa projetado e das melhores taxas de aplicação negociadas: <ul style="list-style-type: none"> Estimado 1,00%/am Realizado 1,06%/am (média) Instalação – Resultado da menor quantidade de instalações no período em relação ao realizado <ul style="list-style-type: none"> Estimado R\$ 1.500k Realizado R\$ 1.127k Compra Equipamentos – Necessidade de aumento de estoque nos PAIS. Rede Privativa – em processo de RFP. Comunicação – Maior eficiência no direcionamento das campanhas Tributos Operacionais – Compensação PIS/COFINS Tributos Financeiros – IRRF de aplicações vencidas no período 																																																


Ato contínuo, o Sr. Paulo Roberto Cozza exibiu slide contendo o resumo de todas as aplicações financeiras que a EAF tem junto aos Bancos, com informações sobre as taxas e as datas de vencimento de cada uma:

Item	Descrição																																																																																																																																																																								
	<h3>9. Aplicações Financeiras</h3> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Produto</th> <th>Rentabilidade</th> <th>Vencimento</th> <th>Saldo em 30/09/2023</th> <th>Saldo em 30/06/2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>XP - BV</td><td>CDI</td><td>105,10% CDI</td><td>21/08/2023</td><td>0,00</td><td>303,94</td></tr> <tr><td>BTG</td><td>CDI</td><td>104,75% CDI</td><td>16/10/2023</td><td>227,16</td><td>219,74</td></tr> <tr><td>BTG</td><td>CDI</td><td>104,75% CDI</td><td>16/10/2023</td><td>908,16</td><td>879,50</td></tr> <tr><td>Safra</td><td>CDI</td><td>104,10% CDI</td><td>15/03/2024</td><td>1.839,34</td><td>1.778,52</td></tr> <tr><td>Bradesco</td><td>CDI Diário</td><td>103,25% CDI</td><td>22/02/2024</td><td>0,00</td><td>99,44</td></tr> <tr><td>Bradesco</td><td>CDI 90d</td><td>104,35% CDI</td><td>22/02/2024</td><td>93,90</td><td>838,18</td></tr> <tr><td>Bradesco</td><td>CDI 180d</td><td>104,75% CDI</td><td>22/02/2024</td><td>227,49</td><td>200,06</td></tr> <tr><td>Bradesco</td><td>LF</td><td>CDI + 0,7%</td><td>22/08/2025</td><td>202,80</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>CCB</td><td>CDI</td><td>107,00% CDI</td><td>22/02/2024</td><td>23,87</td><td>23,08</td></tr> <tr><td>XP</td><td>CDI</td><td>107,50% CDI</td><td>23/02/2024</td><td>325,49</td><td>314,59</td></tr> <tr><td>XP - VW</td><td>CDI</td><td>109,25% CDI</td><td>23/02/2024</td><td>63,01</td><td>60,87</td></tr> <tr><td>Safra</td><td>LF</td><td>107,15% CDI</td><td>20/06/2024</td><td>1.190,35</td><td>1.150,61</td></tr> <tr><td>Safra</td><td>LF</td><td>107,40% CDI</td><td>19/02/2025</td><td>789,55</td><td>763,13</td></tr> <tr><td>Safra</td><td>LFDI</td><td>91,00% CDI</td><td>N/A</td><td>7,92</td><td>8,55</td></tr> <tr><td>XP - BV</td><td>LF</td><td>109,90% CDI</td><td>22/08/2025</td><td>154,72</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>XP - BV</td><td>LF</td><td>CDI + 0,9%</td><td>22/08/2025</td><td>154,66</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>XP - FMN</td><td>CDI</td><td>+ 1,15%</td><td>21/08/2025</td><td>152,17</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>XP</td><td>CDI</td><td>110,80% CDI</td><td>21/08/2025</td><td>51,17</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>SUBTOTAL</td><td></td><td></td><td></td><td>6.411,79</td><td>6.659,29</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Produto</th> <th>Rentabilidade</th> <th>Vencimento</th> <th>Saldo em 30/09/2023</th> <th>Saldo em 30/06/2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Itaú</td><td>C/C</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>0,00</td><td>0,05</td></tr> <tr><td>Safra</td><td>C/C</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>0,03</td><td>0,05</td></tr> <tr><td>BB</td><td>C/C</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Bradesco</td><td>C/C</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>0,00</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>XP</td><td>C/C</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>SUBTOTAL</td><td></td><td></td><td></td><td>0,04</td><td>0,12</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td></td><td></td><td></td><td>6.411,79</td><td>6.659,34</td></tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Observações</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redução da Selic para 12,75% em setembro/2023. • Acompanhamento do mercado em busca de opções de investimento caso a Selic continue a diminuir • Aporte Inicial – R\$ 6.313milhões </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>Rendimento acumulado Líquido até setembro/2023</p> <p>R\$ 766milhões</p>  </div>	Banco	Produto	Rentabilidade	Vencimento	Saldo em 30/09/2023	Saldo em 30/06/2023	XP - BV	CDI	105,10% CDI	21/08/2023	0,00	303,94	BTG	CDI	104,75% CDI	16/10/2023	227,16	219,74	BTG	CDI	104,75% CDI	16/10/2023	908,16	879,50	Safra	CDI	104,10% CDI	15/03/2024	1.839,34	1.778,52	Bradesco	CDI Diário	103,25% CDI	22/02/2024	0,00	99,44	Bradesco	CDI 90d	104,35% CDI	22/02/2024	93,90	838,18	Bradesco	CDI 180d	104,75% CDI	22/02/2024	227,49	200,06	Bradesco	LF	CDI + 0,7%	22/08/2025	202,80	0,00	CCB	CDI	107,00% CDI	22/02/2024	23,87	23,08	XP	CDI	107,50% CDI	23/02/2024	325,49	314,59	XP - VW	CDI	109,25% CDI	23/02/2024	63,01	60,87	Safra	LF	107,15% CDI	20/06/2024	1.190,35	1.150,61	Safra	LF	107,40% CDI	19/02/2025	789,55	763,13	Safra	LFDI	91,00% CDI	N/A	7,92	8,55	XP - BV	LF	109,90% CDI	22/08/2025	154,72	0,00	XP - BV	LF	CDI + 0,9%	22/08/2025	154,66	0,00	XP - FMN	CDI	+ 1,15%	21/08/2025	152,17	0,00	XP	CDI	110,80% CDI	21/08/2025	51,17	0,00	SUBTOTAL				6.411,79	6.659,29	Banco	Produto	Rentabilidade	Vencimento	Saldo em 30/09/2023	Saldo em 30/06/2023	Itaú	C/C	N/A	N/A	0,00	0,05	Safra	C/C	N/A	N/A	0,03	0,05	BB	C/C	N/A	N/A	0,00	0,00	Bradesco	C/C	N/A	N/A	0,00	0,01	XP	C/C	N/A	N/A	0,00	0,00	SUBTOTAL				0,04	0,12	TOTAL				6.411,79	6.659,34
Banco	Produto	Rentabilidade	Vencimento	Saldo em 30/09/2023	Saldo em 30/06/2023																																																																																																																																																																				
XP - BV	CDI	105,10% CDI	21/08/2023	0,00	303,94																																																																																																																																																																				
BTG	CDI	104,75% CDI	16/10/2023	227,16	219,74																																																																																																																																																																				
BTG	CDI	104,75% CDI	16/10/2023	908,16	879,50																																																																																																																																																																				
Safra	CDI	104,10% CDI	15/03/2024	1.839,34	1.778,52																																																																																																																																																																				
Bradesco	CDI Diário	103,25% CDI	22/02/2024	0,00	99,44																																																																																																																																																																				
Bradesco	CDI 90d	104,35% CDI	22/02/2024	93,90	838,18																																																																																																																																																																				
Bradesco	CDI 180d	104,75% CDI	22/02/2024	227,49	200,06																																																																																																																																																																				
Bradesco	LF	CDI + 0,7%	22/08/2025	202,80	0,00																																																																																																																																																																				
CCB	CDI	107,00% CDI	22/02/2024	23,87	23,08																																																																																																																																																																				
XP	CDI	107,50% CDI	23/02/2024	325,49	314,59																																																																																																																																																																				
XP - VW	CDI	109,25% CDI	23/02/2024	63,01	60,87																																																																																																																																																																				
Safra	LF	107,15% CDI	20/06/2024	1.190,35	1.150,61																																																																																																																																																																				
Safra	LF	107,40% CDI	19/02/2025	789,55	763,13																																																																																																																																																																				
Safra	LFDI	91,00% CDI	N/A	7,92	8,55																																																																																																																																																																				
XP - BV	LF	109,90% CDI	22/08/2025	154,72	0,00																																																																																																																																																																				
XP - BV	LF	CDI + 0,9%	22/08/2025	154,66	0,00																																																																																																																																																																				
XP - FMN	CDI	+ 1,15%	21/08/2025	152,17	0,00																																																																																																																																																																				
XP	CDI	110,80% CDI	21/08/2025	51,17	0,00																																																																																																																																																																				
SUBTOTAL				6.411,79	6.659,29																																																																																																																																																																				
Banco	Produto	Rentabilidade	Vencimento	Saldo em 30/09/2023	Saldo em 30/06/2023																																																																																																																																																																				
Itaú	C/C	N/A	N/A	0,00	0,05																																																																																																																																																																				
Safra	C/C	N/A	N/A	0,03	0,05																																																																																																																																																																				
BB	C/C	N/A	N/A	0,00	0,00																																																																																																																																																																				
Bradesco	C/C	N/A	N/A	0,00	0,01																																																																																																																																																																				
XP	C/C	N/A	N/A	0,00	0,00																																																																																																																																																																				
SUBTOTAL				0,04	0,12																																																																																																																																																																				
TOTAL				6.411,79	6.659,34																																																																																																																																																																				
3	<p>O Sr. Paulo Roberto Cozza encerrou sua apresentação e se colocou à disposição para eventuais dúvidas.</p> <p>O Sr. Leandro Guerra devolveu a palavra ao Presidente do GAISPI, informando que esse era o informe das atividades da EAF e se colocou à disposição de todos.</p> <p>Concluída a apresentação, o Presidente do GAISPI agradeceu a todos os integrantes da EAF e informou que ainda está tomando conhecimento, ressaltando que as palavras-chave que teria observado nas apresentações são todas positivas, tais como cronograma antecipado, projetos com bastante realizações e com saldo crescente, com muitas notícias positivas e, portanto, gostaria de parabenizar a todos pela ótima gestão na pessoa do Sr. Leandro Guerra, ciente de que se trata de um trabalho de equipe, salientando sua liderança em um projeto tão bem sucedido.</p> <p>Em seguida, o Presidente do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se possuíam algum comentário e, não havendo manifestações, passou para o item 3 da Pauta.</p>																																																																																																																																																																								

3	<p>O Presidente do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Takeshi Ikeda, Coordenador Substituto do GT-MIGRAÇÃO, para que fizesse um breve relato.</p> <p>O Sr. Takeshi Ikeda cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e deu início à apresentação sobre o relato das atividades do GT-MIGRAÇÃO, informando que boa parte das informações teriam sido registradas anteriormente na apresentação feita pelo Sr. Leandro Guerra, e projetou o seguinte <i>slide</i> que destaca a 2ª Reunião Conjunta do GT-MIGRAÇÃO/GT-DESOCUPAÇÃO realizada no dia 21 de novembro de 2023 e os assuntos nela tratados:</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <p>Sobre os assuntos debatidos na reunião em apreço, o Sr. Takeshi Ikeda fez os seguintes destaques:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Em relação aos 623 municípios com proposta de antecipação, informou que fez um breve levantamento e que, provavelmente, muitos municípios não seriam citados por ele pela sua importância, mas citou alguns municípios que foram contemplados por essa antecipação, tais como Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, ambos na Bahia, em virtude do agronegócio e trazendo possíveis ganhos com a instalação do 5G, entre outros municípios de diferentes Unidades da Federação e que possuem relevância seja por questões de ensino e/ou turísticas; e 2) No que se refere à Fase 4, registrou que, considerando o ritmo das antecipações, a expectativa dos GTs é de que ela seja concluída antes do dia 30 de junho de 2024. <p>Na sequência, o Sr. Takeshi Ikeda projetou o <i>slide</i> abaixo reproduzido que exibe um gráfico que mostra que são 3.079 municípios liberados após a deliberação desta Reunião, correspondendo a 172,6 milhões da população atingida, isto é, quase 81% da população, e afirmou que isso representa um salto relativamente grande em relação à deliberação anterior feita pelo GAISPI, destacando ainda as demais informações contidas no referido <i>slide</i>:</p>
---	--



Ato contínuo, o **Sr. Takeshi Ikeda** passou a apresentar a proposta de alteração do Regimento Interno do GAISPI e, para tanto, projetou o seguinte slide:



No que tange à proposta de unificação do **GT-MIGRAÇÃO** e do **GT-DESOCUPAÇÃO**, o **Sr. Takeshi Ikeda** fez questão de agradecer, inicialmente, ao **Sr. Alex Pires de Azevedo** e ao **Sr. Martim Jales Hon** pela coordenação desses dois grupos, afirmando que eles teriam desempenhado excelentes trabalhos desde o início.

Ainda sobre o tema, o **Sr. Takeshi Ikeda** informou que, no cenário inicial, a segregação dos grupos era necessária diante do volume de trabalho e de atividades e que, conforme mencionado pela EAF, a atividade de desocupação foi concluída em julho e a atividade de mitigação encontra-se praticamente em sua fase final, faltando um pouco mais de 900 estações a serem mitigadas, a denominada mitigação preventiva, ficando somente a mitigação reativa para os casos em que ocorram reclamações dos usuários FSS e eventualmente com a instalação das estações 5G nesta faixa, o que sustentaria a proposta de unificação, nos termos das modificações exibidas no slide em tela.

Feito o relato do **GT-MIGRAÇÃO** e do **GT-DESOCUPAÇÃO**, o **Sr. Takeshi Ikeda** agradeceu mais uma vez aos então Coordenadores, **Sr. Alex Pires de Azevedo** e **Sr. Martim Jales Hon**, por todo trabalho feito até o momento, e se colocou à disposição.

Concluída a apresentação, o **Presidente do GAISPI** também agradeceu e parabenizou o **Sr. Alex Pires de Azevedo** e o **Sr. Martim Jales Hon** pelo trabalho realizado, afirmando que é uma satisfação observar todo o trabalho feito por eles desde a instalação do GAISPI até o momento, com as atividades adiantadas e funcionando de maneira regular, e que gostaria de deixar isso registrado em Ata. O **Presidente do GAISPI** solicitou ainda ao **Secretário Executivo do GAISPI, Sr. Vinicius Oliveira Caram Guimarães**, que pedisse à Superintendência de Administração e Finanças (SAF) o registro, nos assentamentos funcionais dos dois servidores, dessa menção elogiosa por todo o trabalho realizado desde a implantação do GAISPI nesses dois GTs.

Concedida a palavra, o **Sr. Leandro Guerra** reforçou as palavras do **Presidente do GAISPI** e passou a agradecer ao **Sr. Alex Pires de Azevedo** e ao **Sr. Martim Jales Hon** pela grande liderança que eles exerceram no projeto, reafirmando que esse sucesso faz parte de um trabalho intenso dessas coordenações e que os desafios foram enormes, e finalizou registrando que, do lado da EAF, gostaria de reforçar esse elogio e esse reconhecimento por essas coordenações feitas pelos dois servidores, bem como desejando sorte ao **Sr. Takeshi Ikeda** nesse novo ciclo.

O **Presidente do GAISPI** aproveitou o ensejo para também desejar sorte ao **Sr. Takeshi Ikeda**, desejando ainda que ele consiga seguir à altura as pegadas e a trilha deixada pelo **Sr. Alex Pires de Azevedo** e pelo **Sr. Martim Jales Hon**.

Concedida a palavra, o **Sr. Martim Jales Hon** agradeceu a todos do Grupo pela cooperação e pelo trabalho e desejou boa sorte para as próximas etapas, afirmando sua certeza de que este Grupo ainda terá muito sucesso.

Concedida a palavra, o **Sr. Alex Pires de Azevedo** reforçou a manifestação feita pelo **Sr. Martim Jales Hon** também agradecendo a todos, e afirmou que foi uma honra participar deste Grupo com todos os membros que estão desde o início e que tem a certeza de que os demais colegas continuarão conduzindo as atividades muito bem. Ao final, colocou-se à disposição de todos para o que precisarem.

O **Sr. Vinicius Oliveira Caram Guimarães** também agradeceu aos dois servidores, **Sr. Alex Pires de Azevedo** e ao **Sr. Martim Jales Hon**, e registrou que esse modelo de ondas que possibilitou as antecipações que variam a depender do porte do município e do estado, e com ganhos, em média, de quase um ano e meio a dois anos no projeto, foi um trabalho feito pelos dois servidores junto com a EAF e que trouxe essa eficiência ao processo.

Concedida a palavra, o **Sr. Lauro Leandro Rutkowski** parabenizou o **Sr. Alex Pires de Azevedo** e o **Sr. Martim Jales Hon**, lembrando que foram seus companheiros nos primórdios do GIRED e que foram essenciais para viabilizar também os objetivos daquele projeto, afirmando que são realmente dois servidores exemplares e que ele tem uma enorme admiração. Por fim, registrou o seu apoio ao **Sr. Takeshi Ikeda**, colocando-se à disposição para tudo o que for necessário.

Item	Descrição
	<p>Por fim, concedida a palavra, o Sr. Luiz Carlos Abrahão registrou, em nome do setor e, em particular da ABERT, o seu agradecimento pelo trabalho do Sr. Alex Pires de Azevedo e do Sr. Martim Jales Hon, salientando que foi essencial e fundamental principalmente no início do Grupo, dando estrutura para que pudessem seguir da forma mais confortável para atingir os objetivos.</p> <p>O Presidente do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se possuíam algum comentário adicional e, não havendo mais manifestações, passou para o item 4 da Pauta.</p>
4	<p>O Presidente do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se concordavam com a proposta de inclusão de cidades no planejamento das ações de migração até junho de 2024, conforme apresentado pelo Coordenador Substituto do GT-MIGRAÇÃO, Sr. Takeshi Ikeda, exibindo-se, nesse contexto, o <i>slide</i> abaixo reproduzido:</p> <div data-bbox="327 383 925 763" style="text-align: center;"> </div> <p>Não havendo manifestações, o Presidente do GAISPI declarou que fica aprovada a proposta de inclusão de cidades no planejamento das ações de migração até junho de 2024. Solicitou ainda que a Secretaria Executiva do GAISPI anexasse a lista das cidades na Ata da presente Reunião.</p> <p>Ato contínuo, o Presidente do GAISPI passou para o item 5 da Pauta.</p>
5	<p>O Presidente do GAISPI registrou que, conforme apresentado pelo Sr. Takeshi Ikeda, Coordenador Substituto do GT-DESOCUPAÇÃO, os requisitos que permitem deliberar a antecipação da liberação da faixa de 3,5 GHz em mais 623 cidades foram atingidos. Prosseguiu afirmando que, de acordo com o item 6.3.1 do Anexo IV do Edital e a alínea “q” do item 9 do Anexo IV-A do Edital, caberia ao GAISPI decidir se o início do uso da faixa de 3,5 GHz poderá ser antecipado, individualmente por município ou em polígonos.</p> <p>O Presidente do GAISPI, dessa forma, considerando o exposto, colocou em deliberação a proposta de antecipação da liberação do uso da faixa de radiofrequências de 3.300 MHz a 3.700 MHz a partir do dia 04 de dezembro de 2023 nas 623 cidades apresentadas, questionando se todos os membros presentes estariam de acordo com a proposta.</p> <p>Não havendo manifestações, o Presidente do GAISPI declarou que fica aprovada a antecipação da liberação do uso da faixa de radiofrequências de 3.300 MHz a 3.700 MHz a partir do dia 04 de dezembro de 2023 nas 623 cidades já apresentadas. Também determinou que a Secretaria Executiva do GAISPI anexasse a lista dessas cidades à Ata da presente Reunião.</p> <p>Na sequência, o Presidente do GAISPI informou que, até o momento, já contam com 3.079 municípios liberados para utilização da faixa de 3,5 GHz por estações do 5G <i>standalone</i>, e que, com isso, a população destas cidades totaliza aproximadamente 172 milhões de brasileiros, representando 81% da população, que, agora, possui potencial de atendimento pelas prestadoras, nos prazos que seus modelos estratégicos e de investimentos considerarem oportunos.</p> <p>Consignou ainda que a antecipação da liberação do uso da faixa de radiofrequências de 3.300 MHz a 3.700 MHz nos 623 municípios que acabou de ser deliberada representa 100% dos municípios dos Estados de Alagoas e de São Paulo.</p> <p>Finalmente, o Presidente do GAISPI ressaltou que é importante lembrar que essas antecipações em nada alteram o cronograma de atendimento das obrigações de instalação de ERBs, que continua como previsto no Edital, tanto para cidades maiores quanto para as cidades de menor população.</p> <p>Concluída a deliberação, o Presidente do GAISPI passou para o item 6 da Pauta.</p>
6	<p>O Presidente do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se concordam com a proposta de alteração do Regimento Interno do GAISPI, conforme apresentado pelo Coordenador Substituto do GT-MIGRAÇÃO, Sr. Takeshi Ikeda.</p> <p>Não havendo manifestações, o Presidente do GAISPI declarou que fica aprovada a proposta de alteração do Regimento Interno do GAISPI. Solicitou ainda à Secretaria Executiva do GAISPI que providenciasse a elaboração da Portaria de aprovação para assinatura.</p> <p>O Presidente do GAISPI aproveitou para agradecer o empenho e a dedicação dos servidores Sr. Martim Jales Hon e Sr. Alex Pires de Azevedo na condução dos trabalhos nos Grupos Técnicos de Migração e Desocupação perante o GAISPI e deu as boas-vindas ao servidor Sr. Takeshi Ikeda na coordenação do Grupo Técnico de Migração e Mitigação.</p> <p>Concluída a deliberação, o Presidente do GAISPI passou para o item 7 da Pauta.</p>
7	<p>O Presidente do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Sidney Azeredo Nince, Coordenador do GT-PAIS, para que fizesse um breve relato das atividades no âmbito do GT.</p> <p>O Sr. Sidney Azeredo Nince cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e deu início à apresentação sobre o relato das atividades do GT-PAIS, registrando que pretende ressaltar a evolução que aconteceu no projeto em relação à última Reunião.</p> <p>Seguiu informando que, conforme estabelecido na programação, a Infovia_03 (Macapá/Belém) é a primeira infovia com o cronograma definido para início de lançamento e destacou as seguintes evoluções:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Emissão da licença da Marinha, que permite a navegação e o lançamento; 2) Emissão da licença provisória pelo IBAMA; 3) A licença de lançamento encontra-se aguardando apenas a publicação do “de acordo” do IPHAN no Diário Oficial da União, para que, assim, o IBAMA emita, posteriormente, a licença de licenciamento; 4) Foram concluídas as atividades de construção da base e instalação dos <i>containers</i>, afirmando que eles já foram instalados com o equipamento óptico montado dentro deles.

Item	Descrição
	<p>Em relação à <u>Infovia 04</u>, o Sr. Sidney Azeredo Nince informou também que já houve a instalação de alguns <i>containers</i> e suas respectivas bases.</p> <p>O Sr. Sidney Azeredo Nince informou ainda que foram definidos todos os pontos de atendimentos das Infovias 02, 03 e 04, isto é, as escolas, as prefeituras, os Tribunais de Justiça, os hospitais e os pontos das Forças Armadas em localidades urbanas.</p> <p>Reforçou que, em relação às escolas, após uma reunião realizada com a Presidência do GAISPI, o grupo achou por bem aproveitar o máximo possível de pontos de atendimento, sendo que, naqueles municípios onde não houver 10 escolas, será utilizado esse saldo em municípios que possuem mais do que as 10 escolas, porém mantendo o total de 10 escolas por cada município previsto no Edital. afirmou que, na Infovia 02, existem 4 municípios que possuem mais de 10 escolas, porque naturalmente existem 4 municípios com menos de 10. Registrou que serão, no total, 294 pontos sendo atendidos com 220 escolas atendidas por essas três infovias.</p> <p>Ainda sobre esse tema, o Sr. Sidney Azeredo Nince informou que, com essa definição dos pontos de atendimento, torna-se possível planejar a rota do cabo óptico terrestre em cada uma dessas localidades e municípios e, conseqüentemente, também já adiantando e iniciando o processo de pedido de autorização do lançamento desses cabos ópticos nos postes junto às concessionárias de energia.</p> <p>O Sr. Sidney Azeredo Nince destacou que continuam ainda com algumas restrições de lançamento devido ao nível dos rios, ressaltando que, em relação à Infovia 03, a primeira infovia prevista, que estariam apenas aguardando a licença de lançamento do IBAMA, para que o início do lançamento possa ocorrer.</p> <p>Concluída a apresentação, o Presidente do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se possuíam alguma dúvida ou esclarecimento.</p> <p>Não havendo manifestações, o Presidente do GAISPI passou para o item 8 da Pauta.</p>
8	<p>O Presidente do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se concordam com a lista dos pontos de atendimento apresentada pelo Coordenador do GT-PAIS, Sr. Sidney Azeredo Nince.</p> <p>Não havendo manifestações, o Presidente do GAISPI declarou que fica aprovada a lista dos pontos de atendimento, nos termos apresentados nesta Reunião Ordinária. Solicitou que a Secretaria Executiva do GAISPI anexasse a lista dos pontos de atendimento apresentados na presente Reunião.</p> <p>Ata contínuo, o Presidente do GAISPI passou para o item 9 da Pauta.</p>
9	<p>O Presidente do GAISPI concedeu a palavra ao Secretário Executivo do GAISPI, Sr. Vinicius Oliveira Caram Guimarães, em substituição ao Sr. Marcos Vieira Baeta Neves, Coordenador do GT-REDE, para que fizesse um breve relato sobre as atividades no âmbito do grupo.</p> <p>O Sr. Vinicius Oliveira Caram Guimarães cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e deu início à apresentação sobre o relato das atividades do GT-REDE, informando que não houve a necessidade de realizar reunião do grupo desde a última Reunião Ordinária do GAISPI, ressaltando que, entretanto, alguns pontos merecem ser destacados e relatados nesta Reunião para que todos tenham conhecimento dos andamentos.</p> <p>Nesse contexto, o Sr. Vinicius Oliveira Caram Guimarães, levando em consideração o que o Sr. Leandro Guerra, em sua apresentação, já teria atualizado o Grupo com as informações sobre os trabalhos, cronograma e RFPs, informou que gostaria de destacar dois pontos, a saber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Em relação ao Recurso que foi apresentado pelas operadoras TIM, Claro e Telefônica, quanto à aprovação das Diretrizes da Rede Móvel, informou que houve a manifestação da Procuradoria no dia 06 de novembro a respeito dos questionamentos apresentados pelo GAISPI e que o processo já foi instruído e encaminhado ao Diretor para análise do mérito; 2) Em relação ao pedido apresentado pela Telebrás para uso das RFs para a Rede Privativa, informou que esse pedido foi encaminhado à Procuradoria no dia 14 de novembro e encontra-se em análise e que, tão logo ocorra a manifestação da Procuradoria, o processo será instruído para ser submetido a um Relator. <p>Concluída a apresentação, o Presidente do GAISPI lembrou, quanto ao primeiro ponto destacado acima, que ele teria julgado o Pedido de Efeito Suspensivo, denegando-o.</p> <p>Ata contínuo, o Presidente do GAISPI passou para o item 10 da Pauta.</p>
10	<p>O Presidente do GAISPI solicitou que o Coordenador do GT-F, Sr. Oseias Fonseca de Aguiar, fizesse um breve relato sobre as atividades no âmbito do GT.</p> <p>O Sr. Oseias Fonseca de Aguiar cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e deu início à apresentação sobre o relato das atividades do GT-F, informando que houve uma única reunião ordinária do grupo nesse período e realizada no dia 14 de novembro, oportunidade em que foram relatados e apresentados os seguintes assuntos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Os resultados financeiros da EAF do Terceiro Trimestre de 2023; 2) Os números dos orçamentos das infovias do Projeto GT-PAIS; 3) O <i>status</i> das RFPs; e 4) Fases de recomendações da auditoria realizada para o exercício de 2023. <p>Com relação aos assuntos debatidos, o Sr. Oseias Fonseca de Aguiar informou que gostaria de destacar um ponto que já teria sido apresentado pelo Sr. Paulo Roberto Cozza sobre os resultados do Terceiro Trimestre, e que diz respeito aos números do rendimento financeiro líquido, isto é, 766 milhões a uma taxa inferior ao planejado. Nas suas palavras, o recurso está sendo bem gerido e afirmou que, com isso, o que foi executado foi esse valor de rendimento e que ainda não entraram no principal, o que deve acontecer nesse Quarto Trimestre.</p> <p>Concluída a apresentação, o Presidente do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se possuíam algum comentário em relação ao que foi apresentado.</p> <p>Não havendo manifestações, o Presidente do GAISPI passou para o item 11 da Pauta.</p>
11	<p>O Presidente do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Henrique Gomes Pinheiro, Coordenador do GT-COM, para que fizesse sua apresentação.</p> <p>O Sr. Henrique Gomes Pinheiro cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e deu início à apresentação sobre o relato das atividades do GT-COM, informando que o grupo se reuniu no último dia 16 de novembro e permaneceu, como sempre, acompanhando as ações de comunicações da EAF e ações de atendimento de gerência do <i>Call Center</i>.</p> <p>Como destaque, o Sr. Henrique Gomes Pinheiro trouxe a proposta da EAF que foi solicitada no sentido de reforço das campanhas televisivas na TV Satelital e que devem acontecer para as próximas etapas, dado que, em cidades menores, o acervo de mídia local é inferior, o que tornaria necessária uma robustez nessa campanha televisiva até que se consiga chegar aos objetivos de entrega e de instalação.</p> <p>O Sr. Henrique Gomes Pinheiro informou que uma nova campanha também está sendo preparada e que ela deve vir a ser apresentada para todo o Grupo nas próximas reuniões.</p>

Item	Descrição
	<p>Ainda como destaque, o Sr. Henrique Gomes Pinheiro reforçou a criação do <i>site</i> sobre as infovias, conforme já apresentado pela Sra. Patrícia de Oliveira Abreu e pelo Sr. Leandro Guerra.</p> <p>Por fim, o Sr. Henrique Gomes Pinheiro registrou também que o grupo discutiu o plano específico para a Região Sul, visto que, proporcionalmente em relação ao que é esperado e previsto pela pesquisa realizada, seria a região que se encontra mais atrás quanto aos números de instalação. Afirmou que essa região já mostrou um incremento com as ações específicas que a EAF vem realizando desde o mês de outubro até hoje, e que mais ações ainda estariam previstas para que a Região Sul acompanhe as demais regiões, em termos de número de instalações e na proporcionalidade do que se espera naquela região.</p> <p>Concluída a apresentação, o Presidente do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se possuíam algum comentário em relação ao que foi apresentado</p> <p>Não havendo manifestações e considerando que neste item não há deliberação, o Presidente do GAISPI passou para o item 12 da Pauta.</p>
12	<p>O Presidente do GAISPI questionou aos membros do GAISPI presentes se possuíam algum assunto que quisessem tratar na presente Reunião.</p> <p>Não havendo manifestações, o Presidente do GAISPI passou para o item 13 da Pauta.</p>
13	<p>O Presidente do GAISPI, considerando que a proposta é de que não se realize Reunião do GAISPI no mês de dezembro, uma vez que já foram realizadas várias antecipações, propôs que a próxima Reunião Ordinária do GAISPI seja realizada no dia 24 de janeiro de 2024 (quarta-feira) às 10:00h, de forma remota. Questionou aos membros do GAISPI se estariam todos de acordo com essa data.</p> <p>Não havendo manifestações, o Presidente do GAISPI declarou que fica definida a data da 25ª Reunião Ordinária do GAISPI para o dia 24 de janeiro de 2024 (quarta-feira) às 10:00h, de forma remota.</p> <p>Concluídos os assuntos constantes da Pauta, o Presidente do GAISPI desejou boas festas aos membros e parabenizou a todos pelo trabalho realizado ao longo do ano de 2023, afirmando que o GAISPI é um orgulho para a Anatel, para o setor de telecomunicações e para todos, e que o Grupo pode contar com o apoio da Anatel e de toda a equipe técnica para continuar realizando esse belo trabalho.</p> <p>Por fim, o Presidente do GAISPI declarou encerrada a 24ª Reunião Ordinária do Grupo.</p>

Segue a presente Ata de Reunião assinada eletronicamente pelos participantes acima identificados e aprovada na 25ª Reunião Ordinária do GAISPI, realizada em 24 de janeiro de 2024.
