



REGISTRO DE REUNIÃO

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DAS SOLUÇÕES PARA OS PROBLEMAS DE INTERFERÊNCIA NA FAIXA DE 3.625 A 3.700 MHZ - GAISPI

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GAISPI

Data	Horário de Início	Horário de Término	Local
30 de outubro de 2024	09:57	11:46	Plataforma Teams

1. PARTICIPANTES

1.1. Membros do GAISPI:

FUNÇÃO	MEMBRO	NOME	Presente na reunião?
Presidente do GAISPI	-	Carlos Manuel Baigorri	NÃO
Secretário Executivo do GAISPI	-	Vinícius Oliveira Caram Guimarães	SIM
Representante do Ministério das Comunicações	Titular	Wilson Diniz Wellisch	SIM
	Suplente	Maximiliano Salvadori Martinhão	NÃO
Representantes da Proponentes Vencedoras dos Lotes do Tipo B	Titular	Antônio Oscar de Carvalho Petersen	NÃO
	Suplente	Monique Pereira Ibitinga de Barros	NÃO
	Titular	Camilla Tedeschi de Toledo Tapias	NÃO
	Suplente	Anderson Emanuel de Azevedo Gonçalves	SIM
	Titular	Mario Girasole	NÃO
	Suplente	Marcelo Concolato Mejias	SIM
	Titular	Flavio Ferreira de Lara Resende	NÃO
Representantes dos Radiodifusores	Suplente	Cristiano Reis Lobato Flores	NÃO
	Titular	Samir Amando Granja Nobre Maia	NÃO
	Suplente	Wender Almeida de Souza	SIM
	Titular	Luiz Carlos Abrahão	SIM
	Suplente	Carlos Eduardo Neiva Melo	SIM
Representantes das Exploradoras de Satélites	Titular	Lincoln Amazonas Antunes de Oliveira	NÃO
	Suplente	Michelle Machado Caldeira	NÃO
	Titular	Fabio Franco Costa de Alencar	SIM
	Suplente	Luis Fernando Barros Costa Fernandes	NÃO
	Titular	Márcio André de Assis Brasil	SIM
	Suplente	Rodrigo Soares Campos	SIM
Representantes das Proponentes Vencedoras dos Lotes C1 a C8 e D1 a D32	Titular	José Roberto Nogueira	SIM
	Suplente	Katia Costa da Silva Pedroso	SIM
	Titular	Margaret de Almeida Cadête Moonsammy	SIM
	Suplente	Wagner Zanini Barreira	NÃO
	Titular	Vítor Elísio Góes de Oliveira Menezes	NÃO
	Suplente	Mariana Rezende	NÃO

1.2. Outros Participantes:

Nome	Órgão/Instituição/Empresa
Chirlene Silva	Anatel (terceirizada)
Henrique Gomes Pinheiro	Anatel/APC - Coordenador do GT-COM
Lauro Leandro Rutkowski	Anatel
Leandro Enrique Lobo Guerra	EAF
Patrícia de Oliveira Abreu	EAF
Paula Fontelles do Valle	Anatel
Takeshi Ikeda	Anatel
Karine Karine Medeiros Dias	Anatel
Marcos Vieira Baeta Neves	Anatel/SOR -Coordenador do GT-REDE
Ricardo Lamongi Dieckmann	EAF
Paulo Roberto Cruz Cozza	EAF
Sebastiao Sergio de Oliveira Junior	TIM
Dulcidio Elias Oliveira Pedrosa	EAF
Erica Rocha de Paula Lima	Algartelecom
Rogério Adriano Fernandes	Anatel
Daniela Naufel Achettino	MCOM

2. PAUTA

Item	Descrição
1	ITEM 1 DA PAUTA: APROVAÇÃO DA ATA DA 32ª REUNIAO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024.
2	ITEM 2 DA PAUTA: INFORME DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE ADMINISTRADORA DA FAIXA DE 3,5 GHz (EAF).
3	ITEM 3 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE MIGRAÇÃO E MITIGAÇÃO – GT-MIGRAÇÃO.
4	ITEM 4 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO SOBRE A ANTECIPAÇÃO DE CIDADES PARA A LIBERAÇÃO DO USO DA FAIXA DE RADIOFREQUÊNCIA.
5	ITEM 5 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO SOBRE A PRORROGAÇÃO POR MAIS 90 DIAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DA BANDA KU.
6	ITEM 6 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO – GT-F.


Item	Descrição
7	ITEM 7 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DO PROGRAMA AMAZÔNIA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL – GT-PAIS.
8	ITEM 8 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE REDE PRIVATIVA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL –
9	ITEM 9 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO – GT-COM. RETIRADO DE PAUTA
10	ITEM 10 DA PAUTA: OUTROS ASSUNTOS.
11	ITEM 11 DA PAUTA: DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE NOVEMBRO DE 2024.

3. RELATO DA REUNIÃO

Item	Descrição																																																										
Saudação	Inicialmente, o Secretário Executivo do GAISPI, Sr. Vinícius Oliveira Caram Guimarães, deu boas-vindas e agradeceu a presença de todos e informou devido à excepcional ausência do Presidente do GAISPI, Sr. Carlos Manuel Baigorri, e conforme a previsão do art. 15, inciso I, do Regimento Interno sua substituição nesta Reunião. O Secretário Executivo do GAISPI registrou, antes de dar início aos trabalhos da 33ª Reunião Ordinária, e com fundamento no art. 9º do Regimento Interno a inclusão de item de Pauta referente ao Informe, após reunião ocorrida do Grupo Técnico de Acompanhamento Financeiro (GT-F), bem como a sugestão do Henrique Gomes Pinheiro, Coordenador do GT-COM, devido à ausência de reunião no mês de outubro, referente à retirada do item de Pauta que tratava do Informe. O Secretário Executivo do GAISPI questionou se todos estariam de acordo com a proposta e, não havendo manifestações, passou para o item 1 da Pauta.																																																										
1	O Secretário Executivo do GAISPI informou que não foram recebidas solicitações ou manifestações sobre a minuta previamente circulada. Desta forma, questionou aos membros do GAISPI se existiria algum ajuste ou algo a ser comentado em relação à Ata. Não havendo manifestações, o Secretário Executivo do GAISPI declarou que fica aprovada a Ata da 32ª Reunião Ordinária do GAISPI. Concluída a deliberação, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 2 da Pauta.																																																										
2	O Secretário Executivo do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Leandro Guerra, para que fizesse o relato das atividades. O Sr. Leandro Guerra cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes e passou a projetar uma apresentação, cuja agenda do Informe das atividades da EAF abordou os seguintes itens: - I – Migração TVRO; - II – Planejamento Fase 6; - III – Municípios com limpeza da faixa 3,5 GHz concluída; - IV – Planejamento TVRO – Plano de Aceleração de Instalação; - V – Projeto PAIS; - VI – Projeto Rede Privativa de Governo; - VII – Compras e Financeiro. Sobre o primeiro item de sua agenda, <u>Migração TVRO</u>, o Sr. Leandro Guerra projetou o <i>slide</i> abaixo reproduzido que apresenta um gráfico que mostra a evolução das instalações de TVRO na Banda Ku para a população do Cadastro Único: 1. Migração TVRO – Acumulado Instalações Realizadas (29/10/24) <table border="1"><caption>Acumulado Instalações Realizadas (29/10/24)</caption><thead><tr><th>Data</th><th>Instalações</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>119</td></tr><tr><td>jun/22</td><td>1.448</td></tr><tr><td>jul/22</td><td>4.725</td></tr><tr><td>ago/22</td><td>9.577</td></tr><tr><td>set/22</td><td>14.154</td></tr><tr><td>out/22</td><td>35.250</td></tr><tr><td>nov/22</td><td>59.831</td></tr><tr><td>dez/22</td><td>95.438</td></tr><tr><td>jan/23</td><td>134.208</td></tr><tr><td>fev/23</td><td>230.039</td></tr><tr><td>mar/23</td><td>376.880</td></tr><tr><td>abr/23</td><td>524.737</td></tr><tr><td>mai/23</td><td>711.665</td></tr><tr><td>jun/23</td><td>932.720</td></tr><tr><td>jul/23</td><td>1.155.473</td></tr><tr><td>ago/23</td><td>1.325.715</td></tr><tr><td>set/23</td><td>1.458.334</td></tr><tr><td>out/23</td><td>1.633.152</td></tr><tr><td>nov/23</td><td>1.881.671</td></tr><tr><td>dez/23</td><td>2.112.249</td></tr><tr><td>jan/24</td><td>2.378.295</td></tr><tr><td>fev/24</td><td>2.650.314</td></tr><tr><td>mar/24</td><td>2.920.208</td></tr><tr><td>abr/24</td><td>3.185.997</td></tr><tr><td>mai/24</td><td>3.414.429</td></tr><tr><td>jun/24</td><td>3.599.248</td></tr><tr><td>jul/24</td><td>3.862.537</td></tr><tr><td>ago/24</td><td>4.127.534</td></tr></tbody></table> No tocante ao <i>slide</i> acima, o Sr. Leandro Guerra destacou que a EAF atingiu, em 29 de outubro de 2024, a marca de 4.127.534 milhões de instalações, afim de que a expectativa da entidade é chegar até o dia 31 de outubro de 2024 acima de 4.150.000 milhões, o que mostra que o ritmo continua acelerado. Afirma também que teria recebido a informação de que devem atingir algo em torno de 270.000 ou número até superior e que isso representa o mês com maior quantidade de instalações em toda a história do projeto. Destacou, mais uma vez, a concentração na Região Nordeste com 69% das instalações. O Sr. Leandro Guerra passou para o segundo item de sua agenda, <u>Planejamento Fase 6</u>, e projetou o <i>slide</i> a seguir transcrito que apresenta o Cronograma de execução da referida fase, que mostra a evolução do projeto:	Data	Instalações	1	119	jun/22	1.448	jul/22	4.725	ago/22	9.577	set/22	14.154	out/22	35.250	nov/22	59.831	dez/22	95.438	jan/23	134.208	fev/23	230.039	mar/23	376.880	abr/23	524.737	mai/23	711.665	jun/23	932.720	jul/23	1.155.473	ago/23	1.325.715	set/23	1.458.334	out/23	1.633.152	nov/23	1.881.671	dez/23	2.112.249	jan/24	2.378.295	fev/24	2.650.314	mar/24	2.920.208	abr/24	3.185.997	mai/24	3.414.429	jun/24	3.599.248	jul/24	3.862.537	ago/24	4.127.534
Data	Instalações																																																										
1	119																																																										
jun/22	1.448																																																										
jul/22	4.725																																																										
ago/22	9.577																																																										
set/22	14.154																																																										
out/22	35.250																																																										
nov/22	59.831																																																										
dez/22	95.438																																																										
jan/23	134.208																																																										
fev/23	230.039																																																										
mar/23	376.880																																																										
abr/23	524.737																																																										
mai/23	711.665																																																										
jun/23	932.720																																																										
jul/23	1.155.473																																																										
ago/23	1.325.715																																																										
set/23	1.458.334																																																										
out/23	1.633.152																																																										
nov/23	1.881.671																																																										
dez/23	2.112.249																																																										
jan/24	2.378.295																																																										
fev/24	2.650.314																																																										
mar/24	2.920.208																																																										
abr/24	3.185.997																																																										
mai/24	3.414.429																																																										
jun/24	3.599.248																																																										
jul/24	3.862.537																																																										
ago/24	4.127.534																																																										

Item	Descrição
------	-----------

2. Planejamento–Cronograma Macro (624+1.268 Municípios)

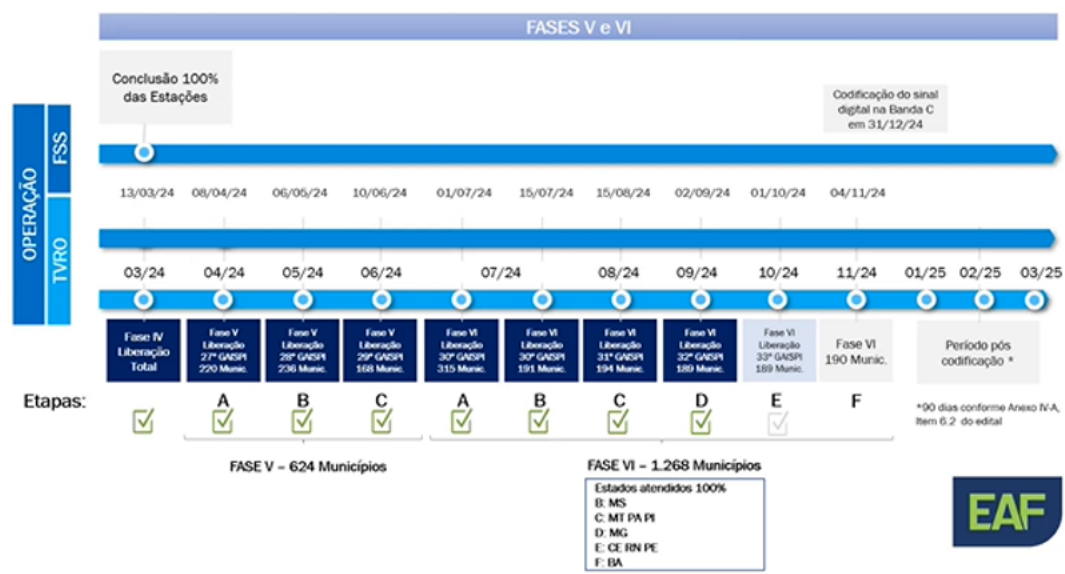


Sobre o Cronograma Macro, o **Sr. Leandro Guerra** fez os seguintes destaques:

1) No mês de outubro, a entidade estaria executando a Fase 6-E, que corresponde a municípios dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco, a entidade teria iniciado a comunicação no início de outubro; e

2) E no mês de novembro, teriam a última etapa do projeto, a denominada Fase 6-F com 190 municípios, sendo todos eles no Estado da Bahia, afirmand instalações ainda continuam durante um tempo até cumprir o prazo que estaria estabelecido no Edital.

A respeito do planejamento da Fase 6, o **Sr. Leandro Guerra** projetou o seguinte *slide* que mostra os 1.268 municípios distribuídos por Unidade da Fed conforme o seu perfil populacional:

2. Planejamento Fase VI (1.268 Municípios)

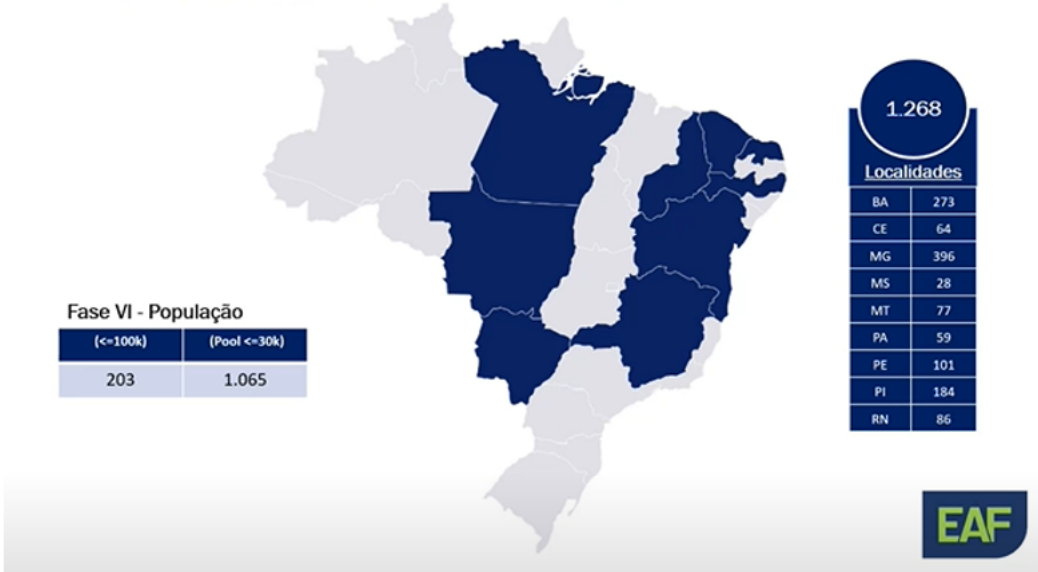

Na sequência, o **Sr. Leandro Guerra** apresentou o planejamento da Fase 6-F composta por 190 municípios, todos eles no estado da Bahia, em que a EAF a atuar efetivamente a partir do mês de novembro, bem como a sua divisão por Unidades da Federação e de acordo com o seu perfil populacional:

Item	Descrição				
	2. Planejamento Fase VI - F (190 Municípios)  190 Localidades BA190 Fase VI - F <table> <tr> <th>(<=100k)</th><th>(Pool <=30k)</th></tr> <tr> <td>28</td><td>162</td></tr> </table> 	(<=100k)	(Pool <=30k)	28	162
(<=100k)	(Pool <=30k)				
28	162				

O **Sr. Leandro Guerra** também apresentou a relação dos 190 municípios que serão atendidos na Fase 6-F, conforme os *slides* abaixo:

2. Planejamento Fase VI - F

Novembro/24 (190 Municípios)

[illegible]

2. Planejamento Fase VI - F

Novembro/24 (190 Municípios)

UF	Sanitários	UF	Sanitários
BA	Mujumbê do São Francisco	BA	Santa Teresinha
BA	Murupipi	BA	São Desidério
BA	Nova Canaã	BA	São Domingos
BA	Nova Látina	BA	São Félix do Coribe
BA	Nova Sol	BA	São Gabriel
BA	Nova Barana	BA	São José do Jacuípe
BA	Nova Redenção	BA	São Miguel das Matas
BA	Nova Horizonte	BA	Saúde
BA	Olinda dos Brachinhos	BA	Serra do Ramalho
BA	Ouroândia	BA	Sento Sé
BA	Paramirim	BA	Serra Dourada
BA	Paratinga	BA	Serrolândia
BA	Pé de Serra	BA	Sítio do Mato
BA	Piçá	BA	Soufo Soares
BA	Piço Arraado	BA	Talocum do Brejo Velho
BA	Pindobajú	BA	Tanque
BA	Portadas	BA	Tanque Novo
BA	Praça do Norte	BA	Tapiramutá
BA	Protibua	BA	Teofilândia
BA	Planaltino	BA	Teofilândia
BA	Pugny	BA	Ubirajara
BA	Puriti Novo	BA	Ubirajara
BA	Presidente Dutra	BA	Ubatã
BA	Presidente João Quadros	BA	Umburanas
BA	Presidente Tancredo Neves	BA	Utinga
BA	Quimadas	BA	Valente
BA	Quinhadas	BA	Várzea da Roca
BA	Ramamos	BA	Várzea da Roca
BA	Retrolândia	BA	Várzea Nova
BA	Rio das Neves	BA	Wagner
BA	Rio do Jacaré	BA	Wanderley
BA	Rio de Santana	BA	Wenceslau Guimarães
BA	Rio de Contas	BA	Xique-Xique
BA	Rio do Antônio		
BA	Rio do Pires		
BA	Rio Barbosa		
BA	Santa Inês		
BA	Santa Maria da Vitória		
BA	Santana		

Item	Descrição																																																																																																																																																																																																																														
	Ato contínuo, o Sr. Leandro Guerra passou a reportar as informações quanto ao terceiro item de sua agenda que diz respeito aos <u>municípios com limpeza de 3.5 GHz concluída</u> no mês de outubro, e, para tanto, projetou o <i>slide</i> abaixo reproduzido que mostra o mapa dos 189 municípios em que a limpeza foi re ressaltando a sua distribuição por Unidades da Federação, bem como o perfil populacional desses municípios por fases do projeto, e o fato de alcan plenitude dos estados do Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte: 3. Municípios com limpeza de faixa concluída 189 municípios aptos para liberação pelo GAISPI do uso da faixa 3.5 GHz.  Fase VI - E <table> <tr> <th>(<=100k)</th> <th>(Pool <=30k)</th> </tr> <tr> <td>70</td> <td>119</td> </tr> </table> 189 Localidades <table> <tr> <td>BA</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>CE</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>PE</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>RN</td> <td>32</td> </tr> </table> 	(<=100k)	(Pool <=30k)	70	119	BA	40	CE	25	PE	92	RN	32																																																																																																																																																																																																																		
(<=100k)	(Pool <=30k)																																																																																																																																																																																																																														
70	119																																																																																																																																																																																																																														
BA	40																																																																																																																																																																																																																														
CE	25																																																																																																																																																																																																																														
PE	92																																																																																																																																																																																																																														
RN	32																																																																																																																																																																																																																														
	Nesse cenário, o Sr. Leandro Guerra apresentou a relação dos 189 municípios em apreço, conforme <i>slides</i> a seguir transcritos: 3. Municípios com limpeza da faixa de 3.5 GHz concluída Setembro/24 – Fase VI E (189 Municípios) <table> <tr> <th>UF</th><th>Município</th></tr> <tr><td>BA</td><td>Abaré</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Acajutiba</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Adustina</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Antas</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Aporá</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Araci</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Banabé</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Camaçari</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Canudos</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Chorrochó</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Cícero Dantas</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Cipó</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Coronel João Sá</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Cristópolis</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Corajá</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Fátima</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Herópolis</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Indaialópolis</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Itapicuru</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Itúba</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Jaguarari</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Jeremoabo</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Macurú</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Monte Santo</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Nordestina</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Nova Soure</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Novo Triunfo</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Olinda</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Paripiranga</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Quilomb</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Ribeira do Amparo</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Ribeira do Pombal</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Rio Real</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Rodelas</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Santaluz</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Sábio Dias</td></tr> </table> <table> <tr> <th>UF</th><th>Município</th></tr> <tr><td>BA</td><td>Senhor do Bonfim</td></tr> <tr><td>BA</td><td>São do Quinto</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Tucano</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Uauá</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Acopiara</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Alto Santo</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Baião</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Banabuiú</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Boa Viagem</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Cedro</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Itó</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Ipajurim</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Itacema</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Itatira</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Jaguaretama</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Jaguaribara</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Jaguaribe</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Lavras da Mangabeira</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Mombaca</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Monsenhor Tabosa</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Morada Nova</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Ordos</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Pedra Branca</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Pereiro</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Quixeló</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Santa Quitéria</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Senador Pompeu</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Timari</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Várzea Alegre</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Afogados da Igazinha</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Água Preta</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Águas Belas</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Alagoinha</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Aliança</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Araipina</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Belém do São Francisco</td></tr> </table> <table> <tr> <th>UF</th><th>Município</th></tr> <tr><td>PE</td><td>Belo Jardim</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Betânia</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Bodocó</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Bom Conselho</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Bom Jardim</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Bonito</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Brejão</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Brejinho</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Brejo da Madre de Deus</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Budque</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Cabrobó</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Caetés</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Calçado</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Capoeiras</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Carnaíba</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Carnaubeira da Penha</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Casinhas</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Catende</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Correntes</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Custódia</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Escada</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Exu</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Floresta</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Gamaleira</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Iati</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Itimirim</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Igaracy</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Itajá</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Ingazeira</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Ipupiá</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Itacuruba</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Itaíba</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Itambé</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Itapetim</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Jaqueria</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Jataúba</td></tr> </table> 	UF	Município	BA	Abaré	BA	Acajutiba	BA	Adustina	BA	Antas	BA	Aporá	BA	Araci	BA	Banabé	BA	Camaçari	BA	Canudos	BA	Chorrochó	BA	Cícero Dantas	BA	Cipó	BA	Coronel João Sá	BA	Cristópolis	BA	Corajá	BA	Fátima	BA	Herópolis	BA	Indaialópolis	BA	Itapicuru	BA	Itúba	BA	Jaguarari	BA	Jeremoabo	BA	Macurú	BA	Monte Santo	BA	Nordestina	BA	Nova Soure	BA	Novo Triunfo	BA	Olinda	BA	Paripiranga	BA	Quilomb	BA	Ribeira do Amparo	BA	Ribeira do Pombal	BA	Rio Real	BA	Rodelas	BA	Santaluz	BA	Sábio Dias	UF	Município	BA	Senhor do Bonfim	BA	São do Quinto	BA	Tucano	BA	Uauá	CE	Acopiara	CE	Alto Santo	CE	Baião	CE	Banabuiú	CE	Boa Viagem	CE	Cedro	CE	Itó	CE	Ipajurim	CE	Itacema	CE	Itatira	CE	Jaguaretama	CE	Jaguaribara	CE	Jaguaribe	CE	Lavras da Mangabeira	CE	Mombaca	CE	Monsenhor Tabosa	CE	Morada Nova	CE	Ordos	CE	Pedra Branca	CE	Pereiro	CE	Quixeló	CE	Santa Quitéria	CE	Senador Pompeu	CE	Timari	CE	Várzea Alegre	PE	Afogados da Igazinha	PE	Água Preta	PE	Águas Belas	PE	Alagoinha	PE	Aliança	PE	Araipina	PE	Belém do São Francisco	UF	Município	PE	Belo Jardim	PE	Betânia	PE	Bodocó	PE	Bom Conselho	PE	Bom Jardim	PE	Bonito	PE	Brejão	PE	Brejinho	PE	Brejo da Madre de Deus	PE	Budque	PE	Cabrobó	PE	Caetés	PE	Calçado	PE	Capoeiras	PE	Carnaíba	PE	Carnaubeira da Penha	PE	Casinhas	PE	Catende	PE	Correntes	PE	Custódia	PE	Escada	PE	Exu	PE	Floresta	PE	Gamaleira	PE	Iati	PE	Itimirim	PE	Igaracy	PE	Itajá	PE	Ingazeira	PE	Ipupiá	PE	Itacuruba	PE	Itaíba	PE	Itambé	PE	Itapetim	PE	Jaqueria	PE	Jataúba
UF	Município																																																																																																																																																																																																																														
BA	Abaré																																																																																																																																																																																																																														
BA	Acajutiba																																																																																																																																																																																																																														
BA	Adustina																																																																																																																																																																																																																														
BA	Antas																																																																																																																																																																																																																														
BA	Aporá																																																																																																																																																																																																																														
BA	Araci																																																																																																																																																																																																																														
BA	Banabé																																																																																																																																																																																																																														
BA	Camaçari																																																																																																																																																																																																																														
BA	Canudos																																																																																																																																																																																																																														
BA	Chorrochó																																																																																																																																																																																																																														
BA	Cícero Dantas																																																																																																																																																																																																																														
BA	Cipó																																																																																																																																																																																																																														
BA	Coronel João Sá																																																																																																																																																																																																																														
BA	Cristópolis																																																																																																																																																																																																																														
BA	Corajá																																																																																																																																																																																																																														
BA	Fátima																																																																																																																																																																																																																														
BA	Herópolis																																																																																																																																																																																																																														
BA	Indaialópolis																																																																																																																																																																																																																														
BA	Itapicuru																																																																																																																																																																																																																														
BA	Itúba																																																																																																																																																																																																																														
BA	Jaguarari																																																																																																																																																																																																																														
BA	Jeremoabo																																																																																																																																																																																																																														
BA	Macurú																																																																																																																																																																																																																														
BA	Monte Santo																																																																																																																																																																																																																														
BA	Nordestina																																																																																																																																																																																																																														
BA	Nova Soure																																																																																																																																																																																																																														
BA	Novo Triunfo																																																																																																																																																																																																																														
BA	Olinda																																																																																																																																																																																																																														
BA	Paripiranga																																																																																																																																																																																																																														
BA	Quilomb																																																																																																																																																																																																																														
BA	Ribeira do Amparo																																																																																																																																																																																																																														
BA	Ribeira do Pombal																																																																																																																																																																																																																														
BA	Rio Real																																																																																																																																																																																																																														
BA	Rodelas																																																																																																																																																																																																																														
BA	Santaluz																																																																																																																																																																																																																														
BA	Sábio Dias																																																																																																																																																																																																																														
UF	Município																																																																																																																																																																																																																														
BA	Senhor do Bonfim																																																																																																																																																																																																																														
BA	São do Quinto																																																																																																																																																																																																																														
BA	Tucano																																																																																																																																																																																																																														
BA	Uauá																																																																																																																																																																																																																														
CE	Acopiara																																																																																																																																																																																																																														
CE	Alto Santo																																																																																																																																																																																																																														
CE	Baião																																																																																																																																																																																																																														
CE	Banabuiú																																																																																																																																																																																																																														
CE	Boa Viagem																																																																																																																																																																																																																														
CE	Cedro																																																																																																																																																																																																																														
CE	Itó																																																																																																																																																																																																																														
CE	Ipajurim																																																																																																																																																																																																																														
CE	Itacema																																																																																																																																																																																																																														
CE	Itatira																																																																																																																																																																																																																														
CE	Jaguaretama																																																																																																																																																																																																																														
CE	Jaguaribara																																																																																																																																																																																																																														
CE	Jaguaribe																																																																																																																																																																																																																														
CE	Lavras da Mangabeira																																																																																																																																																																																																																														
CE	Mombaca																																																																																																																																																																																																																														
CE	Monsenhor Tabosa																																																																																																																																																																																																																														
CE	Morada Nova																																																																																																																																																																																																																														
CE	Ordos																																																																																																																																																																																																																														
CE	Pedra Branca																																																																																																																																																																																																																														
CE	Pereiro																																																																																																																																																																																																																														
CE	Quixeló																																																																																																																																																																																																																														
CE	Santa Quitéria																																																																																																																																																																																																																														
CE	Senador Pompeu																																																																																																																																																																																																																														
CE	Timari																																																																																																																																																																																																																														
CE	Várzea Alegre																																																																																																																																																																																																																														
PE	Afogados da Igazinha																																																																																																																																																																																																																														
PE	Água Preta																																																																																																																																																																																																																														
PE	Águas Belas																																																																																																																																																																																																																														
PE	Alagoinha																																																																																																																																																																																																																														
PE	Aliança																																																																																																																																																																																																																														
PE	Araipina																																																																																																																																																																																																																														
PE	Belém do São Francisco																																																																																																																																																																																																																														
UF	Município																																																																																																																																																																																																																														
PE	Belo Jardim																																																																																																																																																																																																																														
PE	Betânia																																																																																																																																																																																																																														
PE	Bodocó																																																																																																																																																																																																																														
PE	Bom Conselho																																																																																																																																																																																																																														
PE	Bom Jardim																																																																																																																																																																																																																														
PE	Bonito																																																																																																																																																																																																																														
PE	Brejão																																																																																																																																																																																																																														
PE	Brejinho																																																																																																																																																																																																																														
PE	Brejo da Madre de Deus																																																																																																																																																																																																																														
PE	Budque																																																																																																																																																																																																																														
PE	Cabrobó																																																																																																																																																																																																																														
PE	Caetés																																																																																																																																																																																																																														
PE	Calçado																																																																																																																																																																																																																														
PE	Capoeiras																																																																																																																																																																																																																														
PE	Carnaíba																																																																																																																																																																																																																														
PE	Carnaubeira da Penha																																																																																																																																																																																																																														
PE	Casinhas																																																																																																																																																																																																																														
PE	Catende																																																																																																																																																																																																																														
PE	Correntes																																																																																																																																																																																																																														
PE	Custódia																																																																																																																																																																																																																														
PE	Escada																																																																																																																																																																																																																														
PE	Exu																																																																																																																																																																																																																														
PE	Floresta																																																																																																																																																																																																																														
PE	Gamaleira																																																																																																																																																																																																																														
PE	Iati																																																																																																																																																																																																																														
PE	Itimirim																																																																																																																																																																																																																														
PE	Igaracy																																																																																																																																																																																																																														
PE	Itajá																																																																																																																																																																																																																														
PE	Ingazeira																																																																																																																																																																																																																														
PE	Ipupiá																																																																																																																																																																																																																														
PE	Itacuruba																																																																																																																																																																																																																														
PE	Itaíba																																																																																																																																																																																																																														
PE	Itambé																																																																																																																																																																																																																														
PE	Itapetim																																																																																																																																																																																																																														
PE	Jaqueria																																																																																																																																																																																																																														
PE	Jataúba																																																																																																																																																																																																																														




3. Panorama Geral Liberação Faixa 3,5 GHz (30/10/2024)



https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?8-74Kn1tDR89f1Q7RjX8EYU46IzCFD26Q9Xx5QNDbqbFqP3pgN... 6/26

Item	Descrição
------	-----------

4. Planejamento TVRO – Plano de Aceleração de Instalação

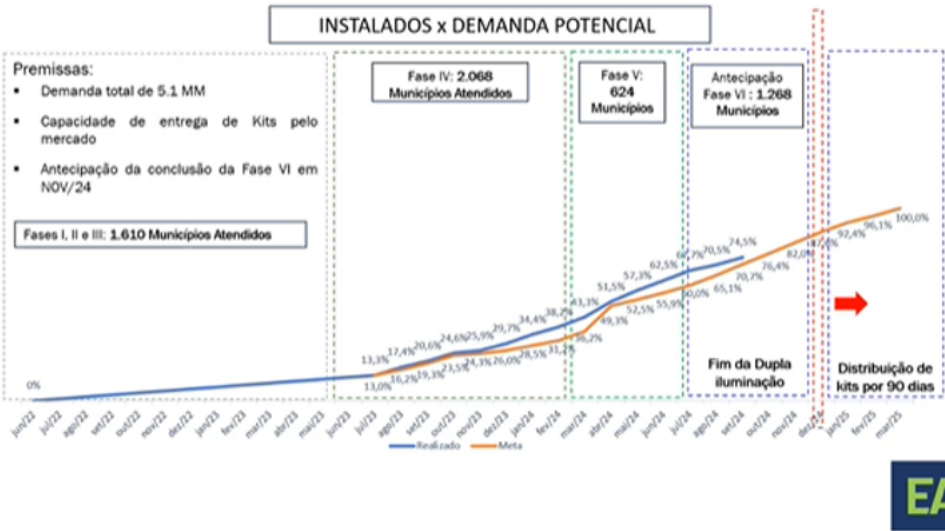


A respeito do Plano de Aceleração, o **Sr. Leandro Guerra** registrou que ele projetava as instalações conforme a pesquisa realizada pela EAF que aponte milhões de instalações, ressaltando que a figura acima mostra no gráfico azul o que foi efetivamente instalado e no gráfico vermelho a projeção que, considerando o prazo de 90 (noventa) dias após a dupla iluminação para alcançar 100% da pesquisa. afirmou ainda que, no mês de setembro, a entidade alcançou 74,5% daquela demanda e que, conforme informado anteriormente, estariam alcançando, no mês de outubro, mais de 4.150.000 milhões de instalações o que representa praticamente 80%, sempre acima do que foi projetado no planejamento de aceleração da instalação da TVRO.

O **Secretário Executivo do GAISPI** interrompeu a apresentação e afirmou que gostaria de aproveitar a presença do **Sr. Wilson Diniz Wellisch** e da **Sra. Naufel Schettino**, representantes do Ministério das Comunicações, para expressar os elogios em chegar, aproximadamente há uma semana, nessa marca de 4.100.000 milhões de kits instalados, o que merece destaque e ser celebrado pelo sucesso, superando as expectativas em mais de 18 (dezoito) meses, sendo enganoso.

O **Sr. Leandro Guerra** esclareceu que o prazo previsto no Edital para a Fase 6 seria para o mês de janeiro de 2026 e que estariam trabalhando, com cronograma por ele mostrado anteriormente, para que, no próximo GAISPI, seja executada a limpeza da faixa de 3,5 GHz completa em todo o território nacional faltando somente 189 municípios na Bahia e que, com isso, antecipariam o prazo do Edital em praticamente 1 ano e 2 meses.

Ainda sobre esse assunto, o **Secretário Executivo do GAISPI** questionou então se a entidade acabaria com a limpeza da faixa este ano, tendo o **Sr. Leandro Guerra** confirmado que sim, projetando novamente o Cronograma Macro do projeto:

2. Planejamento–Cronograma Macro (624+1.268 Municípios)

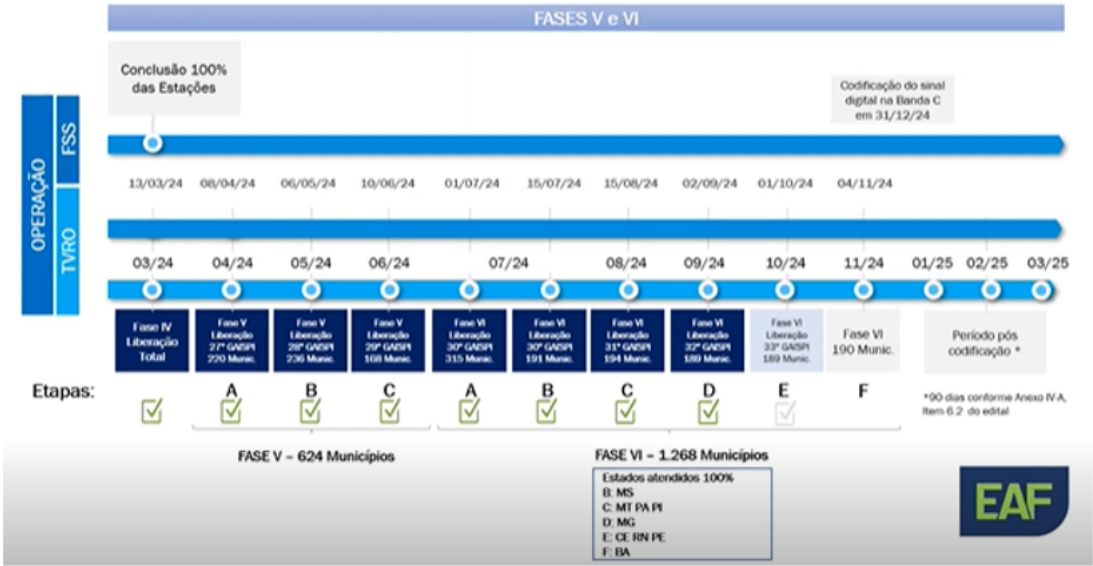

Com o intuito de esclarecer a dúvida do **Secretário Executivo do GAISPI**, o **Sr. Leandro Guerra** reforçou que, agora, no mês de outubro, estariam na Fase E, a depender da deliberação de hoje, completariam a limpeza da faixa em 189 municípios, completando todo o território dos estados do Ceará, Pernambuco e Grande do Norte, faltando então 190 municípios do estado da Bahia que compõem, portanto, a Fase F prevista para ser executada no mês de novembro. Isso quer que toda a mitigação e a desocupação do FSS já foram executadas há algum tempo e com mais de 2 anos de antecedência, e que o que estaria faltando, agora, justamente a operação de TVRO. Desse modo, o **Sr. Leandro Guerra** informou que, quanto à limpeza, o planejamento da EAF seria concluí-la no novembro, salientando que, no GAISPI do final de novembro, terão um marco importante do projeto que será o término da limpeza da faixa e a deliberação do GAISPI autorizando o uso dessa faixa, com a conclusão dessa etapa do projeto que, por sua vez, estaria mostrada no gráfico abaixo:

26/11/2024, 16:57

SEI/ANATEL - 12901271 - Registro de Reunião

Item

Descrição

3. Panorama Geral Liberação Faixa 3,5 GHz (30/10/2024)

5.380

Localidades

AC	22
AL	152
AM	62
AP	16
BA	227
CE	184
DF	1
ES	78
GO	246
MA	217
MG	853
MS	79
MT	141
PA	144
PB	223
PE	185
PI	224
PR	399
RJ	92
RN	167
RO	52
RR	15
RS	487
SC	285
SE	75
SP	645
TO	139

REALIZADO - EDITAL

Fase I (Capitais)

100%

Fase II (>=500k)

100%

Fase III (>=200k)

100%

Fase IV (>=100k)

100%

Fase VI (>=30k)

750 Municípios 88%

+ 70 Munic. 97%

100%

(820) (848)

Pool 30k (<=30k)

4.115 Municípios 94%

+ 119 Munic. 96%

100%

(4.234) (4.396)

OBRIGAÇÃO - EDITAL

27 Municípios até 28/10/22

26 Municípios até 01/01/23

102 Municípios até 30/06/23

171 Municípios até 30/06/24

848 Municípios até 01/01/26

4.396 Municípios

25% até 30/06/23 - Fase II;

50% até 30/06/24 - Fase IV;

75% até 30/06/25 - Fase V;

100% até 01/01/26 - Fase VI.

A EAF realizou a limpeza da faixa de 3.5 GHz e está realizando a migração TVRO em 5.380 municípios

Estados 100% liberados pela EAF - RS, SC, PR, AP, RR, AL, DF, SP, RJ, ES, MA, SE, PB, RO, TO, AC, AM, GO, MS, MT, PA, PI, MG, CE, RN e PE

Legenda

Cenário com a liberação dos 189 municípios da Fase VI-E totalizando 5.380 municípios

Retomando a apresentação sobre o Planejamento TVRO – Plano de Aceleração de Instalação, o **Sr. Leandro Guerra** projetou novamente o seguinte *sl* esclarecer que o gráfico abaixo mostra outra questão referente à quantidade de instalações realizadas (linha azul) *versus* a demanda identificada na pesquisa (linha vermelha):

4. Planejamento TVRO – Plano de Aceleração de Instalação

INSTALADOS x DEMANDA POTENCIAL

Premissas:

Demanda total de 5.1 MM

Capacidade de entrega de Kits pelo mercado

Antecipação da conclusão da Fase VI em NOV/24

Fases I, II e III: 1.610 Municípios Atendidos

Fase IV: 2.068 Municípios Atendidos

Fase V: 624 Municípios

Antecipação Fase VI: 1.268 Municípios

0%

100,0%

Realizado

Meta

Fim da Dupla Iluminação

Distribuição de kits por 90 dias

Reforçou que o gráfico acima vem sendo mostrado desde o mês de junho do ano passado e registrou que sempre tiveram acima da linha vermelha e que, projetam o mês de outubro, conforme já exibido anteriormente, superando a marca de 4.150.000 milhões de instalações, estarão acima de 80% da *d* identificada pela pesquisa e a linha vermelha com 76,4%, de modo que a execução estaria acima do planejado, em termos de aceleração e instalação, consi esse universo e esse prazo identificado a partir da dupla iluminação prevista no Edital.

O **Secretário Executivo do GAISPI** parabenizou o **Sr. Leandro Guerra** e concedeu a palavra ao **Sr. Wilson Diniz Wellisch**.

O **Sr. Wilson Diniz Wellisch** afirmou que gostaria de fazer como suas as palavras do **Secretário Executivo do GAISPI** no que diz respeito a todo o trab foi realizado nesse período pela EAF e, como registrado pelo **Sr. Leandro Guerra**, antecipando as entregas e as liberações, o que impactam nesse resulta realmente celebrado, liberando toda a faixa com uma antecipação bem considerável em relação àquilo que estava previsto no Edital. Nesse contexto, o **Sr. Diniz Wellisch** parabenizou então ao **Sr. Leandro Guerra** e toda a sua equipe no que tange ao projeto TVRO, onde tudo estaria acontecendo com r Reforçou que essa antecipação traz um resultado positivo para as teles, para o setor de radiodifusão, que tem garantido que todos os kits estariam distribuídos e que o TVRO já estaria com uma curva crescente de utilização, em que pese não terem conseguido regulamentar esse serviço ainda e afirma pretendem, em futuro breve, regulamentá-lo para classificá-lo como um serviço de radiodifusão definitivamente. Afirmou ainda que os números mostra TVRO, especialmente depois de todo esse projeto, se tornou um serviço de grande interesse por parte dos radiodifusores e até de que ainda não é radic Finalizou parabenizando a EAF, a SOR, a Anatel, o Ministério e a equipe de todos os envolvidos.

O **Sr. Leandro Guerra** agradeceu as palavras, em nome da EAF, e afirmou que se trata de um trabalho constante da entidade em busca do atendi superação das metas e que sempre destaca que essa conquista não é somente da EAF, mas também de todo o time da Anatel e do GAISPI. Destacou que o é um sucesso de cada um do Grupo e que, desde o início do processo, tiveram vários desafios e que, quando verifica que estariam chegando ao ponto de conclusão” dessa parte do projeto, parece fácil, porém, ressaltou que não foi, visto que é sabido quantos obstáculos tiveram ao longo do caminho e que contaram com a colaboração de cada um dos *stakeholders* envolvidos, cada um logicamente olhando para os seus interesses, mas todos caminhando na direção, sendo esse o segredo desse sucesso referente à antecipação que tiveram até o momento.


O **Secretário Executivo do GAISPI** questionou ao **Sr. Leandro Guerra** se ele saberia informar o *feedback* da população que estaria com esses kit **Leandro Guerra** esclareceu que a entidade teria feito alguns registros para demonstrar o impacto da nova parabólica digital na vida dessa população e do brasileiro que está no interior e em qualquer ponto do País, afirmando se tratar de algo impressionante também o lado social do projeto. Aduziu que não

https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?8-74Kn1tDR89f1Q7RjX8EYU46IzCFD26Q9Xx5QNDbbqFqP3pgN...


8/26

Item	Descrição
	falando de uma concentração urbana e que essa população estaria muito distribuída na área rural e de baixa renda, sendo essa, muitas vezes, a única forma desse cidadão, salientando que esse também é um motivo de orgulho do projeto, haja vista que ele atinge um objetivo social importante da política pública sua origem. O Sr. Wilson Diniz Wellisch questionou ao Sr. Leandro Guerra se a entidade, quando terminar a execução, continua com o processo de distribuição por (noventa) dias. O Sr. Leandro Guerra afirmou que, sim, as instalações continuam e que, hoje, o Edital prevê mais 90 (noventa) dias a partir da data de dezembro, que está estabelecida como dupla iluminação. Registrou ainda que alcançar os 100% nunca é fácil, por saberem que, às vezes, a última milha é complexa, mas ressaltou que a entidade estaria empenhada e que a operação estaria toda mobilizada, conforme se verifica no gráfico da <u>Migração e Acumulado Instalações Realizadas (29/10/2024)</u>, que mostra uma projeção para o mês de outubro de mais de 4.150.000 milhões de instalações, o que representa mais de 80% do que foi levantado na pesquisa. Nesse sentido, o Sr. Leandro Guerra informou que, no GAISPI do mês de novembro, mostrarão esse percentual no gráfico <u>Planejamento TVRO - Plano de Aceleração de Instalação</u>, comprovando que estariam sempre acima do que foi planejado e que se trata de um sucesso, conseguindo superar a projeção do Plano de Aceleração compartilhado no mês de julho do ano passado. O Sr. Wilson Diniz Wellisch também questionou ao Sr. Leandro Guerra se haveria uma previsão de sobra de recursos. O Sr. Leandro Guerra afirmou ainda seria prematuro, uma vez que a entidade ainda não teria o número exato de instalações, esclarecendo que a entidade faz algumas projeções, mas no momento oportuno, voltariam ao GAISPI com esse número. Além disso, informou que, a respeito da mitigação e desocupação FSS, a entidade já tem o número, lembrando que o projeto era de praticamente 400 milhões de reais, conforme estava no Edital, e que conseguiram executá-lo praticamente com os recursos, o que mostra uma economia significativa. Ressaltou que, no projeto ora apresentado, os desafios seriam bem maiores, tendo como questões prioritárias a logística e a instalação, não sendo apenas a distribuição dos kits, havendo também um trabalho de comunicação, atendimento, distribuição dos kits e instalação, seja, um processo bastante complexo. O Sr. Leandro Guerra aduziu que o Sr. Paulo Roberto Cozza apresentaria, mais adiante, os dados financeiros do projeto do terceiro trimestre e que daria uma parcial desse consumo de recursos do projeto, mas que, quanto ao número questionado, a entidade o terá posteriormente quando estiverem mais maduros em relação ao término das instalações. O Sr. Wilson Diniz Wellisch ressaltou a importância de terem esse número, por entender que, em algum momento, o Grupo terá que tomar algumas decisões em relação às sobras de recurso e que, especificamente, nesse projeto, as sobras de recursos voltariam para a União, de modo que teriam que eventualmente pensar no universo de beneficiários e algo nesse sentido, para utilizar esse recurso em sua plenitude. O Sr. Leandro Guerra manifestou sua concordância e afirmou que, na medida em que estão evoluindo e chegando ao final das instalações, terão um número mais maduro, reiterando que o Sr. Paulo Roberto Cozza daria um panorama parcial mais adiante. Passando para o quinto item de sua agenda, <u>Projeto PAIS</u>, o Sr. Leandro Guerra exibiu o <i>slide</i> abaixo reproduzido para mostrar o mapa do projeto Conectado, com as 6 Infovias do Projeto EAF, destacando que a execução ocorre em duas etapas, sendo que as Infovias 02, 03 e 04, compõem a Etapa 1 e as Infovias 05, 06 e 08, compõem a Etapa 2 do projeto:

5. NORTE CONECTADO - As 6 Infovias do Projeto EAF

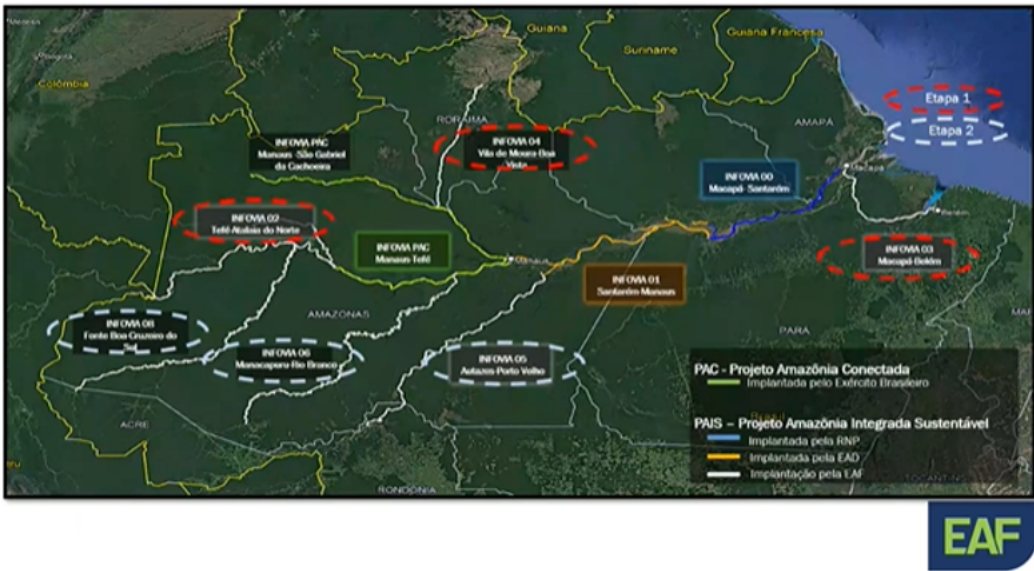

Em seguida, o **Sr. Leandro Guerra** destacou os pontos de atenção quanto ao prazo do Projeto PAIS, nos termos do *slide* abaixo transcrito, ressaltando que estabelecido no Edital é o mês de fevereiro de 2026, isto é, 4 anos após a instalação/formação da pessoa jurídica da EAF:

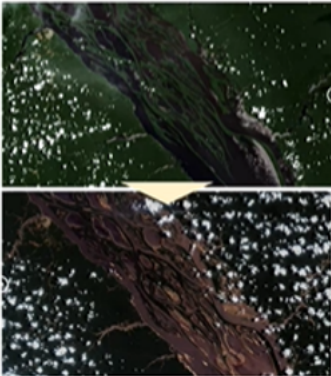Item	Descrição										
	5. Pontos de atenção quanto ao prazo do Projeto PAIS <table><thead><tr><th>Ponto de Atenção</th><th>Descrição</th></tr></thead><tbody><tr><td>Licenciamento Ambiental</td><td>Necessidade de análise simultânea dos pedidos pelo IBAMA</td></tr><tr><td>Licença Operacional</td><td>Tempo de emissão da Licença LO</td></tr><tr><td>Múltiplos lançamentos</td><td>Limitação de capacidade técnica e equipamentos.</td></tr><tr><td>Seca no Amazonas</td><td>Seca intensa e níveis dos rios seguem abaixo do volume previsto.</td></tr></tbody></table> Pior seca já registrada faz rios da Amazônia atingirem baixa histórica Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o nível dos rios da Amazônia atingiu sua menor marca em mais de 100 anos.  Stark before-and-after pictures reveal dramatic shrinking of major Amazon rivers Imagens de satélite mostram a redução drástica do nível dos rios da Amazônia.  Indústria e portos se preparam para seca mais severa no AM, mas reclamam de falta de solução perene Com a seca intensificada, a indústria e os portos enfrentam dificuldades para operar.  Sobre o slide em tela, o Sr. Leandro Guerra fez os seguintes destaques: - Quanto à seca no Amazonas, afirmou que as figuras foram retiradas do site da CNN e mostram o “antes e depois” no Lago de Tefé, Manaus e o b Educandos, respectivamente, reforçando que a seca deste ano tem sido pior, o que tem impactado de maneira significativa o projeto, visto que a janela de c estaria muito reduzida, não sendo apenas para o lançamento do cabo, mas também para a preparação do processo, na medida em que precisam ins containers e equipamentos terrestres, ficou inviável a navegação para essa preparação. Nesse sentido, a título de exemplo, informou que a entidade já teria condições para poder executar a instalação do cabo da Infovia 02 e que, atualmente, não está sendo possível devido à seca, e que estariam aguardando o mês de novembro e início de dezembro para avaliar as condições e verificar se é possível iniciar o lançamento da Infovia 02; - Quanto aos múltiplos lançamentos, informou que o cronograma também estaria apertado há algum tempo, visto que terão que realizar, no próximo ano (aquelas 3 infovias (05, 06 e 08) praticamente ao mesmo tempo, o que nunca foi realizado em todo o processo do Norte Conectado e isso aumentará o de entidade; e - Quanto à questão da licença operacional, registrou que, em 19 de junho de 2024, entraram com esse pedido para a Infovia 03 e que, até o momento, nã que teria a notícia de que o Ibama acionou os intervenientes e o processo estaria bastante longo, sendo mais um desafio identificado pela entidade. Destaco Ministério das Comunicações tem realizado um apoio sistemático à EAF perante o Ibama, mas que esse é realmente um ponto importante. O Sr. Wilson Diniz Wellisch solicitou a palavra e afirmou que, com relação a esse projeto, sempre ouviu que era importante fazer o lançamento, sendo po navegação obviamente, em período de mais baixa do rio, porque isso tornaria possível identificar os pontos onde eventualmente o cabo ficará exposto, p enterrem e, quando subir, não correr o risco de ficar exposto e romper. Salientou também que o lançamento se daria na cheia ou com o rio subindo. Nesse questionou ao Sr. Leandro Guerra se haveria previsão no projeto de retornar, quando houver uma próxima vazante do rio, para identificar os loca eventualmente ele poderia ficar exposto. O Sr. Leandro Guerra esclareceu que o que geralmente é feito nesse projeto é um levantamento prévio da posição do cabo, de modo que, antes de lançar a entidade tem dois processos, a saber: o EVR e o ERA. Explicou que o EVR é o Estudo de Viabilidade da Rota que é o levantamento feito <i>in loco</i>, passa barco de pequeno porte para identificar as condições terrestres para poder instalar os equipamentos e poder dimensionar o cabo para a sua produção. Reg título de exemplo, que essa primeira etapa acabou de ser executada na Infovia 05. Em seguida, explicou que é feito o ERA que é o Estudo de Rota Avan que é feita uma identificação mais precisa da localização do cabo e onde ele deve ser lançado, o que gera uma base de dados para que, no momento do lanç possam efetuar o lançamento na posição correta, ressaltando que isso é feito durante a etapa preparatória. Prosseguiu esclarecendo que, depois do lançan cabo e quanto à questão levantada pelo Sr. Wilson Diniz Wellisch no sentido de o cabo ficar mais exposto, isso seria uma consequência do projeto e o aconteceria mais frequentemente em função das condições climáticas. O Sr. Leandro Guerra destacou que a entidade também estaria estudando algumas tecnologias alternativas e informou que o enterramento do cabo no leito não foi muito utilizado em nenhum dos lançamentos até o momento, registrando que é feito um depósito do cabo no leito do rio, obedecendo as caract mencionadas anteriormente e que são realizadas no levantamento prévio. Reiterou que estariam testando e avaliando outras tecnologias e que isso será div grupo técnico para que possam avançar, visto que isso também geraria um custo de lançamento maior, ressaltando que o custo do enterramento do cabo superior em relação ao depósito do cabo. O Sr. Leandro Guerra registrou que outro ponto importante e que tem sido muito comentado aqui diz respeito à resiliência da topologia. Esclareceu que a Norte Conectado seria uma rede estrela, tendo a cidade de Manaus como o centro dessa estrela, e que isso já acontece hoje com as infovias que foram l antes da EAF. Reforçou que é muito importante para que esse projeto tenha resiliência que a entidade identifique também a possibilidade de fechamento mais para frente, como um planejamento estratégico do Norte Conectado, afirmando que seria isso que garantiria maior resiliência dessas rotas no futuro. Nesse contexto, o Sr. Leandro Guerra exibiu o slide abaixo e destacou que a EAF já estaria enfrentando, na Infovia 03, três rompimentos na rota entre Curralinhos, sendo o último no final do mês de setembro e que, até o momento, ainda estão buscando consertar o cabo, esclarecendo que as equipes já f local e identificaram a posição do cabo, estando ele já sinalizado, mas que as condições da maré do rio não permitiriam a operação que, por sua vez, se tr uma operação bem complicada onde ocorreu o incidente:	Ponto de Atenção	Descrição	Licenciamento Ambiental	Necessidade de análise simultânea dos pedidos pelo IBAMA	Licença Operacional	Tempo de emissão da Licença LO	Múltiplos lançamentos	Limitação de capacidade técnica e equipamentos.	Seca no Amazonas	Seca intensa e níveis dos rios seguem abaixo do volume previsto.
Ponto de Atenção	Descrição										
Licenciamento Ambiental	Necessidade de análise simultânea dos pedidos pelo IBAMA										
Licença Operacional	Tempo de emissão da Licença LO										
Múltiplos lançamentos	Limitação de capacidade técnica e equipamentos.										
Seca no Amazonas	Seca intensa e níveis dos rios seguem abaixo do volume previsto.										

Item	Descrição
	5. Status PAIS INFOVIA 03 INCIDENTE 20/09 – Trecho Belém/Curralinho Rompimento do Cabo Subaquático confirmado à 65 km de Belém, causa raiz em análise, com indícios de ruptura por ancora de navio. ✓ Identificação do incidente 22/set ✓ Será necessário substituir 7km de cabo óptico ✓ Cabo sobressalente no local em 13/out ✓ Troca de plataforma realizada para maior estabilidade em 13/out ✓ Início da recuperação 14/out ✓ Entre os dias 15 e 18/out foi localizado o cabo para o reparo ✓ De 19 a 25/out não foi possível realizar a recuperação devido a condições climáticas Sistema de Monitoramento - Detecção de Indisponibilidade  Local do Incidente: 65 km de Belém   Ainda sobre esse último incidente, o Sr. Leandro Guerra informou que haverá uma substituição de 7 km do cabo óptico e que as duas pontas já sinalizadas e que estão esperando as condições favoráveis para que seja feita a execução. Aduziu que estaria mostrando isso ao Grupo, haja vista que rompimentos seriam o maior desafio do projeto Norte Conectado, e que isso comprova a importância de uma análise constante da topologia desse projeto. O Sr. Wilson Diniz Wellisch observou que a ruptura teria ocorrido por conta de uma âncora de um navio. O Sr. Leandro Guerra esclareceu que ele fundeado em uma posição e, por outro lado, o cabo também se movimenta, de forma que esse barco teria ancorado e, com isso, arrastou o cabo por cerca de 100 metros, o que causou o rompimento em duas pontas do cabo. O Sr. Leandro Guerra informou que isso já teria acontecido outras vezes e entendeu importante destacar que essa situação levou inclusive a aprovar, aqui no GAISPI, uma redundância/anel, exibindo o <i>slide</i> abaixo: 5. Status PAIS INFOVIA 03 Evolução da Infovia  LEGENDA - concluído - em execução - planejado ETAPA 1 - Belém, Curralinho, Breves e Macapá Fase 01 Atividades em Execução: Gerais ➤ Processo de Emissão da Licença de Operação (LO) ✓ Emitido o Parecer de Viabilidade, aguardando a manifestação conclusiva dos órgãos intervenientes (Ofício enviado INCRA, IPHAN e MS) ➤ Transferências da Infraestrutura para o MCom - (*Nov/24) ➤ Recuperação do incidente (trecho Belém-Curralinho), trabalhos de recuperação em processo Rede Metropolitana: ➤ Belém/PA - 100% aprovado na concessionária de energia ✓ Anel principal instalado. Em fase de implantação dos acessos (prev. Dez/24) ➤ Curralinho/PA e Breves/PA, rede implantada e em monitoramento Fase 02 Atividades em Execução: Gerais ➤ Implantação da rota ramificada (Afuá e Ponta de Pedras) e Contingência (Ponta de Pedras e Curralinho) ✓ Licenças IBAMA e Marinha foram emitidas ✓ SICOS - Serviço de Lançamento contratado ✓ Processos adjudicatados de compras de equipamentos ✓ Cabo adquirido, entrega prevista para mar/25 Rio Amazonas  EAF *prazo estimado para conclusão Sobre essa aprovação do GAISPI, o Sr. Leandro Guerra esclareceu que, conforme figura à direita do <i>slide</i> acima, já teriam lançado de Belém até Macapá a primeira etapa da Infovia 03, chamada Fase 1 da Infovia 03, e que ainda falta executar Ponta de Pedra/Belém e Macapá/Afuá, que seria a segunda etapa da Infovia 03. Informou que, no início do próximo ano, um anel entre Curralinho e Ponta de Pedra, a fim de fechar esse anel e tornar mais robusto o início dessa Infovia 03 de Belém. Afirmou que o cabo está previsto para ser entregue no mês de março de 2025, e a execução deverá ocorrer no segundo semestre de 2025 e, com isso, terá uma resiliência maior, ou seja, uma eventual interrupção no futuro nesse trecho que estaria muito sensível, por já ter tido três incidentes, ele já estaria bem mais protegido com esse anel que envolverá Ponta de Pedra/Curralinho, afirmando que uma interrupção desse tipo não impactaria no serviço de telecomunicações, sendo essa situação da Infovia 03. Dando sequência à sua apresentação, o Sr. Leandro Guerra passou a reportar o <i>status</i> do Projeto PAIS em relação à Infovia 03, conforme <i>slide</i> reproduzido, fazendo os seguintes destaques no que se refere à sua execução: 1) Reiterou que foi solicitada a licença de operação no dia 19 de junho de 2024 e que estariam aguardando o Ibama que, por sua vez, já teria emitido um Parecer de Viabilidade e estaria aguardando a manifestação dos órgãos intervenientes, INCRA, IPHAN e Ministério da Saúde, que já foram consultados, para que manifestar formalmente sobre a licença de operação; 2) Informou que um processo muito importante diz respeito à transferência dessa infraestrutura, ressaltando que estariam trabalhando na infraestrutura de Belém, a Fase 1, cujo processo encontra-se alinhado com o Ministério da Comunicações e a Anatel e trata da transferência de infraestrutura de Belém para o Estado do Pará, depois seja viabilizada a alteração dessa rota. Destacou que o processo se encontra na fase de inventário pelo Ministério das Comunicações e que as informações foram passadas ao Ministério e que a entidade teria uma expectativa de ter uma resposta em novembro para que possam dar andamento a esse processo; e 3) Registrou que a Rede Metropolitana de Belém estaria 100% aprovada e realizou a leitura das demais informações contidas no <i>slide</i> acima. Passando para a Infovia 04, o Sr. Leandro Guerra projetou o seguinte <i>slide</i> que detalha o seu <i>status</i>, com as informações sobre a sua execução em relação à implantação do <i>Backbone</i> e da Rede Metropolitana:

Item	Descrição
	5. Status PAIS INFOVIA 04 Evolução da infovia LEGENDA ☒ concluído ☒ execução ☐ planejado Atividades em Execução: Gerais > 23/Ago, concluído implantação do cabo subaquático entre Vila de Moura/AM e Caracará/RR > 13/Set, ativado backbone subaquático + DWDM > Backbone Terrestre: Processo em análise pelo DNIT para uso da faixa de domínio BR-174 entre Caracará/RR e Boa Vista/RR ✓ Emitido os alvará pela Prefeitura de Caracará. Boa Vista segue em processo de emissão > Implantação cabo terrestre (D+120*) Rede Metropolitana: > V. Moura, S. Maria <u>Boiaçu</u>, Caracará e Boa Vista, com infraestruturas de 55 pontos e 104 km de cabo instalado sendo monitorados *Após liberação do uso da faixa de domínio (DNIT)

Com relação à Infovia 04, o **Sr. Leandro Guerra** fez os seguintes destaques:

- 1) Reforçou que já houve o lançamento do cabo subaquático entre Vila de Moura e Caracará;
- 2) afirmou que o trecho Caracará/Boa Vista ainda será lançado o terrestre, visto que as condições do Rio Branco não permitem o lançamento subaquático, estando aguardando o DNIT para aprovar o projeto, porque cruzarão a faixa domínio da BR-174, bem como o alvará da Prefeitura de Boa Vista autorizando a obra; e
- 3) Sobre as Redes Metropolitanas, realizou a leitura das informações contidas no *slide* acima.

Ato contínuo, o **Sr. Leandro Guerra** exibiu o *slide* abaixo reproduzido que passa a detalhar as informações sobre a execução da Infovia 02.

5. Status PAIS

INFOVIA 02

Evolução da infovia

Estudos de viabilidade	Aquisição e fabricação de cabos	Licenciamentos e autorizações ambientais	Infraestrutura terrestre (IPA, CMAD e Gabinete externo)	Lançamento do cabo	Ativação do backbone	Ativação da rede metropolitana
✓	✓	✓	✓	○	○	●

LEGENDA

- ✓ concluído
- execução
- planejado

Rio Solimões

Atividades em Execução:

Gerais

- Aplicação dos Programas Ambientais – Planejado para Nov/24:
 - ✓ FUNAI – Aplicação das Oficinas e Laboratório.
 - ✓ IBAMA – Plano de Comunicação Social
- Todos os CMADs/DWDM foram instalados
- Aprovado o projeto técnico pelo DNIT para uso da faixa de domínio BR-307 (Benjamin Constant - AM / Atalaia do Norte -AM)
- Implantação do cabo subaquático – prev. dez/24
- Ativação do backbone (DWDM) – prev. dez/24
- Implantação do backbone terrestre – prev. dez/24

Rede Metropolitana:

- Implantação concluída: Tefé, Alvarães, Uarini, Juruá e Tonantins
- Atividades suspensas para as demais 8 localidades, motivados pelo agravamento da vazante do rio – previsão de retorno para dez/24

EAF

A respeito da Infovia 02, o **Sr. Leandro Guerra** fez os seguintes destaques:

- 1) afirmou que não haveria novidades e que se trata da Infovia que ele havia comentado no sentido de que aguardam as condições do rio para poder realizar o lançamento;
- 2) informou que já teriam a autorização do DNIT e a licença de instalação para realizar o lançamento do cabo; e
- 3) registrou que houve a aprovação do projeto técnico no final da rota, entre Tabatinga até Atalaia do Norte, que são trechos terrestres, e que, na BR-307, já autorizou/aprovou o projeto e que, com isso, a entidade poderá iniciar a execução dessa parte terrestre no final, depois da fronteira, em Tabatinga, exatamente na fronteira entre Colômbia e Peru;

Em seguida, o **Sr. Leandro Guerra** apresentou as informações sobre o Plano de Implantação da Etapa 1 que envolve as Infovias 02, 03 e 04, cujo cronograma trata sobre o lançamento dos cabos, com o prazo de duração, previsões de início e de fim, bem como a presença de restrições hidrográficas e outras, encontra-se abaixo reproduzido e por ele exibido, com a leitura das informações nele contidas:

Item	Descrição					
5. Status PAIS – Plano de Implantação						
✓ Implantação do cabo subaquático						
	DURAÇÃO (lançamento do cabo)	INÍCIO	FIM	RESTRIÇÕES HIDROGRÁFICAS	RESTRIÇÕES Licença e Autorizações (Status)	
INFOVIA 03	18 dias	12/03/24	30/03/24**	Sem Restrições	IBAMA Em processo (LO) ¹ Emitido (LP) Emitido (LJ)	MARINHA Emitido (PIP)
INFOVIA 04	10 dias	14/08/24	23/08/24	SET a MAR	IBAMA Emitido (LJ) Emitido (LP)	MARINHA Emitido (PIP)
		PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM			
INFOVIA 02	29 dias	D0+10 dias*	D0+39 dias	JUL a NOV	IBAMA Emitido (LJ) Emitido (LP)	MARINHA Emitido (PIP)
* Depende da abertura da janela de operação, devido as condições hidrográficas. ** A Infovia 03 foi implantada com exceção de AFUÁ e PONTA de PEDRAS.						
(1) Em processo (LO) – Emitido o Parecer de Viabilidade, aguardando a manifestação conclusiva dos órgãos intervenientes (Ofício enviado INCRA, IPHAN e MS)						
EAF						

Ato contínuo, o Sr. **Leandro Guerra** reportou as informações sobre o *status* da execução da Infovia 05, contidas no *slide* a seguir transcrito:

5. Status PAIS – ETAPA 2

INFOVIA 05

Evolução da infovia

Estudos de viabilidade

Aquisição e fabricação de cabos

Licenciamentos e autorizações ambientais

Infraestrutura terrestre (IPA, CMAQ e Gabinete externo)

Lançamento do cabo

Ativação do backbone

Ativação da rede metropolitana

LEGENDA

concluído

em execução

planejado

Rio Madeira

Atividades em Execução:

Gerais

Inspeção Náutica e Terrestre:

✓ Inspeção Terrestre Realizada

✓ Inspeção Náutica Realizada

17/Out – Entrega do Relatório (náutica e terrestre). Análise do relatório em andamento.

Cabo Óptico Subaquático:

✓ 90,5% do cabo COS já fabricado (~1.120 km)

Iniciado o processo no IBAMA para licenciamento ambiental.

✓ Ficha de Caracterização de Atividade (FCA) – Concluído 03/Set

EAF

Com relação à Infovia 05, o Sr. **Leandro Guerra** fez os seguintes destaques:

1) Informou que o cabo já estaria sendo produzido e que a empresa fabricante é a HMN, sendo a mesma empresa que produziu o cabo da Infovia 01 executada pela EAD;

2) Registrou que as Inspeções Náutica e Terrestre realizadas foram um levantamento preliminar e que permite identificar melhor o tamanho do cabo; e

3) Afirmou que estariam aguardando as condições do rio para poder executar o ERA (Estudo de Rota Avançada) e fazer um levantamento mais preciso identificação da melhor passagem do cabo, ressaltando, portanto, que haveria um trabalho prévio a ser realizado na Infovia 05. Afirmou que o relatório inspeção preliminar já foi concluído e que estariam em fase de análise pela EAF para poder disparar algumas ações no projeto.

O Sr. **Leandro Guerra** passou a detalhar as informações acerca do *status* das Infovias 06 e 08, nos termos do seguinte *slide*:

https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?8-74Kn1tDR89f1Q7RjX8EYU46IzCFD26Q9Xx5QNDbqbFqP3pg...

13/26

Com o objetivo de mostrar o procedimento padronizado para a transferência dos ativos das infovias para o Ministério das Comunicações, o **Sr. Leandro** exibiu o *slide* abaixo reproduzido, realizando a leitura das informações nele contidas:

Item

Descrição

5. PAIS Procedimento padronizado p/ transferência das infraestruturas

Levantamento das infraestruturas
Levantamento das garantias HW e prazos de SW

Inventario in loco

Termo de Declaração de Entrega assinado



Cronograma Infovia 03 Fase1

- Ago/24 – Levantamento das infraestruturas e NF’s e evidências de instalação
- Ago/24 – Protocolo SEI 12443148 (16/08/24) do Termo de Declaração de entrega e os Anexos p/ ANATEL e MCom
- Ago/24 – Encaminhamento para MCom os locais dos Termos de autorização de uso de espaços/terrenos
- Set/24 – Versão final do Termo de Declaração Infovia 03 fase 1 – Processo 53500.088928/2021-76 em 19/09
- Set/24 – Apresentação do SER* do módulo Inventário
- Out/24 – Elaboração do Procedimento operacional dos testes de infraestrutura Óptica definindo os prazos de duração
- Nov/24 – Realização do Inventário in loco pelo MCom

Cronograma Infovia 04

- Set/24 – Iniciado o processo da Infovia 04, com levantamento das infraestruturas e NFs
- Out/24 – Encaminhamento do Termo de Declaração de entrega e os Anexos p/ ANATEL e MCom



*Sistema de Evidências Regulatória

Na sequência, o **Sr. Leandro Guerra** passou a reportar o sexto item de sua agenda, Projeto Rede Privativa de Governo, projetando a tabela abaixo que i evolução das RFPs/processos de concorrência em andamento, também realizando a leitura das informações contidas no *slide* a seguir:

6. Rede Privativa de Governo - RFPs em andamento

	Móvel	Fixa				
	MCPTx	SDWAN	GPON	ROTEADORES	SWITCH	Infra de PoPs
Data de publicação	30/08 ✓	30/08 ✓	30/08 ✓	30/08 ✓	02/09 ✓	30/08 ✓
Envio de questionamentos	06/09 ✓	06/09 ✓	06/09 ✓	11/09 ✓	06/09 ✓	06/09 ✓
Envio de respostas aos fornecedores	13/09 ✓	23/09 ✓	30/09 ✓	23/09 ✓	23/09 ✓	23/09 ✓
Envio de propostas técnica/comercial	25/09 ✓	30/09 ✓	15/10 ✓	30/09 ✓	30/09 ✓	02/10 ✓
Análise das propostas técnicas	23/10 ✓	01/11	08/11	08/11	08/11	29/10 ✓
Análise negociação comercial	30/10	08/11	14/11	14/11	14/11	04/11



Em seguida, com relação à Rede Privativa de Governo - Rede Fixa, o **Sr. Leandro Guerra** exibiu o *slide* abaixo e realizou a leitura das informações nele c

6. Rede Privativa de Governo – Rede Fixa


- ✓ EAF iniciou tratativas para uso da infraestrutura passiva com operadoras/potenciais fornecedoras com base na consulta ao SNOA
- ✓ EAF avalia a oportunidade de uso das infraestruturas passivas e respectivas ORPAs e utiliza-las, se necessário, após avaliação técnica e comercial
- ✓ EAF e Telebrás alinham minuta de contrato para ser utilizada nas contratações de infra passiva adotando o conceito de cessão a Telebrás das obrigações contratadas após a conclusão/aceitação
- ✓ EAF avalia também a oportunidade de uso das infraestruturas passivas e/ou fibras disponíveis nas 26 capitais: para tanto encaminhou carta consulta às prefeituras e governos estaduais solicitando manifestação quanto ao interesse e disponibilidade de fornecimento.
- ✓ Até o momento as prefeituras de São Paulo, São Luis, Fortaleza, Florianópolis, João Pessoa e governos da Paraíba, Sergipe, Rondônia e Goiás responderam e solicitaram mais informações
- ✓ Pontos de atenção no cenário de compartilhamento de infra/F.O. com os governos municipais e/ou estaduais com potencial de impacto no prazo de entrega do Edital devido à ausência de:
 - informações técnicas detalhadas
 - condições comerciais definidas
 - instrumentos contratuais aprovados



Além das informações contidas no *slide* acima, o **Sr. Leandro Guerra** fez os seguintes destaques:

Item	Descrição
	1) Ressaltou que o início das tratativas para uso da infraestrutura passiva seriam com as operadoras que têm Poder de Mercado Significativo (PMS) com consulta no SNOA que já seria de acesso pela entidade; 2) Destacou a importância do conceito de cessão dessas obrigações para a Telebrás, afirmando que isso gera uma OPEX e que depois a Telebrás terá que essa OPEX, em função da definição do próprio Decreto, após a conclusão dos trabalhos da EAF. Informou que o contrato será assinado com os detentor infraestrutura já com a Telebrás como ente e com esse conceito de cessão; 3) Destacou que evoluíram muito com a V.Tal, uma vez que ela é a detentora da maior parte da infraestrutura passiva como PMS nas capitais, com a ex São Paulo; 4) Registrou que Brasília estaria fora da avaliação da oportunidade de uso das infraestruturas passivas e/ou fibras ópticas, haja vista que ela estaria bem r para infraestrutura passiva a ser utilizada da própria Telebrás. Após relatar os pontos de atenção relacionados no <i>slide</i> acima que poderiam impactar o prazo de entrega previsto no Edital, o Sr. Leandro Guerra Cronograma da Rede Privativa Fixa em relação aos 320 pontos nas 27 capitais:

6. Rede Privativa Fixa – Cronograma ref. 320 Pontos nas 27 capitais

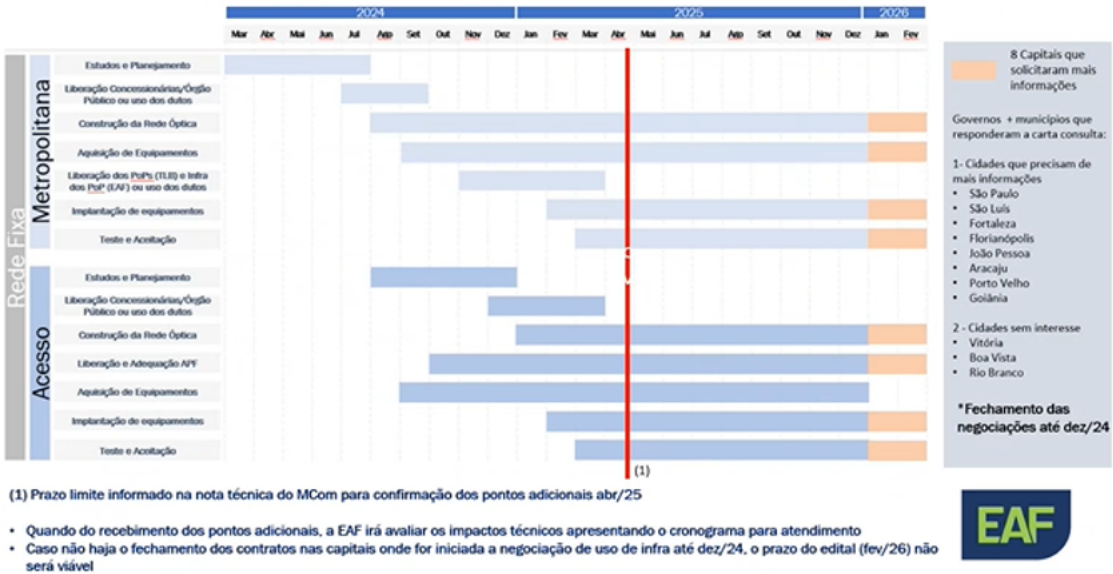

Em relação ao cronograma em tela, o **Sr. Leandro Guerra** fez os seguintes destaques:

- 1) Destacou que a primeira fase, Fase 0, tem o prazo informado na Nota Técnica do Ministério das Comunicações para os 320 pontos nas 27 capitais;
- 2) Informou que começariam uma negociação com as 8 cidades destacadas na tabela à direita (São Paulo, São Luís, Fortaleza, Florianópolis, João Pessoa, Porto Velho e Goiânia) com o Governo ou a Prefeitura e que o impacto disso poderia levar à fevereiro de 2026, sendo que, nas outras cidades, estariam pr quanto à Rede Fixa, para terminar no mês de dezembro de 2025;
- 3) Com isso, afirmou que haveria uma necessidade de fechar uma negociação com esses 8 municípios até o mês de dezembro de 2024, para poder atender : final do Edital, registrando que, na medida em que essa negociação com as 8 cidades evoluir, a EAF deve trazer alguma notícia no próximo mês so assunto, visto que, em determinado momento, poderão ter que tomar alguma decisão no sentido de continuar com a negociação, porém, impactando em f de 2026, ou abandonar a negociação e focar na infraestrutura das PMS que dará mais velocidade na execução para poder atender ao cronograma; e
- 4) Registrou que um ponto importante da Nota Técnica do Ministério das Comunicações é que também projeta para o mês de abril de 2025 a confirma pontos adicionais, visto que, no momento, estariam falando dos 320 pontos da primeira etapa, ressaltando que o projeto é muito maior, contando co pontos. Reforçou, portanto, que seria muito importante que, na medida em que tiverem a definição dos outros pontos, recebam essa informação o quanto ar que a EAF possa ter uma avaliação mais concreta, em termos de impacto técnico e de cronograma do atendimento desses pontos que ainda serão informado
- Com relação à Rede Privativa de Governo - Rede Móvel, o **Sr. Leandro Guerra** exibiu o *slide* abaixo e, do mesmo modo, realizou a leitura das informaç contidas:

Item	Descrição																																																																
	5) Alertou que, projetando os prazos que a entidade tem com o próprio mercado, a entrega possível para fevereiro de 2026, ou seja, dentro do prazo do Edital, leva a entidade a uma definição praticamente concomitante de entrega de material entre as Fases 1 e 2. Salientou que esses prazos seriam uma projeção e devem evoluir ao longo do tempo e que, mensalmente, a entidade deve trazer esse Cronograma para que o Grupo possa acompanhar, mas que aqui já há um ponto de atenção em relação à execução do prazo do Edital em função da própria Fase 2, visto que haveria um prazo mínimo para disparar o projeto que do mês de fevereiro de 2025. Ato contínuo, o Sr. Leandro Guerra destacou a questão da Criptografia, projetando o <i>slide</i> abaixo reproduzido e realizando a leitura de suas informações: 6. Rede Privativa de Governo – Criptografia ✓ EAF / ABIN / MCom / Coordenador GT Redes vem realizando reuniões semanais visando: I. Definição do modelo de contratação II. Minuta de contrato a ser utilizada III. Escopo/ especificação/detalhamento técnico do produto IV. Plano de trabalho/desenvolvimento do produto V. Cronograma físico /financeiro ✓ Com a especificação/detalhamento técnico do objeto a ser contratado (item III) a EAF irá a mercado obter valores base para contratação  Por fim, o Sr. Leandro Guerra passou para o sétimo e último item de sua agenda, <u>Compras e Financeiro</u>, concedendo a palavra ao Sr. Paulo Roberto Cozza para realizar a apresentação das compras em andamento e o resultado financeiro do terceiro trimestre de 2024. O Sr. Paulo Roberto Cozza cumprimentou a todos membros e deu início à sua apresentação com o tema <u>Compras</u>, e afirmou que, como de costume, a EAF tem trazido os principais processos de compras que serão levados para aprovação em AGE, exibindo o seguinte <i>slide</i> sobre as compras referentes à Rede Privativa e às Infovias e ressaltando que, tão logo obtenham as aprovações na AGE, serão concluídas as negociações finais para fazer adjudicação dos fornecedores: 7. Compras Processos Rede Privativa e Infovias <table><tr><th colspan="4">Em Aprovação para Adjudicação - Rede Privativa do Governo</th></tr><tr><th>Aditivo ao EAF_22_0201</th><th>Processos</th><th>Serviço de Gestão (Fixa)</th><th></th></tr><tr><td></td><td>EAF_24_50 e EAF_24_054</td><td>Serviço de Gestão operacional (Manutenção e Monitoramento)</td><td>R\$ 51.000.000,00</td></tr><tr><th colspan="4">Em Aprovação para Adjudicação - Rede Privativa do Governo</th></tr><tr><th>Novo Contrato</th><th>Processos</th><th>Locação de Postes (Fixa)</th><th></th></tr><tr><td></td><td>EAF_24_50 e EAF_24_054</td><td>Serviço de Gestão da Infraestruturas das Redes (aluguel dos pontos de fixação nos postes)</td><td>R\$ 23.000.000,00</td></tr><tr><th colspan="4">Em Aprovação para Adjudicação - Rede Privativa do Governo</th></tr><tr><th>Aditivo ao EAF_22_0201</th><th>Processos</th><th>Infraestrutura APFs (Fixa)</th><th></th></tr><tr><td></td><td>EAF_24_72 e EAF_24_076</td><td>Serviço e material para adequação da infraestrutura para os pontos de atendimento da Administração Pública Federal (APFs)</td><td>R\$ 99.000.000,00</td></tr><tr><th colspan="4">Em Aprovação para Adjudicação - Rede Privativa do Governo</th></tr><tr><th>Novo Contrato</th><th>Processos</th><th>Solução de Rede Móvel</th><th></th></tr><tr><td></td><td>EAF_24_085</td><td>MCPTX Plataforma de Missão Crítica</td><td>R\$ 99.000.000,00</td></tr><tr><th colspan="4">Em Aprovação para Adjudicação - Infovias</th></tr><tr><th>Aditivo ao EAF_23_067</th><th>Processos</th><th>Serviço de armazenagem e lançamento de cabos</th><th></th></tr><tr><td></td><td>EAF_24_010 e EAF-24_040</td><td>Aditivo Contratual para armazenagem e mobilização e para lançamento de cabos</td><td>R\$ 22.000.000,00</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL A APROVAR E ADJUDICAR</td><td>R\$ 294.000.000,00</td></tr></table>  Em seguida, o Sr. Paulo Roberto Cozza passou para o tema <u>Financeiro</u>, projetando um <i>slide</i> sobre as Demonstrações Financeiras do Terceiro Trimestre de 2024, na forma em que é prevista na Lei nº 6.404, registrando que essas informações ainda serão auditadas, no final do ano, pela <i>Ernst & Young</i>, e que o quadro abaixo comparativo entre setembro de 2024 e setembro de 2023:	Em Aprovação para Adjudicação - Rede Privativa do Governo				Aditivo ao EAF_22_0201	Processos	Serviço de Gestão (Fixa)			EAF_24_50 e EAF_24_054	Serviço de Gestão operacional (Manutenção e Monitoramento)	R\$ 51.000.000,00	Em Aprovação para Adjudicação - Rede Privativa do Governo				Novo Contrato	Processos	Locação de Postes (Fixa)			EAF_24_50 e EAF_24_054	Serviço de Gestão da Infraestruturas das Redes (aluguel dos pontos de fixação nos postes)	R\$ 23.000.000,00	Em Aprovação para Adjudicação - Rede Privativa do Governo				Aditivo ao EAF_22_0201	Processos	Infraestrutura APFs (Fixa)			EAF_24_72 e EAF_24_076	Serviço e material para adequação da infraestrutura para os pontos de atendimento da Administração Pública Federal (APFs)	R\$ 99.000.000,00	Em Aprovação para Adjudicação - Rede Privativa do Governo				Novo Contrato	Processos	Solução de Rede Móvel			EAF_24_085	MCPTX Plataforma de Missão Crítica	R\$ 99.000.000,00	Em Aprovação para Adjudicação - Infovias				Aditivo ao EAF_23_067	Processos	Serviço de armazenagem e lançamento de cabos			EAF_24_010 e EAF-24_040	Aditivo Contratual para armazenagem e mobilização e para lançamento de cabos	R\$ 22.000.000,00	TOTAL A APROVAR E ADJUDICAR			R\$ 294.000.000,00
Em Aprovação para Adjudicação - Rede Privativa do Governo																																																																	
Aditivo ao EAF_22_0201	Processos	Serviço de Gestão (Fixa)																																																															
	EAF_24_50 e EAF_24_054	Serviço de Gestão operacional (Manutenção e Monitoramento)	R\$ 51.000.000,00																																																														
Em Aprovação para Adjudicação - Rede Privativa do Governo																																																																	
Novo Contrato	Processos	Locação de Postes (Fixa)																																																															
	EAF_24_50 e EAF_24_054	Serviço de Gestão da Infraestruturas das Redes (aluguel dos pontos de fixação nos postes)	R\$ 23.000.000,00																																																														
Em Aprovação para Adjudicação - Rede Privativa do Governo																																																																	
Aditivo ao EAF_22_0201	Processos	Infraestrutura APFs (Fixa)																																																															
	EAF_24_72 e EAF_24_076	Serviço e material para adequação da infraestrutura para os pontos de atendimento da Administração Pública Federal (APFs)	R\$ 99.000.000,00																																																														
Em Aprovação para Adjudicação - Rede Privativa do Governo																																																																	
Novo Contrato	Processos	Solução de Rede Móvel																																																															
	EAF_24_085	MCPTX Plataforma de Missão Crítica	R\$ 99.000.000,00																																																														
Em Aprovação para Adjudicação - Infovias																																																																	
Aditivo ao EAF_23_067	Processos	Serviço de armazenagem e lançamento de cabos																																																															
	EAF_24_010 e EAF-24_040	Aditivo Contratual para armazenagem e mobilização e para lançamento de cabos	R\$ 22.000.000,00																																																														
TOTAL A APROVAR E ADJUDICAR			R\$ 294.000.000,00																																																														

Item

Descrição

7. Financeiro

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 3º TRI/2024

R\$ mil			
ATIVO			
Grupos Contábeis	Set/24	Set/23	Varição
Caixa e bancos	1	2	(1)
Aplicações financeiras	4.921.980	6.411.788	(1.489.808)
Impostos a recuperar	197.665	110.236	87.429
Adiantamentos	89.660	54.575	35.084
Estoques	435.209	281.107	154.102
Outros ativos circulantes	222	994	(772)
Ativo Circulante	5.644.736	6.858.702	(1.213.966)
IR Diferido	835	0	835
Imobilizado	2.021	1.825	196
Ativo Não Circulante	2.857	1.825	1.031
ATIVO TOTAL	5.647.593	6.860.527	(1.212.934)
PASSIVO			
Grupos Contábeis	Set/24	Set/23	Varição
Pessoal e encargos a pagar	26.476	13.197	13.279
Tributos	175.201	123.604	51.597
Fornecedores	330.892	323.445	7.447
Passivo Circulante	532.569	460.246	72.323
Projetos a Realizar	3.901.644	5.591.036	(1.689.392)
Passivo Não Circulante	3.901.644	5.591.036	(1.689.392)
Superávit acumulado em exercícios anteriores	928.271	369.687	558.583
Superávit acumulado no exercício atual	285.110	439.558	(154.449)
Patrimônio Social	1.213.380	809.246	404.135
PASSIVO TOTAL	5.647.593	6.860.527	(1.212.934)

R\$ mil			
DRE			
Grupos Contábeis	Set/24	Set/23	Varição
Receita Operacional Líquida	1.191.102	773.679	417.423
Custos dos produtos entregues	(335.050)	(274.150)	(60.899)
Despesas com pessoal	(34.401)	(26.675)	(7.727)
Armazenagem e frete	(23.034)	(25.749)	2.716
Custos de instalação	(512.445)	(279.219)	(233.226)
Consultoria e auditoria	(8.039)	(3.086)	(4.954)
Publicidade	(132.963)	(111.969)	(20.994)
Call center	(106.070)	(32.795)	(73.276)
Outras despesas operacionais	(39.100)	(20.036)	(19.063)
Custos e Despesas Operacionais	(1.191.102)	(773.679)	(417.423)
Resultado Operacional	0	0	(0)
Resultado Financeiro	433.069	639.912	(60.899)
IRPJ e CSLL	(147.999)	(200.353)	52.394
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	285.110	439.558	(8.505)

Balanco	(-) NFs já lançadas	Saldo	
Adiantamentos	89.660	-70.632	19.028
Fornecedores	330.892	-70.632	260.260

Meiora no custo de frete e armazenagem em função da descentralização dos CDs (apesar do aumento do volume de kits transportados):

2023 (jan a set) - 1.456k

2024 (jan a set) - 2.168k

+ 49%

Sobre o *slide* acima, o **Sr. Paulo Roberto Cozza** destacou apenas os principais itens abaixo relacionados, registrando sempre os valores constantes nos 1º e 2º trimestres de 2023 e de 2024:

- 1) A respeito das aplicações financeiras, afirmou que tiveram um desembolso de caixa durante esse ano;
- 2) Quanto ao crescimento de estoque, que ele estaria relacionado aos gastos com as Infovias e aos kits do projeto TVRO;
- 3) Sobre os aportes, informou que houve uma baixa; e
- 4) Registrou que houve melhoras nos custos de armazenagem e frete, com uma economia de quase 10 milhões, em virtude de ter constituído um CD em Manaus, o que ajudou a reduzir muito o custo do frete, ressaltando que, mesmo transferindo um volume maior de kits para todos os estados, houve a redução do custo total, tanto em relação à armazenagem quanto ao frete, com um ganho na ordem de 49%.

Ato contínuo, o **Sr. Paulo Roberto Cozza** passou a reportar informações sobre os resultados do Terceiro Trimestre de 2024 e os valores para cada um dos meses, exibindo o *slide* abaixo, ocasião em que também deu destaque às principais variações, conforme registrado à direita:

7. Financeiro

RESULTADO 3ºTRI/2024

	Orçado YTD SET/24	YTD SET/24	Varição	YTD SET/23
Receita Diferida Líquida	1.392	1.225	(167)	773
TVRO	1.360	1.223	(136)	737
FSS	2	2	(0)	36
PAIS	0	0	0	0
REDE PRIVATIVA	0	0	0	1
Custo	(1.181)	(1.046)	134	(627)
TVRO	(1.179)	(1.044)	134	(592)
FSS	(2)	(2)	0	(14)
PAIS	0	(0)	(0)	(0)
REDE PRIVATIVA	0	(0)	(0)	(1)
Despesas	(211)	(179)	32	(146)
Compliance e Governança	(17)	(6)	2	(9)
Comunicação	(163)	(140)	23	(119)
Corporativa	(30)	(25)	5	(18)
Genial	(11)	(8)	3	(8)
Outros	0	(0)	(0)	0
Resultado Operacional	0	0	0	0
Resultado Financeiro	312	429	121	639
IRPJ e CSLL	(100)	(148)	12	(219)
Resultado do Exercício	151	285	134	440
ESTOQUE EM CONSTRUÇÃO	Orçado YTD SET/24	YTD SET/24	Varição	YTD SET/23
TOTAL	509	54	(455)	112
PAIS	305	40	(325)	100
REDE PRIVATIVA	144	14	(131)	6
ATIVO FIXO	Orçado YTD SET/24	YTD SET/24	Varição	YTD SET/23
TOTAL	1	0	(1)	2
ADMINISTRATIVO	1	0	(1)	2

Principais Variações

- TVRO (economia de = R\$ 134 Milhões):
 - Custo médio (Custo Produtos + Instalações + Logística)
 - Estimado = R\$ 477
 - Realizado = R\$ 393 (-18%)
 - Instalações
 - Estimado = 2.025k
 - Realizado = 2.209k (+9%)
 - Redução - 97MM
- Call center - 6 MM
- Imposto - 28 MM
- Pessoal - 2 MM
- Resultado Financeiro - melhora em função de não realização do caixa projetado e das melhores taxas de aplicação negociadas:
 - Estimado 0,80% em
 - Realizado 0,89% em (média)
- PAIS
 - Infovia 02 - Aguardando melhora nas condições dos rios
 - Infovia 05 - ERA/EVR em andamento
 - Infovias 06 e 08 - Aguardando melhora nas condições dos Rios para realizar o ERA/EVR
- Rede Privativa - em processo de RFP



Além das informações contidas no *slide* acima, o **Sr. Paulo Roberto Cozza** fez os seguintes destaques:


- 1) TVRO: informou que conseguiram trabalhar melhor os custos das compras dos kits, bem como os custos de logística, armazenagem, frete e instalação, com economia de 18%, resultando em uma redução em 97 milhões. Registrou que a redução nos impostos teria ocorrido em virtude da abertura dos CDs. Em relação à redução das despesas administrativas totais, destacou que se trata das despesas que são rateadas entre os projetos, cujo rateio será mostrado mais adiante;
- 2) PAIS: informou que o gasto a menor se deu em virtude das questões por ela apontadas sobre as Infovias 02, 05, 06 e 08, e ressaltou que houve a contratação de cabos que estava prevista no contrato com a HMN, mas como a empresa ainda não apresentou as garantias exigidas, os pagamentos ainda não foram realizados, informando que estaria em processo de acompanhamento.

Na sequência, o **Sr. Paulo Roberto Cozza** projetou o *slide* abaixo reproduzido para expor as informações a respeito do rateio e consumo de cada um dos projetos.

Item	Descrição
------	-----------

7. Financeiro

RATEIO E CONSUMO DO PROJETO

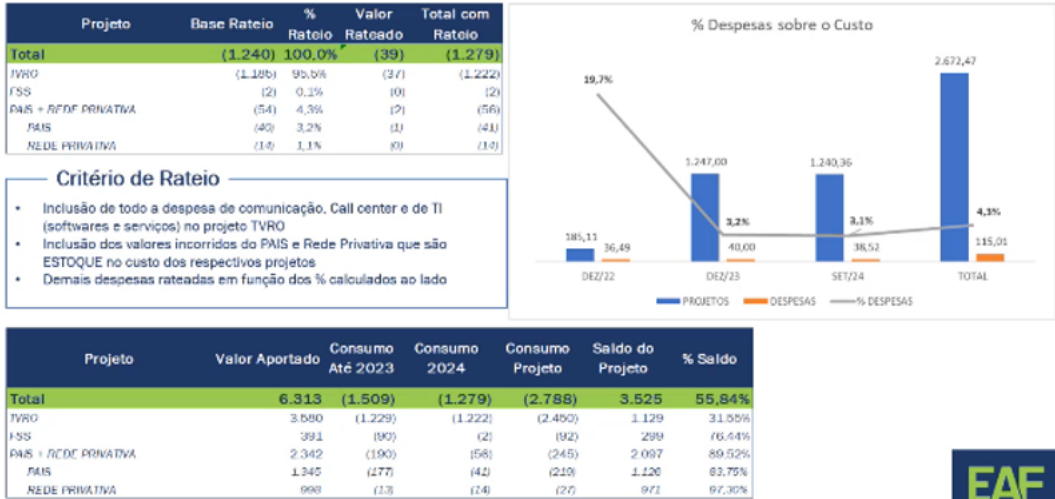


Ainda nesse tema, o **Sr. Paulo Roberto Cozza** relembrou, de início, que as partes de comunicação, *Call Center* e TI são específicas do projeto TVRC incorporadas diretamente nesse projeto, e os demais custos são rateados entre todos os projetos. Informou que o gráfico acima à direita apresenta o im rateio no custo total gasto e registrou os percentuais constantes da curva em cinza desde 2022 até o presente momento, bem como o total acumulado. destacou o saldo de cada um dos projetos com relação ao valor aportado e constantes da tabela inferior do *slide* acima.

Em seguida, o **Sr. Paulo Roberto Cozza** projetou o *slide* a seguir transcrito que apresenta o Fluxo de Caixa do Terceiro Trimestre de 2024, destac principais informações nele contidas e reiterando que os impactos aqui contidos são basicamente os mesmos impactos já mencionados por ele anteriorme relação a cada um dos projetos:

7. Financeiro

FLUXO DE CAIXA 3ºTRI/2024

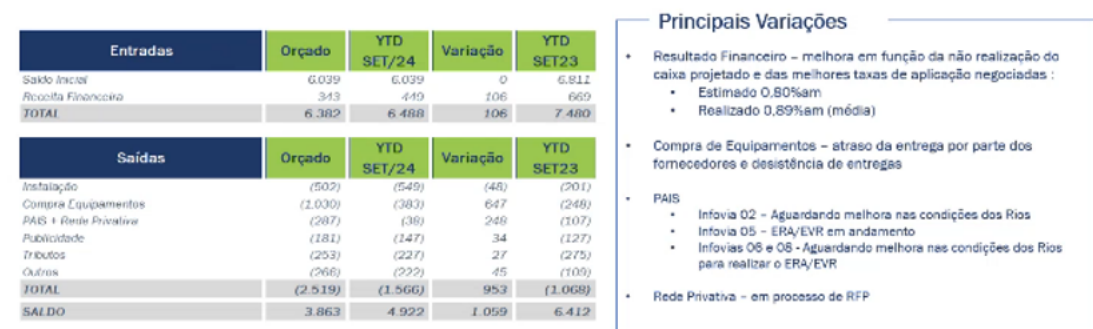

Finalmente, o **Sr. Paulo Roberto Cozza** passou a informar sobre as aplicações financeiras, nos termos do *slide* abaixo transcrito, destacando as observações descritas:

Item	Descrição
	Relato das atividades do GT-Migração/Mitigação Reunião do Grupo 9ª reunião GT-Migração/Mitigação – realizada em 25/10/2024 Assuntos tratados na reunião ordinária do GT - Instalação de 4M de TVRO na Banda Ku (data base: 21/10/2024) - Proposta de antecipação de 189 municípios - Relatórios EAF - 53500.077583/2024-78: todos aptos à antecipação. TODOS os municípios dos Estados do Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte - totalizando 26 UFs. - Faltam 190 municípios da Bahia - Total de 5.380 Municípios liberados. - Proposta de prorrogar por mais 90 dias da distribuição de Kit TVRO na Banda Ku, conforme item 6.2 do Anexo IV-A. 31/03/2025 + 90 dias => 29/06/2025  

Sobre os assuntos tratados na 9ª reunião do **GT-MIGRAÇÃO**, o **Sr. Takeshi Ikeda** destacou que, além da proposta de antecipação de 189 municíj discutida no grupo a proposta de prorrogar por mais 90 (noventa) dias o prazo para distribuição de kit TVRO na Banda Ku, cujo termo final estabelecido 6.2 do Anexo IV-A é dia 31 de março de 2025 e com a proposta discutida passaria para o dia 29 de junho de 2025.

Em seguida, o **Sr. Takeshi Ikeda** projetou o *slide* a seguir reproduzido que mostra todas as fases e, quanto à Fase 6, registrou que faltam apenas 379 mu destacado em amarelo:



Na sequência, o **Sr. Takeshi Ikeda** exibiu o *slide* abaixo, destacando as informações nele contidas em relação à Fase 6-E, com os 189 municípios liberados de outubro; bem como o mapa do Brasil acima que mostra as Fases 5 e 6 e o mapa do Brasil abaixo que mostra os estados faltantes da Fase 6 (Bahia, Pern; Ceará e Rio Grande do Norte):

Item

Descrição

Relato das atividades do GT-Migração/Mitigação




FASE	MÊS DE LIBERAÇÃO	ESTADOS LIBERADOS	QUANTIDADE MUNICÍPIOS	
FASE 5 A	abr/24	MA; ES; SE	220	✓
FASE 5 B	mai/24	PB; RO; TO	236	✓
FASE 5 C	jun/24	AC; AM; GO	168	✓
FASE 6 A / 6 B	jul/24	MS	506	✓
FASE 6 C	ago/24	MT; PA; PI	194	✓
FASE 6 D	set/24	MG	189	✓
FASE 6 E	out/24	CE; RN; PE	189	✓
FASE 6 F	nov/24	BA	190	✓



Municípios com 5G liberado (4.134 até Maio/24)

Municípios liberados na Fase 5 C

Municípios sendo liberados na fase 6

Com o intuito de detalhar a Fase 6-E e 6-F, o **Sr. Takeshi Ikeda** projetou o *slide* abaixo reproduzido, que mostra o mapa do Brasil nessas fases:



Ato contínuo, o **Sr. Takeshi Ikeda** exibiu um gráfico que mostra a evolução da liberação da faixa de 3,5 GHz, destacando as informações nele contidas:

Item	Descrição
------	-----------



Ainda nesse contexto, o **Sr. Takeshi Ikeda** finalizou a sua apresentação exibindo o gráfico abaixo que mostra a população nesses municípios:



Concluída a apresentação, o **Secretário Executivo do GAISPI** questionou aos membros do GAISPI se possuíam alguma dúvida em relação ao apresentado.

Não havendo manifestações, o **Secretário Executivo do GAISPI** passou para o item 4 da Pauta.

4	O Secretário Executivo do GAISPI registrou que, conforme apresentado pelo Sr. Takeshi Ikeda, Coordenador do GT-MIGRAÇÃO, os requisitos permitem deliberar a antecipação da liberação da faixa de 3,5 GHz em mais 189 cidades foram atingidos. Prosseguiu afirmando que, de acordo com o item Anexo IV do Edital e a alínea “q” do item 9 do Anexo IV-A do Edital, caberia ao GAISPI decidir se o início do uso da faixa de 3,5 GHz poderá ser ant individualmente por município ou em polígonos. O Secretário Executivo do GAISPI, dessa forma, considerando o exposto, colocou em deliberação a proposta de antecipação da liberação do uso da radiofrequências de 3.300 MHz a 3.700 MHz a partir do dia 04 de novembro de 2024 nas 189 cidades, questionando aos membros do GAISPI se estariam acordo com a proposta. Não havendo manifestações, o Secretário Executivo do GAISPI declarou que fica aprovada a antecipação da liberação do uso da faixa de 3.300 MHz a partir do dia 04 de novembro de 2024 nas 189 novas cidades já apresentadas. Também determinou que a Secretaria Executiva do GAISPI anexasse dessas cidades à Ata da presente Reunião. Na sequência, o Secretário Executivo do GAISPI ressaltou que, com a presente deliberação, todos os municípios dos estados do Ceará, Pernambuco Grande do Norte foram liberados, totalizando 26 estados brasileiros completamente liberados. Informou que, até o momento, já contam com 5.380 municípios liberados para utilização da faixa de 3,5 GHz por estações do 5G <i>standalone</i>, e que, com população dessas cidades totaliza aproximadamente 210 milhões de brasileiros, representando pouco mais de 98% da população brasileira que, agora potencial de atendimento pelas prestadoras, nos prazos que seus modelos estratégicos e de investimentos considerarem mais oportunos. Finalmente, o Secretário Executivo do GAISPI registrou que é importante lembrar que essas antecipações em nada alteram o cronograma de atendimento obrigações de instalação de ERBs, que continua como previsto no Edital, tanto para cidades maiores quanto para as de menor população. Concluída a deliberação, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 5 da Pauta.
5	O Secretário Executivo do GAISPI propôs, conforme apresentado pelo Sr. Takeshi Ikeda, Coordenador do GT-MIGRAÇÃO, a prorrogação por (noventa) dias para a distribuição do kit de recepção de TV aberta na Banda Ku, conforme previsto no item 6.2. do Anexo IV-A do Edital.

Item	Descrição
	O Secretário Executivo do GAISPI, desta forma, considerando o exposto, colocou em deliberação a proposta de prorrogação por mais 90 (noventa) dias, do dia 31 de março de 2025, considerando que a transmissão simultânea da Banda C ocorrerá até 31 de dezembro de 2024, nos termos estabelecidos na Anatel nº 2652/2023, questionando aos membros do GAISPI se estariam todos de acordo com a proposta. Não havendo manifestações, o Secretário Executivo do GAISPI declarou que fica aprovada a prorrogação por mais 90 (noventa) dias a contar do dia 31 de 2025 para a distribuição do kit de recepção de TV aberta na Banda Ku. Solicitou à Secretaria Executiva do GAISPI que providenciasse a elaboração da Portaria de aprovação para assinatura. Concluída a deliberação, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 6 da Pauta.
6	O Secretário Executivo do GAISPI concedeu a palavra à Sra. Paula Fontelles do Valle, Coordenadora do GT-F, para que fizesse um breve relato das atividades no âmbito do GT. A Sra. Paula Fontelles do Valle cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e, antes de dar início à apresentação sobre o relato das atividades do GT-F, concedeu a palavra ao Sr. Leandro Guerra que, por sua vez, reforçou a relevância da prorrogação do prazo deliberado no item anterior da Pauta, ponto de vista de planejamento da EAF, que deve considerar o processo de logística que envolve toda a cadeia de fornecedores e os contratos estabelecidos, portanto, deve ser realizado com antecedência. O Secretário Executivo do GAISPI retomou a palavra e ressaltou a importância da deliberação ocorrida na presente Reunião Ordinária para a previsibilidade e planejamento aos trabalhos da EAF. O Sr. Takeshi Ikeda também se manifestou para enfatizar que a sobredita prorrogação facilitará a programação financeira e logística para garantir a concretização e segurança da EAF de tal política pública. Dando continuidade ao Informe do GT-F, a Sra. Paula Fontelles do Valle reportou que o grupo realizou a sua 15ª Reunião Ordinária no último dia 24 de outubro, cujo foco principal foi a apresentação pela EAF do Resultado financeiro do 3º Trimestre deste ano. Sobre esse Resultado, destacou os principais pontos elencados, a partir do relato detalhado realizado pelo Sr. Paulo Roberto Cozza na presente Reunião Ordinária: 1) Em relação ao projeto TVRO, reportou que as demonstrações financeiras do 3º Trimestre de 2024 mostraram uma economia de aproximadamente 134 milhões de reais em relação ao valor orçado. Ressaltou que esse fato se deu, principalmente, em virtude da redução do custo de frete e armazenagem ocasionada pela descentralização dos Centros de Distribuição (CD), o que possibilitou a diminuição das distâncias e, consequentemente dos custos de frete e com o pagamento de impostos, ainda que tenha havido um aumento no volume de kits transportados neste período; 2) No quesito rentabilidade, informou que o resultado financeiro do 3º Trimestre de 2024 apresentou uma melhoria, em razão de dois motivos: a primeira foi o rendimento ter sido maior do que a prevista no orçamento de 2024, bem como a um fluxo de caixa maior do que estava orçado, já que não ocorreram os gastos com os projetos PAIS e Rede Privativa tal como esperado; 3) Sobre os gastos com os projetos PAIS e Rede Privativa explicou que ele estariam, de certo modo, paralisados, pois, para algumas infovias, aguarda-se a melhoria das condições de navegabilidade dos rios e, para a Infovia 04, aguarda-se a licença do DNIT para dar continuidade à parte terrestre dessa infraestrutura, quanto à Rede Privativa, a maioria dos processos de RFP estariam em fase de negociação; 4) No tocante ao rateio dos custos administrativos entre os projetos, mencionou que a EAF apresentou um histórico desse rateio sobre a despesa total dos projetos com dados listados a partir de dezembro de 2022 até setembro de 2024, para garantir um melhor acompanhamento do tema; e 5) Por fim, fez um último destaque no tocante às aplicações financeiras, para informar que a média de rendimento, neste ano, foi de aproximadamente 10% CDI e o rendimento acumulado líquido das aplicações referente ao período de dezembro de 2022 a setembro de 2024 é de aproximadamente 1 bilhão e 100 milhões de reais. A Sra. Paula Fontelles do Valle prosseguiu reportando que, a pedido do Presidente do GAISPI, foi solicitado à EAF um estudo acerca das possibilidades de aperfeiçoamento da política de investimentos da entidade para garantir melhores taxas de retorno dos investimentos realizados, o qual será objeto de uma reunião extraordinária do GT-F a ser realizada no mês de novembro. Sobre as RFPs para a compra de equipamentos para a Rede Privativa, a Sra. Paula Fontelles do Valle registrou que estão sendo acompanhadas pelo GT em conjunto com o GT-REDE, com vistas a assegurar o bom andamento deste processo. Concluída a apresentação, o Secretário Executivo do GAISPI ressaltou a importância da inserção deste item na Pauta, especialmente no tocante ao pedido do Presidente do GAISPI para realização de estudos voltados à reavaliação da política de investimentos para melhoria da rentabilidade. Concedida a palavra, o Sr. Leandro Guerra ressaltou que os estudos voltados para a melhoria dos investimentos são bem-vindos e lembrou que a política de investimentos da EAF é baseada na maior segurança possível para o recurso, bem como na busca por aplicações mais conservadoras, dada a relevância para a execução das políticas públicas. Ressaltou, ainda, que a gestão financeira está sendo muito bem executada, conforme apresentado pelo Sr. Paulo Roberto Cozza, e que alinhará com o GT-F para a evolução do tema. Em seguida, o Secretário Executivo do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apresentado. Não havendo manifestações e considerando que neste item não haveria deliberações, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 7 da Pauta.
7	O Secretário Executivo do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Marcos Vieira Baeta Neves, em substituição ao Sr. Sidney Azeredo Nince, Coordenador do GT-PAIS, para que fizesse um breve relato sobre as atividades no âmbito do GT. O Sr. Marcos Vieira Baeta Neves cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e deu início à apresentação sobre o relato das atividades do PAIS informando que faria um resumo dos principais pontos abordados pela EAF na presente Reunião Ordinária. Nesse sentido, destacou os seguintes pontos: 1) No tocante à Infovia 02, para o trecho subaquático, a licença de instalação do Ibama foi emitida, e para o trecho terrestre, a licença do DNIT também foi emitida, aguardando-se, assim, as condições de navegabilidade para o lançamento, cuja previsão é janeiro de 2025. Ainda sobre a Infovia 02, reportou que o projeto de 5 Redes Metropolitanas foram concluídas; 2) Quanto à Infovia 04, Sr. Marcos Vieira Baeta Neves relatou que a licença de instalação do DNIT ainda não foi emitida, tendo sido iniciada a instalação urbana na cidade de Caracará, e o Termo de Declaração e Entrega está em fase de elaboração; 3) Sobre a Infovia 03, o Sr. Marcos Vieira Baeta Neves reportou que o seu lançamento foi concluído e o anel principal da Rede Metropolitana de Infovias já foi finalizado e as ramificações e acessos estão em fase final. Além disso, informou que o Termo de Declaração e Entrega já foi encaminhado para o MCOM; e 4) Em seguida, o Sr. Marcos Vieira Baeta Neves declarou que, em virtude de o lançamento da Infovia 02 ter sido adiado, as atividades da EAF estão sendo transferidas para outras Infovias. Informou, ainda, que o Estudo de Viabilidade preliminar da Infovia 05 foi executado e o relatório está em análise e os dados da Infovia 05 estão em fase de execução, considerando as condições de navegabilidade e de infraestrutura da energia elétrica. Por fim, o Sr. Marcos Vieira Baeta Neves ressaltou a necessidade de realizar o procedimento para a integração das Infovias do PAIS com o PAC em Manaus, Vila de Moura e Tefé, com vistas a garantir a interoperabilidade de todos os trechos. Concluída a apresentação, o Secretário Executivo do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apresentado. Não havendo manifestações e considerando que neste item não haveria deliberações, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 8 da Pauta.
8	O Secretário Executivo do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Marcos Vieira Baeta Neves, Coordenador do GT-REDE, para que fizesse um breve relato das atividades.

Item	Descrição
	O Sr. Marcos Vieira Baeta Neves cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e deu início à apresentação sobre o relato das atividades REDE informando que a reunião do GT foi realizada no dia anterior a esta Reunião Ordinária, destacando os seguintes pontos: 1) O estudo e a negociação da EAF com a V.Tal para uso de dutos permitindo a redução de custos, de tempo custo de manutenção para a Telebrás; 2) Consulta às prefeituras e aos governos dos estados para cumprir a determinação do GAISPI de garantir a sobreposição. Relatou que levantaram, ainda, a da rede do SERPRO em Brasília. Explicou que foi feito um relatório pela CGU que está em análise no MCOM, não tendo havido novidades quanto ao and tendo recebido a explicação de que o trecho de sobreposição era num trecho bem reduzido na região do aeroporto, o que não seria um problema; 3) O prazo para a Telebrás informar os pontos está sendo acompanhado de perto para que responda com o maior número de pontos informados; 4) No tocante à Rede Móvel, o estudo da <i>Accenture</i> e os requisitos que serão finalizados e encaminhados à Telebrás em 1º de novembro para a contratação prestadoras para dar cumprimento ao produto 2 da Fase 1 e a própria Fase 2 estão sendo acompanhados de perto para garantir o cumprimento do cronogram 5) Houve uma discussão sobre cronograma que se apresenta bastante apertado (<i>sic</i>) com vistas a buscar a realização de atividades que possam ser execut paralelo para evitar impacto maior sobre o cronograma; e 6) Sobre a criptografia, estão sendo realizadas reuniões constantes para o alinhamento do contrato entre EAF e a ABIN para a celebração do contrato at deste ano. Concluída a apresentação, o Secretário Executivo do GAISPI questionou sobre o MCPTX e o Sr. Marcos Vieira Baeta Neves explicou, em síntese, qu do MCOM definiu duas redes lógicas: uma é o aplicativo a ser hospedado no <i>cloud</i> da SERPRO; e a outra é a plataforma que será instalada diretamente no Telebrás, voltada para serviço de comunicação crítica a ser utilizada pela Polícia Militar, Polícia Federal e Bombeiros. O Secretário Executivo do GAISPI questionou também sobre a entrega do aplicativo e o Sr. Marcos Vieira Baeta Neves informou que o cronograma discussão com a ABIN e o horizonte é para a entrega do primeiro produto viável para o mês que vem, que é o MVP. Contudo, informou que essa entrega da celebração do contrato da ABIN com a EAF. Finalmente, o Secretário Executivo do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apresentado. Não havendo manifestações e considerando que neste item não haveria deliberações, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 10 da Pauta.
9	RETIRADO DE PAUTA
10	O Secretário Executivo do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se possuíam outro assunto que quisessem tratar na presente Reunião. Não havendo manifestações, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 11 da Pauta.
11	O Secretário Executivo do GAISPI propôs que a próxima Reunião Ordinária do GAISPI seja realizada no dia 26 de novembro de 2024 (quarta-feira) às de forma remota, questionando aos membros do GAISPI se estariam todos de acordo com essa data. Não havendo manifestações, o Secretário Executivo do GAISPI declarou que fica definida a data da 34ª Reunião Ordinária do GAISPI para o di novembro de 2024 (quarta-feira) às 10:00h, de forma remota. Concluídos os assuntos constantes da Pauta, o Secretário Executivo do GAISPI agradeceu a presença e o empenho de todos os membros e declarou enc 33ª Reunião Ordinária do Grupo.

4. APROVAÇÃO

4.1. Segue a presente Ata de Reunião assinada eletronicamente pelos participantes acima identificados e aprovada na 34ª Reunião Ordinária do GAISPI, realizada em 26 de novembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Margaret de Almeida Cadête Moonsammy**, **Usuário Externo**, em 26/11/2024, às 12:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Neiva Melo**, **Cidadão**, em 26/11/2024, às 12:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Franco Costa de Alencar**, **Usuário Externo**, em 26/11/2024, às 14:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Emanuel de Azevedo Gonçalves**, **Usuário Externo**, em 26/11/2024, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <http://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **12901271** e o código CRC **04557BB9**.
