



## REGISTRO DE REUNIÃO

## GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DAS SOLUÇÕES PARA OS PROBLEMAS DE INTERFERÊNCIA NA FAIXA DE 3.625 A 3.700 MHZ - GAISPI

## ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GAISPI

Data	Horário de Início	Horário de Término	Local
24/05/2023	15:30	17:30	Remota

## 1. PARTICIPANTES

## 1.1. Membros do GAISPI:

FUNÇÃO	MEMBRO	NOME	Pre
Presidente do GAISPI	-	Moisés Queiroz Moreira	
Secretário Executivo do GAISPI	-	Vinícius Oliveira Caram Guimarães	
Representante do Ministério das Comunicações	Titular	Maximiliano Salvadori Martinhão	
	Suplente	Otávio Viegas Caixeta	
Representantes da Proponentes Vencedoras dos Lotes do Tipo B	Titular	Antônio Oscar de Carvalho Petersen	
	Suplente	Monique Pereira Ibitinga de Barros	
	Titular	Camilla Tedeschi de Toledo Tapias	
	Suplente	Anderson Emanuel de Azevedo Gonçalves	
	Titular	Mario Girasole	
	Suplente	Marcelo Concolato Mejias	
Representantes dos Radiodifusores	Titular	Flavio Ferreira de Lara Resende	
	Suplente	Cristiano Reis Lobato Flores	
	Titular	Márcio Silva Novaes	
	Suplente	Samir Amando Granja Nobre Maia	
	Titular	Luiz Carlos Abrahão	
	Suplente	Carlos Eduardo Neiva Melo	
Representantes das Exploradoras de Satélites	Titular	Lincoln Amazonas Antunes de Oliveira	
	Suplente	Michelle Machado Caldeira	
	Titular	Fabio Franco Costa de Alencar	
	Suplente	Luís Fernando Barros Costa Fernandes	
	Titular	Márcio André de Assis Brasil	
Representantes das Proponentes Vencedoras dos Lotes C1 a C8 e D1 a D32	Suplente	Rodrigo Soares Campos	
	Titular	José Roberto Nogueira	
	Suplente	Katia Costa da Silva Pedroso	
	Titular	Margaret de Almeida Cadête Moonsammy	
	Suplente	Wagner Zanini Barreira	
	Titular	Vítor Elísio Góes de Oliveira Menezes	
Suplente	Mariana Rezende		

## 1.2. Outros Participantes:

Nome	Órgão/Instituição/Empresa
Artur Coimbra de Oliveira	Conselheiro - Anatel
Cíntia da Conceição Landim	Anatel (terceirizada)
Henrique Gomes Pinheiro	Anatel/APC - GT-COM - Coordenador
Karine Medeiros Dias	Anatel
Lauro Leandro Rutkowski	Anatel
Leandro Enrique Lobo Guerra	EAF
Marcos Vinícius Ramos da Cruz	Anatel/SOR - Coordenador do GT-Rede
Marina Cruz Vieira Villela Soares	Anatel
Martim Jales Hon	Anatel
Oséias Fonseca de Aguiar	Anatel
Patrícia Abreu	EAF
Paula Fontelles do Valle	Anatel
Paulo Roberto Cruz Cozza	EAF
Renato Sales Bizerra Aguiar	Anatel
Ricardo Lavalle	Anatel
Sidney Azeredo Nince	Anatel/SOR - GT-Rede - Coordenador Pais
Silvio Starling	EAF
Takeshi Ikeda	Anatel/ORER - GT-Desocupação - Coordenador Substituto
Vanessa Cordeiro de Albuquerque	Anatel
Vanessa Correa de Souza	Anatel

## 1.3. Outros Participantes - Representante Excepcional:

Nome	Órgão/Instituição/Empresa
Heloísa Helena de Macedo e Almeida	Substituindo o representante Flávio Ferreira de Lara Resende

## 2. PAUTA


Item	Descrição
1	APROVAÇÕES DA ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2023 E DA ATA DA 17ª REUNIÃO, REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2023.
2	INFORME DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE ADMINISTRADORA DA FAIXA DE 3,5 GHz (EAF).
3 e 4	INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE MIGRAÇÃO DA BANDA KU – GT-MIGRAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE LISTA DE MUNICÍPIOS PARA AS ATIVIDADES DE MIGRAÇÃO /
5	INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE DESOCUPAÇÃO DO 3,5GHz E MITIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA – GT-DESOCUPAÇÃO.
6	DELIBERAÇÃO SOBRE A ANTECIPAÇÃO DE CIDADES PARA A LIBERAÇÃO DO USO DA FAIXA DE RADIOFREQUÊNCIAS DE 3.300 MHZ A 3.700 MHZ.
7	INFORME DO GRUPO TÉCNICO DO PROGRAMA AMAZÔNIA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL - GT-PAIS.
8	INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO - GT-COM.
9	OUTROS ASSUNTOS.
10	DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNHO DE 2023.

## 3. RELATO DA REUNIÃO

Item	Descrição
1	<p>Inicialmente, o <b>Presidente do GAISPI</b>, o <b>Sr. Moisés Queiroz Moreira</b>, deu boas-vindas e agradeceu a presença de todos, e, antes da deliberação sobre o 1 desta Pauta, concedeu a palavra ao <b>Secretário Executivo do GAISPI</b>, <b>Sr. Vinícius Oliveira Caram Guimarães</b>, que, por sua vez, informou a participação de representante excepcional, a <b>Sra. Heloísa Helena</b>, substituindo o representante <b>Sr. Flávio Lara</b>, e registrou que foi recebida a devida procuração para acatar a sua participação.</p> <p>Após a intervenção e seguindo para deliberação do item 1 desta Pauta, o <b>Presidente do GAISPI</b> informou que não foram recebidas solicitações ou manifestações sobre as minutas das Atas previamente circuladas. Desta forma, questionou aos presentes se haveria ajustes adicionais em relação às versões encaminhadas dos respectivos documentos.</p> <p>Não havendo manifestações, o <b>Presidente do GAISPI</b> declarou que ficam aprovadas as Atas da 8ª Reunião Extraordinária do GAISPI e da 17ª Reunião Ordinária do GAISPI e, ato contínuo, passou para o item 2 da Pauta.</p>

2	<p>O <b>Presidente do GAISPI</b> concedeu a palavra ao <b>Sr. Leandro Guerra</b> para que fizesse sua apresentação.</p> <p>O <b>Sr. Leandro Guerra</b> cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes e, em seguida, passou a projetar uma apresentação, cuja agenda do Informe das atividades da EAF abordou os seguintes itens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I – Status Migração TVRO, Desocupação e Mitigação FSS;</li> <li>II – Municípios com limpeza da faixa 3,5 GHz concluída;</li> <li>III – Fase 3: Cronograma Macro;</li> <li>IV – Planejamento Fase 4;</li> <li>V – Atendimento TVRO – Piloto <i>Whatsapp</i>;</li> <li>VI – Nova Etapa de Compras – TVRO;</li> <li>VII – Projeto PAIS; e</li> <li>VIII – Projeto Rede Privativa de Governo.</li> </ul>
---	---

Sobre o primeiro item, status da Migração TVRO, Desocupação e Mitigação FSS, o **Sr. Leandro Guerra** projetou o *slide* abaixo reproduzido que apresenta um gráfico atualizado, mostrando, fase a fase, a evolução da base de instalações de TVRO realizadas, isto é, da migração da banda Ku, e o acumulado de instalações até o dia 22 de maio de 2023, bem como o quantitativo mensal, e destacou os números nele contidos:

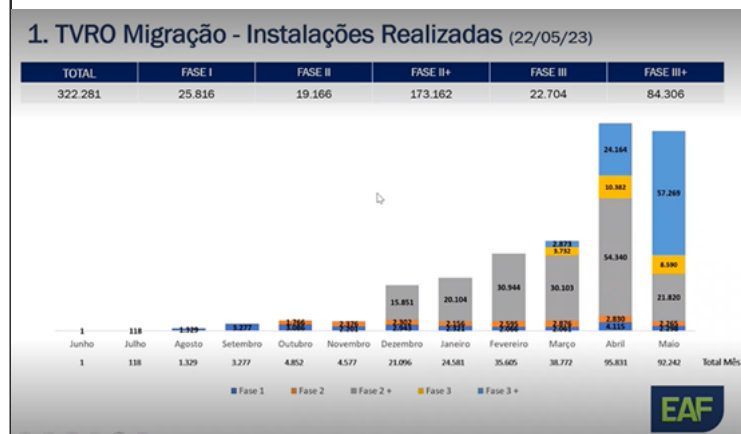


Ainda sobre as instalações realizadas, o **Sr. Leandro Guerra** informou que há um incremento significativo na medida em que avançam para o interior do Brasil e projetou o seguinte *slide*, com o intuito de mostrar o crescimento acumulado, mês a mês, até o dia 22 de maio de 2023, e destacou que a EAF tem uma projeção, considerando a média de instalações diárias, de chegar com mais de 350 mil instalações no final do mês de maio, o que representa um crescimento, em relação ao mês de abril, de aproximadamente 120 mil instalações, o que, em sua visão, é bem significativo e mostra o crescimento consistente em termos de instalação.

Item	Descrição
------	-----------




Nesse contexto, destacou mais uma vez o grande desafio que a EAF tem em virtude da logística, na medida em que se interioriza o projeto, ressaltando que a tendência realmente é o crescimento significativo da base de instalações, como se está observando da base instalada.

No tocante ao *status* da Mitigação FSS, o Sr. **Leandro Guerra** projetou o *slide* a seguir transcrito com o objetivo de mostrar um panorama da base na data de 19 de maio de 2023, destacando as informações nele contidas e reafirmando que o projeto está andando muito bem e bem avançado:

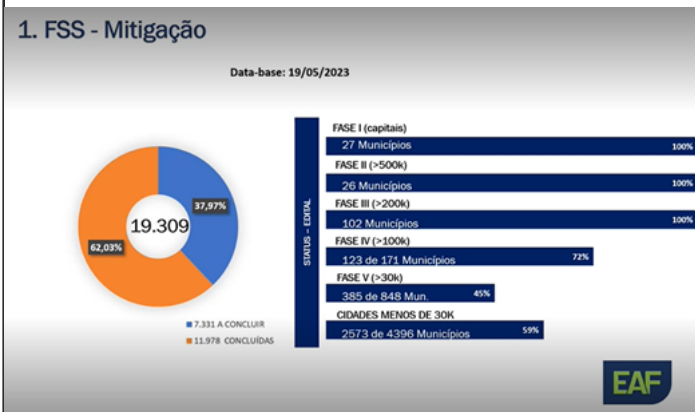

Em relação ao *status* da Desocupação FSS, o Sr. **Leandro Guerra** projetou o *slide* abaixo reproduzido e destacou as informações sobre o total de estações que já foram desocupadas em cada uma das fases do projeto:

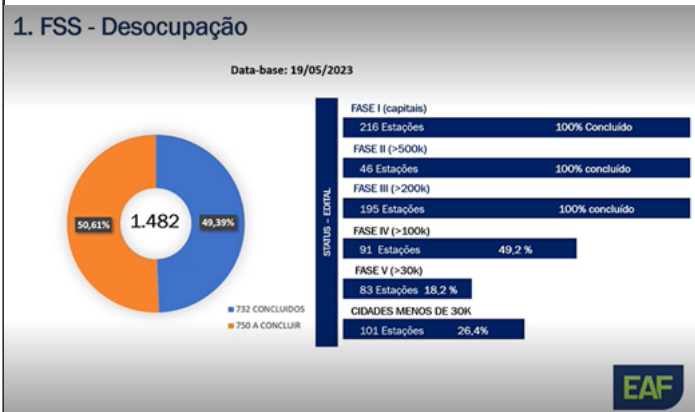

O Sr. **Leandro Guerra** informou que gostaria de destacar um ponto importante relacionado ao orçamento desses projetos de FSS no sentido que estaria bem controlado.

Na sequência, o Sr. **Leandro Guerra** passou a reportar as informações quanto ao segundo item de sua agenda que diz respeito aos municípios com limpeza da faixa de 3,5 GHz concluída e, para tanto, projetou o *slide* abaixo reproduzido que, por sua vez, apresenta uma figura que mostra os 459 municípios e citou as informações contidas nas seguintes tabelas, inclusive quanto ao perfil desses municípios e a localização nas 24 Unidades da Federação:

**Item**

**2. Municípios com limpeza de faixa concluída** (24/05/23)  
 459 municípios  
 desocupação e mitigação concluída (incluindo a franja de 20 km)  
 & instalação TVRO iniciada



Fase IV (>=100k)	Fase V (<=30k)	Pool 30k (<=30k)
10	20	429

**Descrição**

459

**Localidades**

AL	18
AP	2
BA	8
CE	16
ES	14
GO	2
MA	7
MG	35
MS	14
MT	3
PA	6
PB	19
PE	2
PI	2
PR	43
RJ	10
RN	9
RR	1
RS	71
SC	55
SE	3
SP	109
TO	14



Em seguida, o Sr. **Leandro Guerra** apresentou a lista dos 459 municípios, conforme slides a seguir transcritos:

**2. Municípios com limpeza de faixa concluída** (24/05/23)  
 459 municípios  
 desocupação e mitigação concluída (incluindo a franja de 20 km) & instalação TVRO iniciada

UF	Município	UF	Município	UF	Município	UF	Município	UF	Município
AL	Anadia	CE	Miramaia	MG	Caras Altas	MS	Dois Irmãos do Buriti	PB	São José dos Ramos
AL	Atalaia	CE	Palhano	MG	Cláudio	MS	Douradina	PB	São Miguel de Taipu
AL	Belém	CE	Santana do Acaraú	MG	Conceição das Alagoas	MS	Guia Lopes da Laguna	PB	São Sebastião de Lagoa de Roça
AL	Boca da Mata	CE	Senador Sá	MG	Conquista	MS	Itaporã	PB	Sobrado
AL	Coité da Néoa	CE	Tururu	MG	Comendação	MS	Jaraguari	PE	Lagoa Grande
AL	Craibas	CE	Umirim	MG	Coronel Fabriciano	MS	Nova Alencara do Sul	PE	Salinhaim
AL	Feira Grande	CE	Alfredo Chaves	MG	Corrego do Bom Jesus	MS	Novo Horizonte do Sul	PI	Bom Princípio do Piauí
AL	Floreiras	ES	Anchieta	MG	Cruzília	MS	Rochedo	PI	Parnaíba
AL	Igará	ES	Apiaçá	MG	Delta	MS	Terenos	PR	Assaí
AL	Jequiá da Praia	ES	Atílio Vivacqua	MG	Engenheiro Caldas	MS	Vicentina	PR	Antonga
AL	Junqueiro	ES	Bom Jesus do Norte	MG	Extrema	MT	Jaciara	PR	Bela Vista do Paraíso
AL	Lagoa da Canoa	ES	Castelo	MG	Fernandes Tourinho	MT	Porto Estrela	PR	Braganey
AL	Limoeiro de Anadia	ES	Iconha	MG	Fortaleza de Minas	MT	São Pedro da Cipa	PR	Carambei
AL	Maribondo	ES	Jerônimo Monteiro	MG	Glauceândia	PA	Barcarena	PR	Doutor Camargo
AL	Passo de Camaragibe	ES	Mimoso do Sul	MG	Gonçalves	PA	Bujaru	PR	Florentópolis
AL	São Luís do Quitunde	ES	Muriqui	MG	Jamperuca	PA	Inhangapi	PR	Guaraci
AL	São Sebastião	ES	Pitoma	MG	Mariana	PA	São Francisco do Pará	PR	Guaratuba
AL	Taquarana	ES	Presidente Kennedy	MG	Marilac	PA	São João da Ponta	PR	Itaipuândia
AP	Cutias	ES	Rio Novo do Sul	MG	Duro Preto	PA	Sapucaia	PR	Rambé
AP	Itambal	ES	Yaregem Alta	MG	Paranópolis	PA	Albandira	PR	Nutuaba
BA	Barro Preto	GO	Campo Alegre de Goiás	MG	Paraopeba	PB	Bala da Traição	PR	Jaguapitã
BA	Ilhéus	GO	Rio Quente	MG	Periquito	PB	Caaporã	PR	Jandaia do Sul
BA	São José da Vitória	MA	Cidelandia	MG	Peço de Caldas	PB	Carutubé	PR	Jataizinho
BA	Subaé	MA	Dominópolis	MG	Pratápolis	PB	Condô	PR	Kalene
CE	Alcântaras	MA	Governador Edison Lobato	MG	São Geraldo da Piedade	PB	Fagundes	PR	Ladoinho
CE	Barroquinha	MA	São Francisco do Brejo	MG	São João Batista do Glória	PB	Lagoa Seca	PR	Lobato
CE	Cariré	MA	São Pedro da Água Branca	MG	São Sebastião do Oeste	PB	Lucena	PR	Lupionópolis
CE	Chaval	MA	Senador La Rocque	MG	Sapucaia-Mirim	PB	Marçacá	PR	Miraselva
CE	Coreaú	MA	Vila Nova dos Martíris	MG	Veríssimo	PB	Masaraçuaba		
CE	Crato	MG	Água Comprida	MG	Mathias Lobato	PB	Matinhas		
CE	Groaíras	MG	Alpercata	MS	Anastácio	PB	Montadas		
CE	Itapouba	MG	Araçá	MS	Caracol	PB	Pedras de Fogo		
CE	Massapé	MG	Caramuru	MS	Corumbá	PB	Puxinanã		
CE	Meruoca	MG	Camanducaia	MS	Doadópolis	PB	Riachão do Poço		




**2. Municípios com limpeza de faixa concluída** (24/05/23)  
 459 municípios  
 desocupação e mitigação concluída (incluindo a franja de 20 km) & instalação TVRO iniciada

UF	Município	UF	Município	UF	Município	UF	Município	UF	Município
PR	Morretes	RN	Brejinho	RS	Fagundes Varela	RS	Terra de Areia	SC	Major Vieira
PR	Munhoz de Melo	RN	Lagoa de Pedras	RS	Garibaldi	RS	Três Cachoeiras	SC	Marema
PR	Nossa Senhora das Graças	RN	Lagoa Salgada	RS	Genil	RS	Três Forquilhas	SC	Mirim Doce
PR	Nova América da Colina	RN	Poço Branco	RS	Guabiju	RS	União da Serra	SC	Monte Castelo
PR	Ortigueira	RN	Pureza	RS	Ibirataras	RS	Vacaria	SC	Nova Itaberaba
PR	Pontal do Paraná	RN	Tibau	RS	Itópolis	RS	Vanió	SC	Orleans
PR	Porto Amazonas	RN	Serra do Mel	RS	Ipê	RS	Verândpolis	SC	Painel
PR	Prado Ferreira	RN	Taipu	RS	Itapuca	RS	Vila Flores	SC	Papanduva
PR	Primeiro de Maio	RR	Itacema	RS	Itati	RS	Vila Maria	SC	Passo de Torres
PR	Rancho Alegre	RS	Amaral Ferrador	RS	Jaquirana	RS	Vila Nova do Sul	SC	Pedras Grandes
PR	Santa Fé	RS	André da Rocha	RS	Lagoa Vermelha	RS	Vista Alegre do Prata	SC	Planalto Alegre
PR	Santa Inês	RS	Anta Gorda	RS	Mampituba	RS	Xangri-lá	SC	Posto Alto
PR	Santa Lúcia	RS	Antônio Prado	RS	Mato Castelhano	SC	Águas de Chapeço	SC	Prata Grande
PR	Santa Tereza do Oeste	RS	Aramburé	RS	Montauri	SC	Aguaes Fria	SC	Rio do Campo
PR	Santa Tereza do Itaipu	RS	Arroio do Sul	RS	Monte Belo do Sul	SC	Anita Garibaldi	SC	Rio Fortuna
PR	São Miguel do Iguçu	RS	Arvorezinha	RS	Morinhos do Sul	SC	Balneário Arroio do Silva	SC	Rio Rufino
PR	São Pedro do Ivaí	RS	Boa Vista do Sul	RS	Malhaden	SC	Balneário Garibaldi	SC	Sangão
PR	São Sebastião da Amoreira	RS	Bom Jesus	RS	Novo Araçá	SC	Bela Vista do Toldo	SC	Santa Rosa de Lima
PR	Sertãozinho	RS	Cacequi	RS	Nova Bassano	SC	Bom Jardim da Serra	SC	Santa Rosa do Sul
PR	Sertãozinho	RS	Camargo	RS	Nova Prata	SC	Bom Retiro	SC	Santa Tereza
PR	Teixeira Soares	RS	Cambará do Sul	RS	Nova Roma do Sul	SC	Campo Belo do Sul	SC	São Cristóvão do Sul
PR	Tupãssu	RS	Campestre da Serra	RS	Pará	SC	Caxambu do Sul	SC	São João do Sul
PR	Ural	RS	Capão Bonito do Sul	RS	Pinhal da Serra	SC	Celso Ramos	SC	São José do Cerrito
RJ	Barra Mansa	RS	Casca	RS	Pinto Bandeira	SC	Cerro Negro	SC	São Ludgero
RJ	Cordeiro	RS	Caseiros	RS	Protásio Alves	SC	Cordilheira Alta	SC	Timbó do Sul
RJ	Itaúna	RS	Ciriaco	RS	Putinga	SC	Coronel Freitas	SC	Timbó Grande
RJ	Pinheiral	RS	Coronel Pilar	RS	Santa Tereza	SC	Correia Pinto	SC	Três Barras
RJ	Quatis	RS	Cotiporã	RS	Santo Antônio do Palma	SC	Ermo	SC	Trzeze de Maio
RJ	Ressende	RS	Coxilha	RS	São Domingos do Sul	SC	Faxinal dos Guardes		
RJ	Rio Claro	RS	David Canabarro	RS	São Jorge	SC	Grão Pará		
RJ	Santa Maria Madalena	RS	Dionísio de Azevedo	RS	São José dos Ausentes	SC	Inocência		
RJ	São Sebastião do Alto	RS	Dois Irmãos	RS	São Valentim do Sul	SC	Jacinto Machado		
RJ	Trajano de Moraes	RS	Dom Pedro de Alcântara	RS	Serafina Corrêa	SC	Lajeado Grande		
RN	Areia Branca	RS	Esmeralda	RS	Silveira Martins	SC	Lauro Müller		




Item	Descrição																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	<p><b>2. Municípios com limpeza de faixa concluída (24/05/23)</b>                      459 municípios                      desocupação e mitigação concluída (incluindo a franja de 20 km) &amp; instalação TVRO iniciada</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UF</th> <th>Município</th> <th>UF</th> <th>Município</th> <th>UF</th> <th>Município</th> <th>UF</th> <th>Município</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SC</td><td>Turvo</td><td>SP</td><td>Clemencia</td><td>SP</td><td>Larainha</td><td>SP</td><td>Salinas</td></tr> <tr><td>SC</td><td>Urupema</td><td>SP</td><td>Cochoas</td><td>SP</td><td>Luís Antônio</td><td>SP</td><td>Salinas Oliveira</td></tr> <tr><td>SC</td><td>Urussanga</td><td>SP</td><td>Coroado</td><td>SP</td><td>Lupatício</td><td>SP</td><td>Salmourão</td></tr> <tr><td>SC</td><td>Vargem</td><td>SP</td><td>Corumbatal</td><td>SP</td><td>Maripolis</td><td>SP</td><td>Santa Cruz da Conceição</td></tr> <tr><td>SC</td><td>Xaxim</td><td>SP</td><td>Cristina Paulista</td><td>SP</td><td>Mineros do Tietê</td><td>SP</td><td>Santa Ernestina</td></tr> <tr><td>SE</td><td>Carmópolis</td><td>SP</td><td>Descalvado</td><td>SP</td><td>Mirassol</td><td>SP</td><td>Santa Gertrudes</td></tr> <tr><td>SE</td><td>General Maynard</td><td>SP</td><td>Dobrada</td><td>SP</td><td>Mirassolândia</td><td>SP</td><td>Santa Maria da Serra</td></tr> <tr><td>SE</td><td>Santo Amaro das Brotas</td><td>SP</td><td>Dois Córregos</td><td>SP</td><td>Monte Alegre do Sul</td><td>SP</td><td>Santa Rita do Passa Quatro</td></tr> <tr><td>SP</td><td>Aguaí de São Pedro</td><td>SP</td><td>Dourado</td><td>SP</td><td>Naranhã</td><td>SP</td><td>Santo Expedito</td></tr> <tr><td>SP</td><td>Ávaro de Carvalho</td><td>SP</td><td>Duartina</td><td>SP</td><td>Nova Europa</td><td>SP</td><td>Santópolis do Aguapeí</td></tr> <tr><td>SP</td><td>Alvirlândia</td><td>SP</td><td>Ferreão</td><td>SP</td><td>Ocaúço</td><td>SP</td><td>São José da Bela Vista</td></tr> <tr><td>SP</td><td>Anatãndia</td><td>SP</td><td>Flora Rica</td><td>SP</td><td>Onda Verde</td><td>SP</td><td>São Pedro</td></tr> <tr><td>SP</td><td>Anhumas</td><td>SP</td><td>Gabriel Monteiro</td><td>SP</td><td>Oriente</td><td>SP</td><td>Torre de Pedra</td></tr> <tr><td>SP</td><td>Aparecida</td><td>SP</td><td>Getulina</td><td>SP</td><td>Oscar Bressane</td><td>SP</td><td>Trabiju</td></tr> <tr><td>SP</td><td>Aramina</td><td>SP</td><td>Glicério</td><td>SP</td><td>Pacembu</td><td>SP</td><td>Vera Cruz</td></tr> <tr><td>SP</td><td>Arealva</td><td>SP</td><td>Guaimbé</td><td>SP</td><td>Pardinho</td><td>TO</td><td>Atalaia do Tocantins</td></tr> <tr><td>SP</td><td>Arealópolis</td><td>SP</td><td>Guapiraci</td><td>SP</td><td>Pauлиста</td><td>TO</td><td>Buriti do Tocantins</td></tr> <tr><td>SP</td><td>Aval</td><td>SP</td><td>Guarantã</td><td>SP</td><td>Pereiras</td><td>TO</td><td>Carrasco Bonito</td></tr> <tr><td>SP</td><td>Balmos</td><td>SP</td><td>Herculândia</td><td>SP</td><td>Perulbe</td><td>TO</td><td>Esperantina</td></tr> <tr><td>SP</td><td>Balsameo</td><td>SP</td><td>Ibita</td><td>SP</td><td>Piacaba</td><td>TO</td><td>Fortaleza do Taboão</td></tr> <tr><td>SP</td><td>Bananal</td><td>SP</td><td>Igarapó do Tietê</td><td>SP</td><td>Pinhãozinho</td><td>TO</td><td>Lagoa do Tocantins</td></tr> <tr><td>SP</td><td>Bento de Abreu</td><td>SP</td><td>Ipeana</td><td>SP</td><td>Pirapozinho</td><td>TO</td><td>Nova Rosalândia</td></tr> <tr><td>SP</td><td>Bilac</td><td>SP</td><td>Ipiúna</td><td>SP</td><td>Platina</td><td>TO</td><td>Pedro Afonso</td></tr> <tr><td>SP</td><td>Erigeni</td><td>SP</td><td>Itaca</td><td>SP</td><td>Pompléia</td><td>TO</td><td>Praia Norte</td></tr> <tr><td>SP</td><td>Boa Esperança do Sul</td><td>SP</td><td>Itapirapó Paulista</td><td>SP</td><td>Porangaba</td><td>TO</td><td>Rio dos Bois</td></tr> <tr><td>SP</td><td>Bocaina</td><td>SP</td><td>Itapuí</td><td>SP</td><td>Pracinha</td><td>TO</td><td>Sampão</td></tr> <tr><td>SP</td><td>Bofete</td><td>SP</td><td>Itirapina</td><td>SP</td><td>Pratânia</td><td>TO</td><td>Santa Rosa do Tocantins</td></tr> <tr><td>SP</td><td>Bora</td><td>SP</td><td>Itirapuçã</td><td>SP</td><td>Quintana</td><td>TO</td><td>São Sebastião do Tocantins</td></tr> <tr><td>SP</td><td>Brasília</td><td>SP</td><td>Jari</td><td>SP</td><td>Rainópolis</td><td>TO</td><td>Sítio Novo do Tocantins</td></tr> <tr><td>SP</td><td>Brasilândia</td><td>SP</td><td>Jeriquara</td><td>SP</td><td>Revolução</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>SP</td><td>Cabrália Paulista</td><td>SP</td><td>Júlio Ramalho</td><td>SP</td><td>Ribeira</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>SP</td><td>Campos Novos Paulista</td><td>SP</td><td>Júlio Mesquita</td><td>SP</td><td>Ribeirão Bonito</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>SP</td><td>Cedral</td><td>SP</td><td>Jumirim</td><td>SP</td><td>Ribeirão Corrente</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>SP</td><td>Charqueada</td><td>SP</td><td>Laranjal Paulista</td><td>SP</td><td>Rubiacina</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	UF	Município	UF	Município	UF	Município	UF	Município	SC	Turvo	SP	Clemencia	SP	Larainha	SP	Salinas	SC	Urupema	SP	Cochoas	SP	Luís Antônio	SP	Salinas Oliveira	SC	Urussanga	SP	Coroado	SP	Lupatício	SP	Salmourão	SC	Vargem	SP	Corumbatal	SP	Maripolis	SP	Santa Cruz da Conceição	SC	Xaxim	SP	Cristina Paulista	SP	Mineros do Tietê	SP	Santa Ernestina	SE	Carmópolis	SP	Descalvado	SP	Mirassol	SP	Santa Gertrudes	SE	General Maynard	SP	Dobrada	SP	Mirassolândia	SP	Santa Maria da Serra	SE	Santo Amaro das Brotas	SP	Dois Córregos	SP	Monte Alegre do Sul	SP	Santa Rita do Passa Quatro	SP	Aguaí de São Pedro	SP	Dourado	SP	Naranhã	SP	Santo Expedito	SP	Ávaro de Carvalho	SP	Duartina	SP	Nova Europa	SP	Santópolis do Aguapeí	SP	Alvirlândia	SP	Ferreão	SP	Ocaúço	SP	São José da Bela Vista	SP	Anatãndia	SP	Flora Rica	SP	Onda Verde	SP	São Pedro	SP	Anhumas	SP	Gabriel Monteiro	SP	Oriente	SP	Torre de Pedra	SP	Aparecida	SP	Getulina	SP	Oscar Bressane	SP	Trabiju	SP	Aramina	SP	Glicério	SP	Pacembu	SP	Vera Cruz	SP	Arealva	SP	Guaimbé	SP	Pardinho	TO	Atalaia do Tocantins	SP	Arealópolis	SP	Guapiraci	SP	Pauлиста	TO	Buriti do Tocantins	SP	Aval	SP	Guarantã	SP	Pereiras	TO	Carrasco Bonito	SP	Balmos	SP	Herculândia	SP	Perulbe	TO	Esperantina	SP	Balsameo	SP	Ibita	SP	Piacaba	TO	Fortaleza do Taboão	SP	Bananal	SP	Igarapó do Tietê	SP	Pinhãozinho	TO	Lagoa do Tocantins	SP	Bento de Abreu	SP	Ipeana	SP	Pirapozinho	TO	Nova Rosalândia	SP	Bilac	SP	Ipiúna	SP	Platina	TO	Pedro Afonso	SP	Erigeni	SP	Itaca	SP	Pompléia	TO	Praia Norte	SP	Boa Esperança do Sul	SP	Itapirapó Paulista	SP	Porangaba	TO	Rio dos Bois	SP	Bocaina	SP	Itapuí	SP	Pracinha	TO	Sampão	SP	Bofete	SP	Itirapina	SP	Pratânia	TO	Santa Rosa do Tocantins	SP	Bora	SP	Itirapuçã	SP	Quintana	TO	São Sebastião do Tocantins	SP	Brasília	SP	Jari	SP	Rainópolis	TO	Sítio Novo do Tocantins	SP	Brasilândia	SP	Jeriquara	SP	Revolução			SP	Cabrália Paulista	SP	Júlio Ramalho	SP	Ribeira			SP	Campos Novos Paulista	SP	Júlio Mesquita	SP	Ribeirão Bonito			SP	Cedral	SP	Jumirim	SP	Ribeirão Corrente			SP	Charqueada	SP	Laranjal Paulista	SP	Rubiacina		
UF	Município	UF	Município	UF	Município	UF	Município																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SC	Turvo	SP	Clemencia	SP	Larainha	SP	Salinas																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SC	Urupema	SP	Cochoas	SP	Luís Antônio	SP	Salinas Oliveira																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SC	Urussanga	SP	Coroado	SP	Lupatício	SP	Salmourão																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SC	Vargem	SP	Corumbatal	SP	Maripolis	SP	Santa Cruz da Conceição																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SC	Xaxim	SP	Cristina Paulista	SP	Mineros do Tietê	SP	Santa Ernestina																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SE	Carmópolis	SP	Descalvado	SP	Mirassol	SP	Santa Gertrudes																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SE	General Maynard	SP	Dobrada	SP	Mirassolândia	SP	Santa Maria da Serra																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SE	Santo Amaro das Brotas	SP	Dois Córregos	SP	Monte Alegre do Sul	SP	Santa Rita do Passa Quatro																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SP	Aguaí de São Pedro	SP	Dourado	SP	Naranhã	SP	Santo Expedito																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SP	Ávaro de Carvalho	SP	Duartina	SP	Nova Europa	SP	Santópolis do Aguapeí																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SP	Alvirlândia	SP	Ferreão	SP	Ocaúço	SP	São José da Bela Vista																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SP	Anatãndia	SP	Flora Rica	SP	Onda Verde	SP	São Pedro																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SP	Anhumas	SP	Gabriel Monteiro	SP	Oriente	SP	Torre de Pedra																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SP	Aparecida	SP	Getulina	SP	Oscar Bressane	SP	Trabiju																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SP	Aramina	SP	Glicério	SP	Pacembu	SP	Vera Cruz																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SP	Arealva	SP	Guaimbé	SP	Pardinho	TO	Atalaia do Tocantins																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SP	Arealópolis	SP	Guapiraci	SP	Pauлиста	TO	Buriti do Tocantins																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SP	Aval	SP	Guarantã	SP	Pereiras	TO	Carrasco Bonito																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SP	Balmos	SP	Herculândia	SP	Perulbe	TO	Esperantina																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SP	Balsameo	SP	Ibita	SP	Piacaba	TO	Fortaleza do Taboão																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SP	Bananal	SP	Igarapó do Tietê	SP	Pinhãozinho	TO	Lagoa do Tocantins																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SP	Bento de Abreu	SP	Ipeana	SP	Pirapozinho	TO	Nova Rosalândia																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SP	Bilac	SP	Ipiúna	SP	Platina	TO	Pedro Afonso																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SP	Erigeni	SP	Itaca	SP	Pompléia	TO	Praia Norte																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SP	Boa Esperança do Sul	SP	Itapirapó Paulista	SP	Porangaba	TO	Rio dos Bois																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SP	Bocaina	SP	Itapuí	SP	Pracinha	TO	Sampão																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SP	Bofete	SP	Itirapina	SP	Pratânia	TO	Santa Rosa do Tocantins																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SP	Bora	SP	Itirapuçã	SP	Quintana	TO	São Sebastião do Tocantins																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SP	Brasília	SP	Jari	SP	Rainópolis	TO	Sítio Novo do Tocantins																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SP	Brasilândia	SP	Jeriquara	SP	Revolução																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SP	Cabrália Paulista	SP	Júlio Ramalho	SP	Ribeira																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SP	Campos Novos Paulista	SP	Júlio Mesquita	SP	Ribeirão Bonito																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SP	Cedral	SP	Jumirim	SP	Ribeirão Corrente																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SP	Charqueada	SP	Laranjal Paulista	SP	Rubiacina																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Acerca desse ponto, o Sr. **Leandro Guerra** informou que a EAF vem sempre comunicando o GAISPI e a Anatel, por meio do SEI, os relatórios de liberação e mitigação de desocupação das estações FSS e apresentou um gráfico, abaixo transcrito, que apresenta a posição geodésica do município dentro do mapa. Destacou que a cobertura amarela do mapa representa os municípios em que liberaram a limpeza da faixa, considerando a franja de 20 km em torno dos 4 municípios mostrados em uma estação do estado de Alagoas, em que a cidade maior representada é Atalaia e teria ainda Maribondo, Anadia e Boca da Mata. Ressaltou que esse mapa se apresenta em todos os municípios que a EAF realizou a limpeza da faixa nesta etapa:

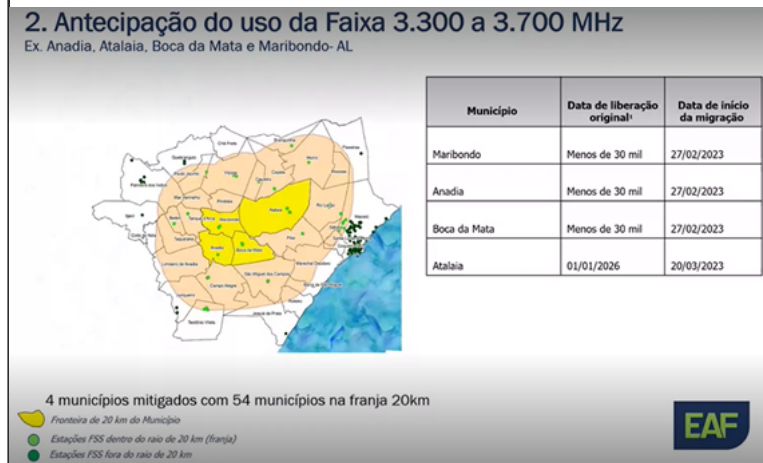

Passando para o terceiro item da agenda de Informe da EAF, o Sr. **Leandro Guerra** projetou o slide a seguir transcrito que mostra o Cronograma Macro da Fase 3:

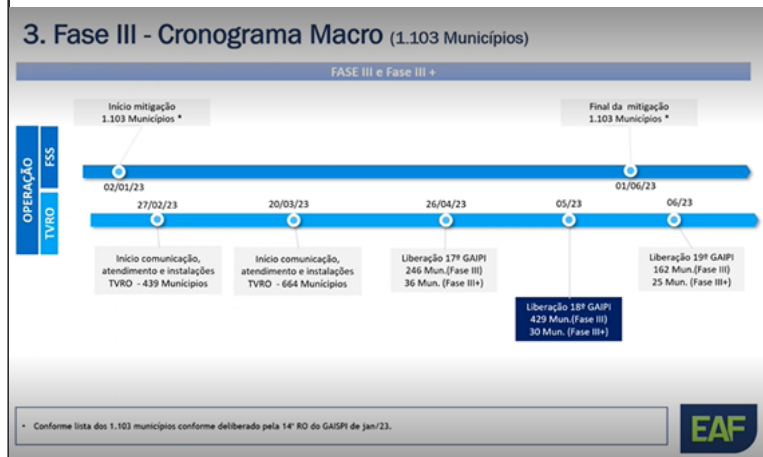

Com relação ao Cronograma em apreço, destacou que o projeto se encontra no GAISPI do mês de maio, recordando que vinham liberando os municípios ao longo dos últimos meses, chegando, agora, aos 459 municípios, sendo 429 municípios que fazem parte da Fase 3, isto é, com mais de 200 mil habitantes ou menores de 30 mil habitantes, e 30 municípios da Fase 3+ que estariam sendo antecipados, de acordo com as Diretrizes que estão sendo adotadas em conjunto com o GAISPI. Asseverou que ainda faltam 162 municípios para completar a Fase 3 do Edital, prevista para o dia 30 de junho, e informou que a EAF já estaria trabalhando em mais 25 municípios, o que totaliza 187 municípios que devem ser apresentados no GAISPI do mês de junho para deliberação da liberação da faixa.

Em seguida, o Sr. **Leandro Guerra** apresentou uma figura sobre o cenário de comunicação na Fase 3, abaixo reproduzida, afirmando que já vem sendo mostrado ao GAISPI:



Item	Descrição
	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"> <h3 style="text-align: center;">3. Fase III – Cenário de Comunicação</h3> <p style="text-align: center;">CENÁRIO NACIONAL</p> <p style="text-align: center;">Desde março/23, <b>1.610 municípios</b> com operação simultânea.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 20%;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">FASE 1: CAPITAIS</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">27 CIDADES</p> <p style="font-size: 8px;">POPULAÇÃO: 50.916.038 KITS GRATUITOS: 257.303 (*)</p> <p style="font-size: 8px;">CAMPANHA: 27/06/22 a 24/12/22 (período variável de acordo com cronograma de ativação em cada capital)</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 20%;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">FASE 2: 500 MIL HAB.</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">+ 26 CIDADES</p> <p style="font-size: 8px;">POPULAÇÃO: +18.046.946 KITS GRATUITOS: +469.737 (*)</p> <p style="font-size: 8px;">CAMPANHA: 03/10/22 a 01/04/23</p> </div> <div style="border: 2px solid green; padding: 5px; width: 20%; border-color: green;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">FASE 2+: RMs E ENTORNO</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">+ 454 CIDADES</p> <p style="font-size: 8px;">POPULAÇÃO: +31.834.832 KITS GRATUITOS: +506.904 (*)</p> <p style="font-size: 8px; background-color: green; color: white; text-align: center;">CAMPANHA: 03/10/22 a 03/06/23</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 20%;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">FASE 3:</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">+ 1.103 CIDADES</p> <p style="font-size: 8px;">POPULAÇÃO: +39.456.903 KITS GRATUITOS: +2.436.331 (*)</p> <p style="font-size: 8px;">CAMPANHA: #1: 27/02/23 a 26/08/23 #2: 20/03/23 a 16/09/23</p> </div> </div> <p style="margin-top: 10px; font-size: 10px;">▶ As praças com o fim da campanha publicitária local continuam cobertas pela campanha em TV e há continuidade na operação de atendimento, agendamento e instalação dos kits gratuitos.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> </div> </div>

Nesse contexto, informou que, desde o mês de março, a EAF vem comunicando e apontou um situação específica que gostaria de chamar atenção e referente às 454 cidades que compõem a Fase 2+ e que se encontram nas Regiões Metropolitanas das cidades com mais de 500 mil habitantes e capitais, para informar que a campanha local se encerra agora no dia 03 de junho e que a EAF dará continuidade, a nível de comunicação, na própria banda C, atingindo todo o território nacional e inclusive permanecendo nessas cidades, e ainda com a comunicação de atendimento, agendamento e instalação dos kits, assim como a EAF vinha fazendo nas Fases 1 e 2 do processo.

O Sr. **Leandro Guerra** passou para o quarto ponto de sua agenda referente ao Planejamento da Fase 4, destacando que a EAF prevê atuar, em um planejamento inicial, até o mês de junho de 2024, em 1377 municípios, e realizou a leitura das informações contidas no *slide* abaixo reproduzido:

### 4. Fase IV - Planejamento

Atuação da EAF em 1.377 municípios

AC	2
AL	48
AM	5
AP	6
BA	86
CE	56
ES	27
GO	60
MA	43
MG	264
MS	17
MT	10
PA	38
PB	47
PE	47
PI	21
PR	115
RJ	22
RN	37
RO	4
RS	4
RS	147
SC	48
SE	28
SP	144
TO	49

- Possibilidade de liberação mensal ao longo do período (jul/23 a jun/24) a ser detalhado pelo GT Migração
- Limpeza escalonada da faixa de 3.5 GHz a partir de Jul/23
- Necessário autorização do Gaispi para a EAF iniciar a comunicação/atendimento/instalação dos kits de TVRO

Em seguida, o Sr. **Leandro Guerra** iniciou as informações quanto quinto ponto de sua agenda relativo ao Atendimento TVRO – Piloto Whatsapp, projetando o *slide* abaixo reproduzido, e informou que os números se referem ao período de 16 de maio, quando a EAF iniciou esse atendimento, até o dia 20 de maio, inicialmente 5 operadores e com o crescimento de até 20 operadores:

### 5. Atendimento TVRO – Piloto Whatsapp Agendamento

**WHATSAPP**

- Implantação 16/05
- Operadores dedicados 05 a 20

Funil do Whatsapp

Total de Conversas: 14.154

Fora do Horário: 953

Retido: 11.328

Humano: 1.834

Tabulações Retido

Demais Assuntos	33%
Já possui agendamento	15%
Antena é digital	12%
Parabólica desativada	8%
Não elegível	9%
Não possui antena	2%
CPF Inválido	4%
Cidade não Atendida	4%
CEP Errado	3%
Telefone Inválido	0%

\*Demais Assuntos: Redirecionamento para o 0800

Tabulações Humano


Agendamento	60%
Beneficiário passou interação	32%
Não soube informar a antena	3%
Antena Espinha de Peixe	1%
Antena Disco/Pizza	1%
Antena Interna	0%

Interações por Região

Centro-Oeste	13%
Nordeste	56%
Norte	20%
Sudeste	1%
Sul	1%

Em relação ao piloto *Whatsapp* Agendamento, o Sr. **Leandro Guerra** informou que algumas pessoas tentaram se comunicar fora do horário comercial, bem como que houve uma retenção, isto é, pessoas que não passaram pelo agendamento, por diversas motivações, conforme números e informações constantes do *slide* acima. Registrou que, no funil, tiveram 1834 interessados no agendamento e que efetivamente foram realizados 60% desse total. Do mesmo modo, registrou as informações contidas no gráfico acima que mostra as interações por Região, ressaltando que ele demonstra um pouco da demanda significativa da EAF na Região Nordeste com 56% e na Região Norte com 20% das pessoas que entraram em contato. Finalmente, o Sr. **Leandro Guerra** destacou que se trata de um período curto e que a EAF pretende trazer uma figura mais aprimorada ao GAISPI na medida em que esse processo do *Whatsapp* for sendo desenvolvido.


Na sequência, o Sr. **Leandro Guerra** reportou a respeito do sexto item de sua agenda referente à Nova Etapa de Compras – TVRO, destacando essa nova fase de processo de aquisição dos kits de TVRO, considerando o que já foi comentado por ele em relação à demanda consistente e crescente, e projetou o *slide* a seguir transcrito:

Item	Descrição
	<p><b>6. Nova Etapa de Compras – Kit TVRO</b></p> <p>Divulgação do processo de concorrência p/ aquisição de 1MM de Kits de TVRO publicado no portal <a href="https://www.sigaantelado.com.br/forneecedores">https://www.sigaantelado.com.br/forneecedores</a> com ampla divulgação a entidades representativas da indústria (CNI, ABINEE, Federações,)</p> 

Quanto a esse ponto, salientou que, para que a EAF possa abastecer e ter um estoque que fique alinhado com as necessidades do mercado, foi colocada uma RFP na praça a partir de sexta-feira passada, e informou que estão dando ampla publicidade para esse processo de concorrência, fazendo ele constar do portal da EAF no endereço identificado na *slide* acima, com a documentação completa e a própria Carta-convite, bem como divulgando para as entidades representativas da indústria. Reforçou ao GAISPI que a EAF, como já fizeram na primeira etapa grande de compras, conta com os participantes e colegas do Grupo para poder divulgar esse processo. Finalizou registrando também que a empresa que se interessar deve se cadastrar no *site* e aí ela terá todas as informações quanto ao procedimento para poder participar desse processo.

O Sr. **Leandro Guerra** informou um último ponto sobre o processo de TVRO que gostaria de destacar e que se refere a um tema que foi abordado na última Reunião Ordinária, para registrar que a EAF já estaria disponibilizando, via SEI, os laudos técnicos dos equipamentos que estão sendo homologados pela entidade, bem como que já disponibilizaram os laudos relativos aos receptores da banda Ku e que, em breve, disponibilizarão os demais laudos dos equipamentos que a EAF está adquirindo.

Proseguindo com a sua apresentação, o Sr. **Leandro Guerra** passou a reportar informações sobre sétimo ponto da agenda da EAF, **Projeto PAIS** e, para tanto, apresentou o *slide* abaixo reproduzido que mostra o mapa das Infovias integrantes do projeto, lembrando que o trabalho se dá em duas etapas, sendo que a EAF desenvolve a Etapa 1, que contempla as Infovias 02, 03 e 04, buscando entregá-las ainda este ano, até o mês de novembro, e, posteriormente a Etapa 2, que contempla as Infovias 05, 06 e 08:

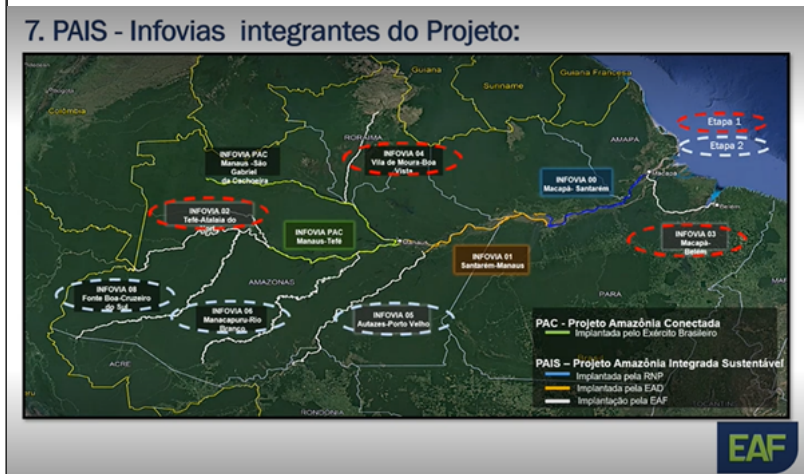

Ainda sobre o Projeto PAIS, o Sr. **Leandro Guerra** apresentou o *slide* a seguir transcrito que mostra uma atualização sobre a implantação das Infovias 02, 03 e 04:

7. PAIS – Atividades em andamento		Etapa 1 – Implantação das Infovias 02, 03 e 04
Atividades (aquisição de Produtos e Serviços)	Situação	
EVR e ERA – realização do Estudo de Viabilidade de Rota e Estudo de Rota Aprimorada	INFOVIA 02: Estudo EVR e ERA – levantamento de dados concluídos, entrega parcial do relatório. INFOVIA 03 e 04: Estudos EVR e ERA Concluídos.	
COCS – Contratação de Cabo Óptico (Subaquático e Terrestre) e Complementos.	Cabo Óptico Subaquático e Terrestre: 100% produzidos Previsão de Entrega : 05/08/23 em Manaus. Transbordo previsto em 24 dias	
IOEE - Inspeção Óptica e Ensaio Estrutural	Padtec resp. pela inspeção óptica na ZTT (China) e CPQD pelos testes estruturais no Brasil. Atividade em andamento. Testes na fábrica encerraram 30/04/23. Transbordo com previsão de conclusão 28/05/23. Saída da China com previsão 29/05/23.	
CMAD - Centro Móvel de Alta Disponibilidade, ambiente para abrigar sistema de transmissão e terminações ópticas	Definido o fornecedor MDC, localizado em Manaus. Contrato assinado 10/04/23. 2 inspeções realizadas em fábrica. Necessário obter sites para instalação de CMAD's junto aos órgãos: DNIT, IBAMA, FUNAI, Prefeituras e Universidades Federais.	
SLAPA – Serviço de Licenciamento, Autorizações e Permissões Ambientais	Fornecedor: EnvironPact. Contrato assinado 12/05/23.	
SICOS - Serviço de Implantação de Cabo Óptico Subaquático. Contratação do lançamento e armazenamento dos cabos e da instalação de caixa de ancoragem	Fornecedor: Navegação Prates Contrato assinado 13/05/23. Necessário obter sites para instalação de caixa de ancoragem junto aos órgãos: DNIT, IBAMA, FUNAI, Prefeituras e Universidades.	
STO - Sistema de Transmissão Óptica	Elaborada RFP. Em processo interno para contratação. Previsão de contratação: jun/23	
BET - Backbone Estadual Terrestre. – serviço de instalação do trecho de Caracará/ Boa Vista da Infovia 04	Premissas e diretrizes para RFP. Infovia 04: em elaboração. Previsão de contratação: jun/23	
RMO - Rede Metropolitana Óptica	Premissas e diretrizes para RFP. em elaboração. Previsão de contratação: jun/23	

Em relação ao *slide* acima, o Sr. **Leandro Guerra** realizou os seguintes destaques:

- 1) A EAF já realizou os Estudos de Viabilidade de Rota e de Rota Aprimorada, como já vem sendo reportado;

Item	Descrição
	<p>2) Em relação ao cabo óptico, registrou que a boa notícia é de que, além de estar com 100% produzido, teriam realmente a previsão de entrega em Manaus/AM no dia 08 de agosto, e que esses cabos já estariam praticamente embarcados em um navio na China, na fábrica da ZTT;</p> <p>3) Que já foram realizados trabalhos quanto à avaliação técnica da condição dos cabos na China pela PADTEC e que, posteriormente, terão os testes estruturais realizados pelo CPqD assim que os cabos chegarem, afirmando que esse processo dos cabos está andando dentro do cronograma esperado, com previsão de saída da China agora, até o dia 29 de maio, conforme comentado por ele estariam praticamente embarcados;</p> <p>4) Que o Centro Móvel de Alta Disponibilidade (CMAD) teve o seu contrato assinado no mês de abril e informou que ele está sendo produzido e que já fizeram duas inspeções em fábrica e que gostaria de destacar um tema muito relevante que diz respeito à necessidade de negociação/interação com alguns órgãos públicos, tais como DNIT, IBAMA, FUNAI, Prefeituras e Universidades Federais. Afirmando que já foram levantados alguns pontos ideais para que possam instalar tanto a caixa de ancoragem quanto o próprio CMAD. Relatou, nesse ponto, que estão contatando com a Anatel e com o próprio GAISPI para poder ter esse apoio e poder sensibilizar, tendo em vista a importância de se ter uma velocidade nos próprios termos de cooperação de uso das infraestruturas desses entes públicos;</p> <p>5) Do lado do licenciamento ambiental, informou que já foi contratada uma empresa chamada <i>EnvirionPact</i> e que o contrato foi assinado no dia 12 de maio e que já iniciaram o desenvolvimento desse trabalho, principalmente essa questão de licença ambiental que é muito importante nesse processo;</p> <p>6) Outra boa notícia é que a empresa que instalará e lançará os cabos ópticos e subaquáticos já foi contratada no dia 13 de maio e se trata da Navegação Prates que possui uma ampla experiência nesse processo na Região Amazônica e que também será responsável pela instalação da caixa de ancoragem, sendo importante a tratativa com esses órgãos públicos;</p> <p>7) Quanto ao Sistema de Transmissão Óptica (STO), informou que a previsão de contratação é para o mês de junho;</p> <p>8) Em relação ao serviço de instalação do <i>Backbone</i> Terrestre, informou que os cabos serão fornecidos pela própria ZTT, mas que a instalação terá um processo de concorrência à parte que está sendo desenvolvido, e que isso se refere à Infovias 04, sendo a previsão de contratação para o mês de junho; e</p> <p>9) Finalmente, em relação às Redes Metropolitanas, informou que, igualmente, a intenção e planejamento da EAF é assinar o contrato no mês de junho.</p>

Ainda sobre esse tema, o Sr. **Leandro Guerra** apresentou os registros fotográficos abaixo reproduzidos que demonstram as evidências da montagem dos cabos no navio, contando com 4 tanques, sendo 8 bobinas e 6 delas totalmente compostas, e que estaria sendo finalizado o embarcamento dos cabos e carretéis que se encontram no navio:









Em seguida, o Sr. **Leandro Guerra** apresentou registros fotográficos abaixo reproduzidos que também demonstram as evidências da construção do CMAD, *container* inteligente, tratando-se do primeiro e onde serão realizados todos os testes de aceitação:




Finalmente, o Sr. **Leandro Guerra** passou a reportar o último item de sua agenda, Projeto Rede Privativa de Governo, projetando os *slides* abaixo reproduzidos, e ressaltou que se tratam dos mesmos *slides* já apresentados na última Reunião Ordinária do GAISPI. Informou, nesse ponto, que não há novidades em relação às informações neles contidas, porém destacou que as especificações técnicas e as RFPs estão prontas e que aguardam as definições quanto à demanda do projeto e quantidade de endereços dos pontos da Rede Fixa, imprescindíveis para que possam lançar as RFPs, bem como, em relação à Rede Móvel, uma definição quanto à viabilidade do *Ran Sharing* e a própria definição dos usuários da rede:

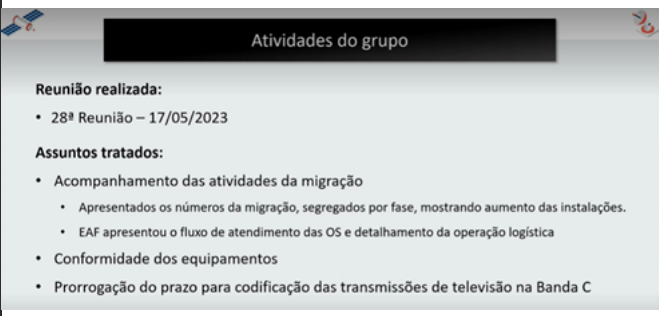

Item	Descrição
	<div data-bbox="199 107 906 526"> <h3>8. Rede Privativa de Governo - Status Especificações e RFPs</h3> <p>TOTAL DE ESPECIFICAÇÕES = 21 Rede Móvel e Fixa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Finalizadas - 17</li> <li>Não Finalizadas - 04 (02 segurança, 02 Criptografia). <ul style="list-style-type: none"> <li>Dependem de premissas do projeto para finalizar especificações.</li> </ul> </li> </ul> <p>TOTAL DE RFPs = 21 Rede Móvel e Fixa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Finalizada - 02 (Ferramenta de Projeto e Ferramenta de Implantação de Rede)</li> <li>Negociação - 03 (Aluguel de Torres, Serviço de Lançamento de fibra, Cabos de Fibra óptica e Caixas de Emenda) <ul style="list-style-type: none"> <li>Serviço Fibra - Propostas finais dos fornecedores - 19-Maio</li> <li>Material Fibra - Envio de Target aos fornecedores - 18-Maio</li> </ul> </li> <li>RFI Finalizada - 03 (Core Dados, Core Voz, RAN)</li> <li>RFI em Andamento - 02 (MCPTx - Plataforma Missão crítica e SD-WAN)</li> <li>RFPs prontas aguardando autorização para publicação - 07 (GPON, Metro IP, eMBMS (Multimídia Broadcast), Backhaul Móvel, IP Core, BSS e OSS)</li> <li>Aguardando especificação técnica - 04 (Segurança Rede Fixa, Criptografia Rede Fixa, Segurança Rede Móvel, Criptografia Rede Móvel.)</li> </ul>  </div> <div data-bbox="199 537 906 952"> <h3>8. Rede Privativa de Governo - Status Especificações e RFPs</h3> <p>DEFINIÇÕES NECESSÁRIAS PARA AVALIAÇÃO DE POSSIBILIDADES DE MELHORIA DE EFICIÊNCIA DOS PROJETOS</p> <p>REDE FIXA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Necessidade de definição final da demanda do projeto (Pontos a serem atendidos pelo projeto).</li> </ul> <p>REDE MÓVEL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Avaliar possibilidade de preparar estudo detalhado de viabilidade de uso de Ran Sharing.</li> <li>Definição sobre os tipos de usuários que usarão a rede móvel (Missão crítica e não missão crítica/Civis).</li> </ul>  </div> <p>O <b>Sr. Leandro Guerra</b> encerrou sua apresentação informando que essa era a agenda da EAF e se colocou à disposição para qualquer dúvida. Concluída a apresentação, o <b>Presidente do GAISPI</b> questionou aos membros do GAISPI se possuíam algum comentário em relação ao que foi apresentado pela EAF. Não havendo manifestações, o <b>Presidente do GAISPI</b> passou para os itens 3 e 4 da Pauta.</p>
3 e 4	<p>O <b>Presidente do GAISPI</b> cumprimentou o <b>Sr. Martim Jales Hon, Coordenador do GT-MIGRAÇÃO</b>, e concedeu a palavra para que fizesse sua apresentação.</p> <p>O <b>Sr. Martim Jales Hon</b> cumprimentou, inicialmente, a todos os membros, e afirmou que projetaria uma breve apresentação sobre o relato das atividades do <b>GT-MIGRAÇÃO</b>, conforme <i>slide</i> abaixo reproduzido:</p> <div data-bbox="191 1220 853 1534">  </div> <p>Destacou que o grupo se reuniu na última quarta-feira, em sua 28ª Reunião, e que parte da pauta trata de assuntos recorrentes do grupo, tal como o <u>acompanhamento das atividades de migração</u>. Nesse ponto, informou que a EAF apresentou os números da migração e que seriam aqueles já apresentados pelo <b>Sr. Leandro Guerra</b> nesta Reunião Ordinária, e afirmou que o grupo tem tido um bom acompanhamento da evolução das instalações dos kits para os beneficiários. Informou que também foi discutido um detalhamento do fluxo de atendimento das Ordens de Serviço (OS) e das operações logísticas da EAF, registrando que esse foi um pedido feito à EAF que, por sua vez, trouxe ao grupo as informações quanto à forma de contratação das empresas que trabalham com a instalação, a seleção da quantidade de empresas que atuará em cada município e como é feito o encaminhamento de um agendamento para essas empresas, e ressaltou que eram informações que o grupo não tinha conhecimento de forma mais detalhada.</p> <p>O <b>Sr. Martim Jales Hon</b> passou a reportar o outro tema discutido no grupo relativo à <u>conformidade dos equipamentos</u>, e asseverou, inicialmente, que o <b>Sr. Leandro Guerra</b> trouxe a antecipação de que a EAF já estaria encaminhando à Anatel, via SEI, os laudos de conformidade dos equipamentos que são distribuídos pela entidade aos beneficiários, e afirmou que faltam alguns para serem encaminhados e alguns detalhes em discussão sobre alguns equipamentos e que o grupo estaria atento a esse aspecto.</p> <p>Prosseguindo com a sua apresentação, o <b>Sr. Martim Jales Hon</b> informou que outro ponto que gostaria de destacar e que foi introduzido na última reunião do GT e que, provavelmente, será um item de deliberação que o <b>GT-MIGRAÇÃO</b> trará para a próxima Reunião, diz respeito à discussão sobre a prorrogação do prazo para codificação das transmissões de banda C. Quanto a esse ponto, o <b>Sr. Martim Jales Hon</b> fez uma contextualização para informar que o Edital previu a obrigatoriedade do <i>simulcast</i> em banda C e banda Ku nos canais de televisão por no mínimo 18 meses a partir da disponibilização dos canais em banda Ku, o que teria acontecido no mês de maio de 2022, afirmando que esse prazo se encerrará no mês de novembro deste ano e que o Edital já previu a possibilidade de prorrogação desse prazo até o mês de dezembro de 2025. Destacou que o grupo já teve uma discussão e que já evoluíram bastante em relação a esse assunto, informando que há um consenso de que não tem como não fazer essa prorrogação, uma vez que a migração está em andamento e ainda faltam cidade a serem adicionadas, e registrou que, para que se encerre as transmissões na banda C, é necessário estar caminhando para a conclusão das ações de migração, sendo que a discussão no grupo está assentada sobre qual o prazo que será proposta essa prorrogação. Concluiu esse ponto afirmando que estaria apenas antecipando esse debate e que não seria algo que o grupo estaria trazendo para a deliberação neste momento, mas sim provavelmente na próxima Reunião do GAISPI.</p>

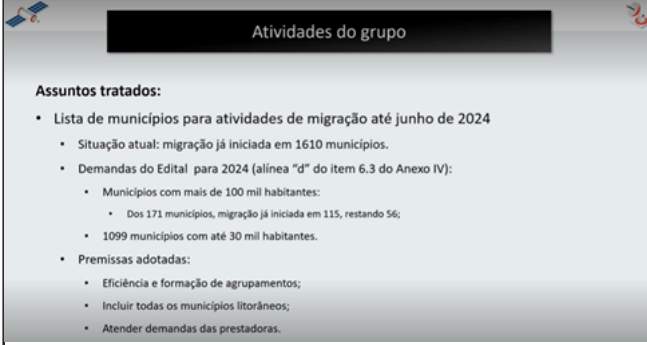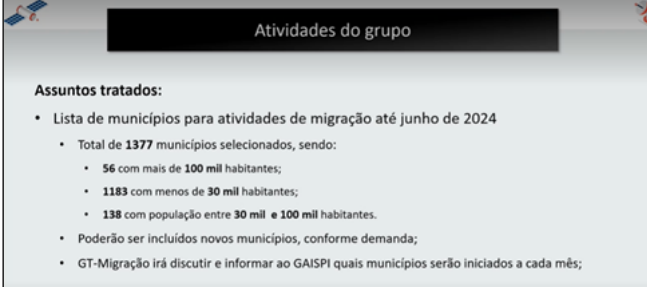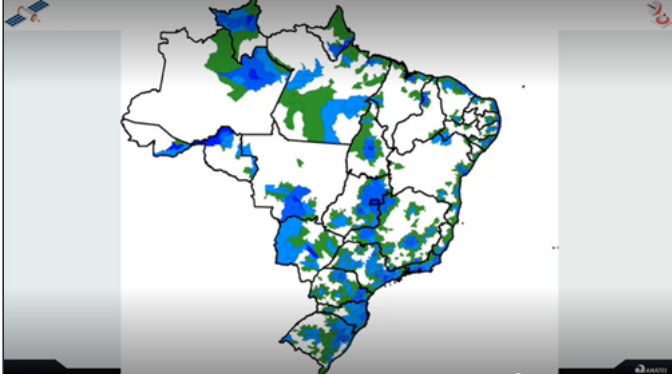Item	Descrição
	<p>Na sequência, o <b>Sr. Martim Jales Hon</b> projetou o <i>slide</i> abaixo reproduzido a respeito de um dos assuntos tratados no <b>GT-MIGRAÇÃO</b> e que gerou item desta Reunião referente à seleção dos municípios para a realização da migração até o mês de junho de 2024, e destacou as informações contidas abaixo:</p>  <p>Quanto às premissas para seleção desses municípios, o <b>Sr. Martim Jales Hon</b> informou que o grupo adotou: (i) a eficiência da logística e da alocação de recursos para a migração dentro da formação de agrupamentos, ou seja, trabalhar cidades próximas que tenham sinergia para o processo de migração; (ii) inclusão de todos os municípios litorâneos, conforme trazido pela própria EAF ao grupo, de modo que os municípios que se encontram ao longo da costa brasileira foram incluídos; e (iii) o atendimento das demandas apresentadas pelas prestadoras.</p> <p>Ainda nesse tema, o <b>Sr. Martim Jales Hon</b> projetou o <i>slide</i> a seguir transcrito que reporta os números de municípios selecionados e o seu perfil, destacando cada uma das informações abaixo contidas, e informou que esse é o mínimo que deve ser feito e que, conforme haja novas demandas, poderá ser analisada no grupo a viabilidade de expandir e incluir novos municípios, sempre atentos à capacidade e às restrições logísticas que o projeto impõe:</p>  <p>O <b>Sr. Martim Jales Hon</b> informou que para as próximas reuniões, em relação às atividades do grupo no que toca a esse planejamento, será a discussão, a partir da aprovação das 1377 cidades, ou seja, a autorização para que a EAF faça a migração desses municípios e como serão escalonados os trabalhos ao longo dos 12 meses, julho/2023 a julho/2024. Asseverou que a ideia é fasear esses 1377 municípios ao longo desse tempo, de forma a reduzir o impacto em relação ao <i>Call Center</i> e para a organização da EAF, assim como otimizando os recursos disponíveis para o projeto. O <b>Sr. Martim Jales Hon</b> enfatizou que a ideia é também discutir isso dentro do grupo a partir de proposta a ser trazida pela EAF e vir a cada Reunião reportar ao GAISPI quais seriam as cidades que entrariam no próximo mês na atividade de migração e, conseqüentemente, seriam as cidades que poderiam ser antecipadas para liberação.</p> <p>Nesse contexto, o <b>Sr. Martim Jales Hon</b> projetou o <i>slide</i> abaixo reproduzido que apresenta um mapa com o objetivo de mostrar quais seriam esses municípios e destacou que a área coberta de azul representa os 1610 municípios onde a migração já está ocorrendo e a área coberta de verde representa para onde o processo expandirá, ou seja, os 1377 municípios selecionados:</p>  <p>Finalmente, o <b>Sr. Martim Jales Hon</b> apresentou a proposta de deliberação, conforme <i>slide</i> abaixo, afirmando que a proposta é a aprovação da lista de 1377 municípios, e ressaltou que o <b>Sr. Leandro Guerra</b> já trouxe essa tabela com o quantitativo de municípios por Estado, com destaque para Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná, que são os estados com a maior quantidade de municípios, afirmando que todos os estados, com exceção do Distrito Federal que já foi concluído, possuem município incluído para essa próxima fase:</p>

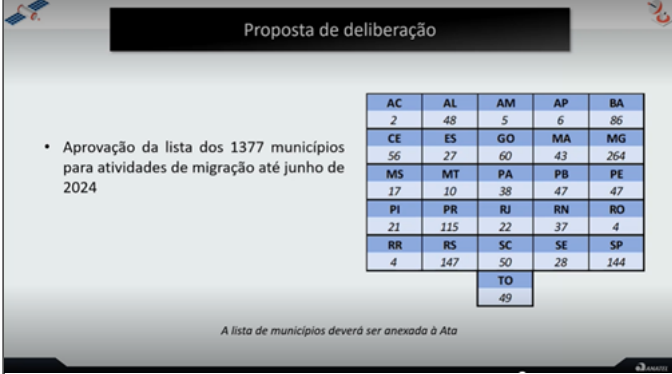Item	Descrição
	 <p>Concluída a apresentação, o <b>Presidente do GAISPI</b> questionou aos membros do GAISPI se possuíam dúvidas ou comentários em relação ao que foi apresentado.</p> <p>Não havendo manifestações, o <b>Presidente do GAISPI</b> colocou em deliberação a aprovação da lista de municípios para as atividades de migração até o mês de junho de 2024.</p> <p>Ausentes manifestações de discordância quanto à proposta, o <b>Presidente do GAISPI</b> declarou aprovada a lista com os 1377 municípios que deverão ter as atividades de migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita por meio de antenas parabólicas na banda C satelital para a banda Ku iniciadas até 30 de junho de 2024, com vistas à liberação do uso da faixa de 3.300 MHz a 3.700 MHz, conforme estabelecido no Edital do 5G.</p> <p>O <b>Presidente do GAISPI</b> reforçou que a aprovação se dá nos termos do item 5.10 das Diretrizes de Migração, em linha com a alínea “c” do item 6.3 do Anexo IV do Edital, e determinou que a <b>Secretaria Executiva do GAISPI</b> anexasse a lista de municípios à Ata da presente Reunião.</p> <p>Ato contínuo, o <b>Presidente do GAISPI</b> passou para o item 5 da Pauta.</p>

O **Presidente do GAISPI** cumprimentou o **Sr. Takeshi Ikeda, Coordenador Substituto do GT-DESOCUPAÇÃO**, e concedeu a palavra para que fizesse sua apresentação.

O **Sr. Takeshi Ikeda** cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e deu início à apresentação sobre o relato das atividades do **GT-DESOCUPAÇÃO**, informando que o grupo realizou sua 33ª Reunião no dia 17 de maio de 2023.

Sobre o acompanhamento das atividades da EAF, o **Sr. Takeshi Ikeda** destacou alguns trechos da apresentação do **Sr. Leandro Guerra** a seguir elencados:

- 1) Até o dia 16 de maio de 2023, foi realizada a mitigação preventiva de 11.880 estações FSS, o que representa 62%;
- 2) Até a 17ª Reunião Ordinária do GAISPI, realizada no dia 26 de abril de 2023, foram liberados 964 municípios;
- 3) Na presente Reunião Ordinária, está em deliberação a proposta de liberação de 459 municípios;
- 4) Os Relatórios da EAF estão anexados no Processo nº 53500.030696/2023-29; e
- 5) Com a deliberação prevista para esta Reunião Ordinária, o total de municípios liberados será de 1.423 municípios, que representa, aproximadamente, 25% do total de municípios do Brasil.

Em seguida, o **Sr. Takeshi Ikeda** projetou o *slide* abaixo reproduzido com um resumo das atividades do **GT-DESOCUPAÇÃO**, destacando que, até o momento, o total de municípios liberados abarca aproximadamente 131,5 milhões de habitantes e a liberação dos 458 municípios prevista para esta Reunião Ordinária acrescentará 6,5 milhões, totalizando aproximadamente 138 milhões de habitantes atendidos:

5



Concluída a apresentação, o **Presidente do GAISPI** questionou aos membros do GAISPI se possuíam algum comentário em relação ao que foi apresentado.


Não havendo manifestações, o **Presidente do GAISPI** informou que neste item não há deliberação e passou para o item 6 da Pauta.

6 O **Presidente do GAISPI** afirmou que, conforme apresentado pelo **Sr. Leandro Guerra** e pelo **Coordenador do GT-DESOCUPAÇÃO**, os requisitos que permitem deliberar a antecipação da liberação da faixa de 3,5 GHz em mais 459 cidades foram atingidos. Prosseguiu registrando que, conforme o item 6.3.1 do Anexo IV do Edital e a alínea “q” do item 9 do Anexo IV-A do Edital, caberia ao GAISPI decidir se o início do uso da faixa de 3,5 GHz poderá ser antecipado, individualmente por município ou por polígonos.

O **Presidente do GAISPI**, dessa forma, considerando o exposto, colocou em deliberação proposta para antecipação da liberação do uso da faixa de radiofrequências de 3.300 MHz a 3.700 MHz a partir do dia 30 de maio de 2023 nas 459 cidades apresentadas, questionando se todos estariam de acordo com a proposta.

Não havendo manifestações, o **Presidente do GAISPI** declarou que fica aprovada a antecipação da liberação do uso da faixa de radiofrequências de 3.300 MHz a 3.700 MHz a partir do dia 30 de maio de 2023 nas 459 cidades já apresentadas. Também determinou que a **Secretaria Executiva do GAISPI** anexasse a lista dessas cidades à Ata da presente Reunião.

Na sequência, o **Presidente do GAISPI** informou que, até o momento, já contam com 1423 municípios liberados para utilização da faixa de 3,5 GHz por estações do 5G *standalone*, e que, com isso, até o momento, a população destas cidades totaliza pouco mais de 138 milhões de brasileiros, representando 64,7% da população do País, que agora possui potencial de atendimento pelas prestadoras, nos prazos que seus modelos estratégicos e de investimentos considerarem mais oportunos.

Item	Descrição
	<p>O <b>Presidente do GAISPI</b> ressaltou que é importante lembrar que essas antecipações em nada alteram o cronograma de atendimento das obrigações de instalação de ERBs, que continua como previsto no Edital, tanto para cidades maiores como para as de menor população.</p> <p>Ato contínuo, o <b>Presidente do GAISPI</b> passou para o item 7 da Pauta.</p>
	<p>O <b>Presidente do GAISPI</b> solicitou ao <b>Sr. Sidney Azeredo Nince, Coordenador do GT-PAIS</b>, que fizesse o relato sobre as atividades do grupo.</p> <p>O <b>Sr. Sidney Azeredo Nince</b> cumprimentou a todos os presentes, inicialmente, e informou que faria um breve relato das atividades do <b>GT-PAIS</b>, acrescentando alguns detalhes ao que já foi apresentado pelo <b>Sr. Leandro Guerra</b>.</p> <p>Na sequência, projetou o <i>slide</i> abaixo transcrito que reporta as atividades que foram executadas e que se encontram em execução, e realizou a leitura das informações nele contidas:</p>  <p>7 Sobre o <i>slide</i> em apreço, o <b>Sr. Sidney Azeredo Nince</b> destacou:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Quanto ao Item 1 (<b>RFP cabos ópticos</b>), que a previsão de entrega em agosto já conta com uma antecipação de cerca de 10 dias em relação à previsão anterior, o que indica o bom andamento desse processo de fabricação e transporte dos cabos subaquáticos; e</li> <li>2) Quanto ao Item 2 (<b>CMAD</b>), que o grupo tem acompanhado a evolução do processo de fabricação dos <i>containers</i> que estão em uma boa velocidade.</li> </ol> <p>O <b>Sr. Sidney Azeredo Nince</b> acrescentou a informação de que foram iniciadas as tratativas com os órgãos que precisam de autorizações e termos de doação de uso de solo para que tenham uma implantação de acordo com o cronograma, contando com a participação do <b>Presidente do GAISPI</b>. Informou também que estariam em contato com o IBAMA e o DNIT, para iniciar essas tratativas tanto de licenciamentos, autorizações e permissões, quanto da emissão dos termos de uso de solo que permitem a instalação das caixas de ancoragem e os <i>containers</i> em cada terreno e em cada município.</p> <p>O <b>Sr. Sidney Azeredo Nince</b> concluiu registrando que, além disso, o Ministério das Relações Exteriores foi comunicado a respeito da situação já relatada sobre o lançamento de cabo na divisão entre o Brasil e o Peru, e que estariam aguardando uma confirmação do Ministério no sentido de que houve essa comunicação oficial aos órgãos competentes no Peru.</p> <p>Concluída a apresentação, o <b>Presidente do GAISPI</b> se dirigiu ao <b>Sr. Leandro Guerra</b> para salientar que não sabia qual seria a data em que seriam lançados esses três cabos nas infovias, e registrou que gostaria que, antes de sua saída, fosse convidado para essa inauguração. Sobre esse ponto, o <b>Sr. Sidney Azeredo Nince</b> esclareceu que, segundo o cronograma, o lançamento está previsto para o mês de setembro, sem definição de qual seria a semana.</p> <p>O <b>Presidente do GAISPI</b> agradeceu o esclarecimento prestado pelo <b>Sr. Sidney Azeredo Nince</b> e, em seguida, questionou aos membros do GAISPI se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apresentado.</p> <p>Não havendo manifestações, o <b>Presidente do GAISPI</b> passou para o item 8 da Pauta.</p>
	<p>O <b>Presidente do GAISPI</b> concedeu a palavra ao <b>Sr. Henrique Gomes Pinheiro, Coordenador do GT-COM</b>, cumprimentando-o.</p> <p>O <b>Sr. Henrique Gomes Pinheiro</b> cumprimentou, inicialmente, o <b>Presidente do GAISPI</b> e os demais presentes, e informou que o <b>GT-COM</b> realizou a reunião do grupo no dia 18 de maio de 2023 e os assuntos tratados foram o acompanhamento da campanha pela EAF e o início da atividade do <i>WhatsApp</i>.</p> <p>Sobre este último assunto, o <b>Sr. Henrique Gomes Pinheiro</b> destacou que a atividade do <i>WhatsApp</i> era muito esperada, um pedido antigo do grupo, e que os atendimentos estão sendo realizados sem que haja a divulgação do número da EAF no <i>WhatsApp</i>. Em suas palavras, essa ferramenta já se mostra bastante relevância e importância na execução do projeto.</p> <p>No tocante à possibilidade de codificação da banda C, segundo o relato do <b>Sr. Martim Jales Hon</b>, o <b>Sr. Henrique Gomes Pinheiro</b> informou que o <b>GT-COM</b> discutiu com as empresas radiodifusoras que, por sua vez, demonstraram o desejo em encerrar a transmissão antes do prazo previsto, no sentido de enviares os esforços necessários para aumentar a campanha de informação aos seus espectadores acerca do desligamento do sinal na banda C e da continuidade do sinal digital e, assim, permitir que o seu público possa acompanhar o processo.</p> <p>O <b>Sr. Henrique Gomes Pinheiro</b> relatou que a EAF apresentou ao grupo dois vídeos, com a duração de 2 minutos cada, de uma série de oito vídeos que estão sendo produzidos, que narram o depoimento de beneficiários que receberam o benefício e, posteriormente, eles serão adaptados para transmissão na TV.</p> <p>Em seguida, o <b>Sr. Henrique Gomes Pinheiro</b> reproduziu aos presentes um dos vídeos que, em sua visão, materializa todo o processo de migração sob o ponto de vista do consumidor, seja ele da área rural ou urbana, com a possibilidade de incrementar os números de instalações.</p> <p>Concluída a apresentação, o <b>Presidente do GAISPI</b> parabenizou a equipe do <b>GT-COM</b> e a EAF e questionou aos membros do GAISPI se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apresentado.</p> <p>Concedida a palavra, o <b>Sr. Leandro Guerra</b> agradeceu ao <b>Sr. Henrique Gomes Pinheiro</b> pela apresentação do vídeo e à equipe da <b>Sra. Patrícia Abreu</b> e ressaltou que ele representa a importância do trabalho realizado pela EAF, em parceria com todos os participantes do GAISPI, para chegar até esses rincões.</p> <p>Em seguida, o <b>Presidente do GAISPI</b> agradeceu a EAF e a todos os membros do GAISPI e destacou que estão muito próximos de atingir a promessa de 1.610 municípios aptos até o final do mês de junho, sendo motivo de muito orgulho para todo o Grupo.</p> <p>Não havendo mais manifestações, o <b>Presidente do GAISPI</b> passou para o item 9 da Pauta.</p>
9	<p>O <b>Presidente do GAISPI</b> questionou aos membros do GAISPI presentes se possuíam algum assunto que quisessem tratar na presente Reunião.</p> <p>Não havendo manifestações, o <b>Presidente do GAISPI</b> aproveitou a oportunidade para agradecer e parabenizar a todo o Grupo e a EAF e afirmou que estão próximos de atingir a meta, que são os 1610 municípios aptos até o final do mês de junho e que isso seria motivo de muito orgulho para</p>



Item	Descrição
	todos. Ato contínuo, o <b>Presidente do GAISPI</b> passou para o item 10 da Pauta.
10	O <b>Presidente do GAISPI</b> propôs que a próxima Reunião Ordinária do GAISPI seja realizada no dia 21 de junho de 2023 (quarta-feira) às 10:00h, de forma remota. Questionou aos membros do GAISPI se estariam todos de acordo com essa data. Não havendo manifestações, o <b>Presidente do GAISPI</b> declarou que fica definida a data da 19ª Reunião Ordinária do GAISPI para o dia 21 de junho de 2023 (quarta-feira) às 10:00h, de forma remota. Concluídos os assuntos constantes da Pauta, o <b>Presidente do GAISPI</b> agradeceu a presença de todos os membros e declarou encerrada a 18ª Reunião Ordinária do Grupo.

4. **APROVAÇÃO**

Segue a presente Ata de Reunião assinada eletronicamente pelos participantes acima identificados e aprovada na 19ª Reunião Ordinária do GAISPI, realizada em 21 de junho de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Emanuel de Azevedo Gonçalves, Usuário Externo**, em 22/06/2023, às 11:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Wagner Zanini Barreira, Usuário Externo**, em 22/06/2023, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Soares Campos, Usuário Externo**, em 22/06/2023, às 15:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Concolato Mejias, Usuário Externo**, em 26/06/2023, às 18:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Carlos Abrahao, Usuário Externo**, em 28/06/2023, às 12:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Katia Costa da Silva Pedroso, Usuário Externo**, em 04/07/2023, às 12:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Franco Costa de Alencar, Usuário Externo**, em 04/07/2023, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Vitor Elísio Goes de Oliveira Menezes, Usuário Externo**, em 07/07/2023, às 19:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Monique Pereira Ibitinga de Barros, Diretora de Planejamento Regulatório**, em 14/07/2023, às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Oliveira Caram Guimarães, Secretário do Grupo**, em 03/08/2023, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Otávio Viegas Caixeta, Usuário Externo**, em 13/08/2023, às 19:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <http://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10358992** e o código CRC **A4BF2A11**.
