



REGISTRO DE REUNIÃO

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DAS SOLUÇÕES PARA OS PROBLEMAS DE INTERFERÊNCIA NA FAIXA DE 3.625 A 3.700 MHZ - GAISPI

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GAISPI

Data	Horário de Início	Horário de Término	Local
30 de julho de 2024.	09:54	12:03	Plataforma Teams

1. PARTICIPANTES
- 1.1. Membros do GAISPI:

FUNÇÃO	MEMBRO	NOME	Presente na reunião?
Presidente do GAISPI	-	Carlos Manuel Baigorri	SIM
Secretário Executivo do GAISPI	-	Vinicius Oliveira Caram Guimarães	SIM
Representante do Ministério das Comunicações	Titular	Wilson Diniz Wellisch	SIM
	Suplente	Maximiliano Salvadori Martinhão	NÃO
Representantes da Proponentes Vencedoras dos Lotes do Tipo B	Titular	Antônio Oscar de Carvalho Petersen	NÃO
	Suplente	Monique Pereira Ibitinga de Barros	SIM
	Titular	Camilla Tedeschi de Toledo Tapias	NÃO
	Suplente	Anderson Emanuel de Azevedo Gonçalves	SIM
	Titular	Mario Girasole	NÃO
	Suplente	Marcelo Concolato Mejias	NÃO
Representantes dos Radiodifusores	Titular	Flavio Ferreira de Lara Resende	SIM
	Suplente	Cristiano Reis Lobato Flores	NÃO
	Titular	Márcio Silva Novaes	NÃO
	Suplente	Samir Amando Granja Nobre Maia	SIM
	Titular	Luiz Carlos Abrahão	SIM
	Suplente	Carlos Eduardo Neiva Melo	SIM
Representantes das Exploradoras de Satélites	Titular	Lincoln Amazonas Antunes de Oliveira	SIM
	Suplente	Michelle Machado Caldeira	NÃO
	Titular	Fabio Franco Costa de Alencar	SIM
	Suplente	Luis Fernando Barros Costa Fernandes	NÃO
	Titular	Márcio André de Assis Brasil	NÃO
	Suplente	Rodrigo Soares Campos	SIM
Representantes das Proponentes Vencedoras dos Lotes C1 a C8 e D1 a D32	Titular	José Roberto Nogueira	NÃO
	Suplente	Katia Costa da Silva Pedroso	NÃO
	Titular	Margaret de Almeida Cadête Moonsammy	SIM
	Suplente	Wagner Zanini Barreira	NÃO
	Titular	Vitor Elísio Góes de Oliveira Menezes	SIM

FUNÇÃO	MEMBRO	NOME	Presente na reunião?
	Suplente	Mariana Rezende	NÃO

1.2. Outros Participantes:

Nome	Órgão/Instituição/Empresa
Chirlene Silva	Anatel (terceirizada)
Henrique Gomes Pinheiro	Anatel/APC - Coordenador do GT-COM
Lauro Leandro Rutkowski	Anatel
Leandro Enrique Lobo Guerra	EAF
Patrícia de Oliveira Abreu	EAF
Paula Fontelles do Valle	Anatel/SOR
Takeshi Ikeda	Anatel
Karine Karine Medeiros Dias	Anatel
Marcos Vieira Baeta Neves	Anatel/SOR -Coordenador do GT-REDE
Ricardo Lamongi Dieckmann	EAF
Paulo Roberto Cruz Cozza	EAF
Antonio Celso Guimaraes Teixeira	MCOM
Wagner Souza	Cloud2u
Sala 5G	EAF
Sebastiao Sergio De Oliveira Junior	TIM
Renato Gomes Alves de Oliveira	mCOM
Silvio Artur Meira Starling	EAF
Dulcideo Elias Oliveira Pedrosa	EAF
Hermano Barros Tercius	MCOM

2. PAUTA

Item	Descrição
1	ITEM 1 DA PAUTA: APROVAÇÃO DA ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024.
2	ITEM 2 DA PAUTA: INFORME DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE ADMINISTRADORA DA FAIXA DE 3,5 GHz (EAF).
3	ITEM 3 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE MIGRAÇÃO E MITIGAÇÃO – GT-MIGRAÇÃO.
4	ITEM 4 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO SOBRE A ANTECIPAÇÃO DE CIDADES PARA A LIBERAÇÃO DO USO DA FAIXA DE RADIOFREQUÊNCIAS DE 3.300 MHZ A 3.700 MHZ.
5	ITEM 5 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO SOBRE A REDISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KITS COM PARABÓLICA DIGITAL À POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
6	ITEM 6 DA PAUTA: ESTUDO PARA DISTRIBUIÇÃO DE NOVOS KITS BANDA KU PARA FAMÍLIAS DO CADÚNICO SEM SINAL DE TV TERRESTRE. ITEM RETIRADO DE PAUTA.
7	ITEM 7 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO – GT-F.
8	ITEM 8 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DO PROGRAMA AMAZÔNIA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL – GT-PAIS.
9	ITEM 9 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE REDE PRIVATIVA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL – GT-REDE.
10	ITEM 10 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO SOBRE OS PONTOS DA REDE FIXA DA REDE PRIVATIVA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
11	ITEM 11 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO SOBRE O PROJETO DE REDE MÓVEL DA REDE PRIVATIVA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
12	ITEM 12 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO – GT-COM.
13	ITEM 13 DA PAUTA: OUTROS ASSUNTOS.
14	ITEM 14 DA PAUTA: DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE AGOSTO DE 2024.

3. RELATO DA REUNIÃO

Item	Descrição
Saudação	O Presidente do GAISPI, Sr. Carlos Manuel Baigorri, deu boas-vindas e agradeceu a presença de todos e, antes de dar início aos trabalhos da 30ª Reunião Ordinária, afirmou que gostaria de registrar a retirada do item 6 da Pauta e a inclusão de novo item na Pauta desta Reunião para que seja realizado o Informe das atividades do Grupo Técnico de Comunicação (GT-COM). Informou que, para tanto, seria incluído novo item 12 da Pauta, renumerando-se os itens subsequentes. O Presidente do GAISPI registrou, ainda, a participação de Representante Excepcional, a saber: - Sr. Sebastião Sérgio de Oliveira Júnior representando o Sr. Mário Girasole. Informou também que a devida procuração foi encaminhada à Secretaria Executiva do GAISPI e determinou o registro em Ata. Feitos os esclarecimentos iniciais, o Presidente do GAISPI passou para o item 1 da Pauta.
1	O Presidente do GAISPI informou não foram recebidas solicitações ou manifestações sobre a minuta da Ata previamente circulada. Desta forma, questionou aos membros do GAISPI se existiriam ajustes em relação à versão encaminhada do documento. Não havendo manifestações contrárias, o Presidente do GAISPI declarou que fica aprovada a Ata da 29ª Reunião Ordinária do GAISPI e, ato contínuo, passou para o item 2 da Pauta.
2	O Presidente do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Leandro Guerra, para que fizesse um breve relato sobre as atividades da EAF ao Grupo. O Sr. Leandro Guerra cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes e passou a projetar uma apresentação, cuja agenda do Informe das atividades da EAF abordou os seguintes itens: - I – Migração TVRO; - II – Fase 5 e Planejamento Fase 6; - III – Municípios com limpeza da faixa 3,5 GHz concluída; - IV – Planejamento TVRO – Plano de Aceleração de Instalação; - V – Status GT-Financeiro; - VI – Projeto PAIS; e - VII – Projeto Rede Privativa de Governo. Sobre o primeiro item de sua agenda, <u>Migração TVRO</u>, o Sr. Leandro Guerra projetou o <i>slide</i> abaixo reproduzido que apresenta um gráfico que mostra a evolução da base de TVRO, com o acumulado de instalações realizadas mensalmente:

https://sei.anatel.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13999873&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001283&infra_hash=12... 4/50

2. Fase V e Planejamento VI – Cronograma Macro (624+1.268 Municípios)

FASES V e VI

Conclusão 100% das Estações

Início comunicação, atendimento e instalação

Codificação do sinal digital na Banda C

Operação

TIPO

ETAPAS:

FASE V – 624 Municípios

Estados atendidos 100%
A: MA ES SE
B: PI RO TO
C: AC AM GO

FASE VI – 1.268 Municípios

Estados atendidos 100%
B: MS
C: MT PA PR
D: MG
E: CE RN PE
F: BA

EAFF

Item	Descrição
	2. Redistribuição de KITS para a população afetada pelas chuvas - RS  SITUAÇÃO NOS MUNICÍPIOS Municípios afetados: 478/ 497 População afetada: 2.398.255 Boletim de 29/07/24 Portal SOS RS Situação nos municípios - SOS Rio Grande do Sul (sosenchentes.rs.gov.br) Redistribuição - Concessão Especial do KIT/Antena para todos beneficiários que tiveram o KIT/Antena instalados até 09/05/24 com validação do CR e do Instalador da perda ou não funcionamento do equipamento. - Os Beneficiários elegíveis que não tiveram o KIT/Antena instalados até 09/05/24, o procedimento permanece inalterado. - As instalações associadas a Redistribuição serão contabilizados de forma distinta. Custo - Total de Beneficiários impactados aproximado: 20,6 mil - Custo máximo aproximado: R\$13.400.000 Conclusão PFE Recomenda-se que seja feita uma avaliação em campo de modo a identificar aqueles que realmente foram atingidos, <u>mais especificamente aqueles cujos kits tenham sido perdidos ou estiverem sem funcionamento</u>, e que, portanto, serão amparados pela presente proposta. 35. Importante apenas destacar que, considerando que a Licitação nº 1/2021-SOR/SPR/CD-ANATEL impôs diversos compromissos às proponentes vencedoras, consoante consignado por esta Procuradoria no Parecer nº 00409/2020/PFE-ANATEL/PGF/AGU, <u>deve-se garantir que não falem recursos para que os compromissos primários constantes do Edital sejam efetivamente cumpridos.</u>  Sobre esse tema, o Sr. Leandro Guerra afirmou que, a partir da deliberação do GAISPI, a entidade disparará os processos internos para que possam atender a população o mais breve possível. A respeito do planejamento da Fase 6, Sr. Leandro Guerra projetou o seguinte <i>slide</i> que mostra os 1.268 municípios distribuídos por Unidade da Federação e conforme o seu perfil populacional:

Item

Descrição

2. Planejamento Fase VI (1.268 Municípios)

Fase VI - População

(<=100k)	(Pool <=30k)
203	1.065

1.268

Localidades

BA	273
CE	64
MG	396
MS	28
MT	77
PA	59
PE	101
PI	184
RN	86

EA

F

Na sequência, o **Sr. Leandro Guerra** apresentou o planejamento da Fase 6-C com os 194 municípios em que a EAF passará a operar a partir do mês de agosto e a sua divisão por Unidades da Federação e ainda de acordo com o seu perfil populacional:

https://sei.anatel.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13999873&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001283&infra_hash=12...

7/50

Item

Descrição

2. Planejamento Fase VI - C (194 Municípios)

Fase VI - C

(<=100k)	(Pool <=30k)
64	130

194

Localidades

CE	24
MT	67
PA	51
PI	52

EA

F



O Sr. **Leandro Guerra** também apresentou a relação dos 194 municípios que serão atendidos no mês de agosto, conforme os *slides* abaixo:

https://sei.anatel.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13999873&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001283&infra_hash=12...

8/50

https://sei.anatel.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13999873&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001283&infra_hash=12... 9/50



Item

Descrição

3. Municípios com limpeza da faixa de 3.5 GHz concluída

Julho/24 – Fase VI A (315 Municípios)

UF	Município
MT	Novo Santo Antônio
MT	Ponte Branca
MT	Santa Cruz do Xingu
MT	Serra Nova Dourada
PA	Bananeal
PA	Cachoeira do Piauí
PA	Cumaru do Norte
PA	Jacareacanga
PA	Nova Esperança do Piauí
PA	Pau d'Arco
PA	Pimenta
PA	Santa Maria das Barreiras
PE	Buena Vista
PE	Camutanga
PE	Ferreiros
PE	Gracioso
PE	Lagoa do Carro
PE	Maranhão
PE	Ondão
PE	Quixaba
PE	Terra Nova
PI	Alagoinha do Piauí
PI	Alagreste do Piauí
PI	Alvarada do Gurgueia
PI	Angical do Piauí
PI	Antônio de Albuquerque
PI	Antônio Almeida
PI	Aracozinho
PI	Arceburgo
PI	Araripe
PI	Barra Grande do Piauí
PI	Barra do Piauí
PI	Bela Vista do Piauí
PI	Bomfim do Piauí

UF	Município
PI	Bomfim do Piauí
PI	Bocaina
PI	Bonfim do Piauí
PI	Brasão do Piauí
PI	Buriti dos Montes
PI	Cajazeiras do Piauí
PI	Caldeirão Grande do Piauí
PI	Campina do Piauí
PI	Campo Alegre do Fidalgo
PI	Campo Grande do Piauí
PI	Campo Largo do Piauí
PI	Candiba
PI	Capitão Gervásio Oliveira
PI	Caracol
PI	Carvalhas do Piauí
PI	Caridade do Piauí
PI	Casimiro
PI	Casa de Tábua
PI	Colônia do Gurgueia
PI	Colônia do Piauí
PI	Conceição do Canindé
PI	Coronel José Dias
PI	Cristalândia do Piauí
PI	Curimatã
PI	Currais
PI	Curral Novo do Piauí
PI	Direção Arcoverde
PI	Dom Expedito Lopes
PI	Domingos Mourão
PI	Eliseu Martin
PI	Estância do Piauí
PI	Floresta do Piauí
PI	Francinópolis
PI	Francisco Ayres
PI	Francisco Macedo
PI	Francisco Santos

UF	Município
PI	Genorário
PI	Hugo Napoleão
PI	Itaúna Coelho
PI	Jacobina do Piauí
PI	Jardim do Muroto
PI	Jatobá do Piauí
PI	Jerumenha
PI	Jiló Costa
PI	José Marques
PI	Juazeiro do Piauí
PI	Julio Borges
PI	Jurema
PI	Lagoa de São Francisco
PI	Lagoa do Sítio
PI	Lamelo Sales
PI	Madreiros
PI	Marcolândia
PI	Marechal Faccini
PI	Massapé do Piauí
PI	Milho Branco
PI	Monte Alegre do Piauí
PI	Monte Castelo do Piauí
PI	Morro do Chapéu do Piauí
PI	Murilo dos Pontes
PI	Nazário do Piauí
PI	Nossa Senhora dos Remédios
PI	Novo Oriente do Piauí
PI	Novo Santo Antônio
PI	Padre Marcos
PI	Pais Landim
PI	Pagão do Piauí
PI	Palmeira do Piauí
PI	Pangaré
PI	Parnaguá
PI	Patos do Piauí
PI	Parauapebas



Item

Descrição

3. Municípios com limpeza da faixa de 3.5 GHz concluída

Julho/24 – Fase VI A (315 Municípios)

UF	Município
PI	Pedra Laurentina
PI	Novo Santa Rita
PI	Pimenteira
PI	Porto Alegre do Piauí
PI	Redenção do Gurguia
PI	Rio do Frio
PI	Ribeira do Piauí
PI	Ribeiro Gonçalves
PI	Rio Grande do Piauí
PI	Santa Cruz do Piauí
PI	Santa Cruz dos Milagres
PI	Santa Luz
PI	Santana do Piauí
PI	Santa Rosa do Piauí
PI	Santo Antônio de Lisboa
PI	Santo Antônio dos Milagres
PI	Santo Inácio do Piauí
PI	São Braz do Piauí
PI	São Félix do Piauí
PI	São Francisco de Assis do Piauí
PI	São Francisco do Piauí
PI	São Gonçalo do Gurguia
PI	São Gonçalo do Piauí
PI	São João da Canabrava
PI	São João da Fronteira
PI	São João da Varzea
PI	São João do Arraial
PI	São José do Divino
PI	São José do Pinheiro
PI	São José do Piauí
PI	São Julião
PI	São Lourenço do Piauí
PI	São Luís do Piauí
PI	São Miguel do Fidalgo
PI	Sebastião Barros
PI	Sebastião Leal

UF	Município
PI	Secorro do Piauí
PI	Sussupara
PI	Tamboril do Piauí
PI	Tenque do Piauí
PI	Várzea Branca
PI	Vera Mendes
PI	Vila Nova do Piauí
PI	Wall Ferraz
RN	Antônio Martins
RN	Bela
RN	Campo Redondo
RN	Caruolha dos Dantas
RN	Centro Corá
RN	Coronel Espíndola
RN	Cruzeta
RN	Esapele
RN	Fernanda Pedreira
RN	Florânia
RN	Iguatira
RN	Itajá
RN	Jaguará
RN	Jardaira
RN	Jardulu
RN	Jupi
RN	Jardim de Piranhas
RN	Jardim do Seridó
RN	João Dias
RN	José da Penha
RN	Lagoa d'Anta
RN	Lagoa Pretinha
RN	Lucécia
RN	Major Sales
RN	Marcelino Vieira
RN	Messias Targino
RN	Monte das Gameleiras
RN	Oito d'Água do Borges

UF	Município
RN	Ourô Branco
RN	Paraná
RN	Paraná
RN	Passo e Fica
RN	Patu
RN	Pilões
RN	Riocha da Cruz
RN	Riocha de Santana
RN	Rodolfo Fernandes
RN	São Benedito
RN	Santana do Matos
RN	Santana do Seridó
RN	São Fernando
RN	São José do Seridó
RN	São Rafael
RN	São Tomé
RN	São Vicente
RN	Serinha dos Pinhos
RN	Servilano Melo
RN	Silva Nogueira
RN	Tabeleiros Grande
RN	Tombete Laurentino Cruz
RN	Tombete dos Barbas
RN	Trinidade Portugal
RN	Vinha Verde
RN	Vizinha



https://sei.anatel.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13999873&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001283&infra_hash=1... 14/50

https://sei.anatel.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13999873&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001283&infra_hash=1... 15/50

Item

Descrição

3. Panorama Geral Liberação Faixa 3,5 GHz (30/07/2024)

4.808

Localidades

AC	22
AL	102
AM	62
AP	16
BA	152
CE	185
DF	1
ES	78
GO	246
MA	217
MG	699
MS	79
MT	74
PA	83
PB	223
PE	93
PI	172
PR	399
RJ	92
RN	135
RO	52
RS	15
SC	295
SE	75
SP	645
TO	199

REALIZADO – EDITAL

Fase I (Capitais)	100%
Fase II (≥500k)	100%
Fase III (≥200k)	100%
Fase IV (≥100k)	100%
Fase VI (≥30k)	76% 645 Municípios
Fase VI-B (≥10k)	76% 3.331 Municípios

A EAF realizou a limpeza da faixa de 3,5 GHz e está realizando a migração TVRO em 4.808 municípios

Estados 100% liberados pela EAF – RS, SC, PR, AP, RR, AL, DF, SP, RJ, ES, MA, SE, PB, RO, TO, AC, AM, GO e MS

LEGENDA

Cenário com a liberação dos 506 municípios da Fase VI-A e Fase VI-B totalizando 4.808 municípios

OBRIGAÇÃO – EDITAL

27 Municípios até 28/10/22	✓
26 Municípios até 01/01/23	✓
102 Municípios até 30/06/23	✓
171 Municípios até 30/06/24	✓
648 Municípios até 01/01/26	✓
4.396 Municípios	✓
• 25% até 30/06/23 – Fase II;	
• 50% até 30/06/24 – Fase IV;	
• 75% até 30/06/25 – Fase V;	
• 100% até 01/01/26 – Fase VI	

78%
(3.690)

87%
(3.822)

4.808

EAF

Dando prosseguimento ao seu informe, o **Sr. Leandro Guerra** passou para o quarto item da agenda, **Planejamento TVRO – Plano de Aceleração de Instalação**, e exibiu o gráfico abaixo reproduzido, reforçando que já seria de conhecimento do GAISPI:

https://sei.anatel.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13999873&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001283&infra_hash=1... 17/50

Item

Descrição

5. Status GT Financeiro

Rateio e Consumo do Projeto

Projeto	Base Rateio	% Rateio	Valor Rateado	Total com Rateio
Total	(1.247)	100,0%	(40)	(1.287)
TVRO	(1.037)	83,1%	(33)	(1.070)
FSS	(34)	2,7%	(1)	(35)
PAIS + REDE PRIVATIVA	(177)	14,2%	(6)	(182)
PAIS	(188)	15,0%	(5)	(193)
REDE PRIVATIVA	(9)	0,7%	(0)	(9)

Critério de Rateio

- Inclusão de toda a despesa de comunicação, Call center e de TI (softwares e serviços) no projeto TVRO
- Inclusão dos valores incorridos do PAIS e Rede Privativa que são ESTOQUE no custo dos respectivos projetos
- Demais despesas rateadas em função dos % calculados ao lado

Projeto	Valor Aportado	Consumo 2022	Consumo 2023	Consumo Projeto	Saldo do Projeto	% Saldo
Total	6.313	(222)	(1.287)	(1.509)	4.804	76,10%
TVRO	3.580	(159)	(1.070)	(1.229)	2.301	64,27%
FSS	391	(55)	(35)	(90)	301	76,90%
PAIS + REDE PRIVATIVA	2.342	(7)	(182)	(190)	2.152	91,89%
PAIS	1.345	(4)	(173)	(177)	1.168	86,92%
REDE PRIVATIVA	998	(3)	(9)	(13)	985	98,70%

EA

F

Na sequência, o Sr. Paulo Roberto Cruz Cozza apresentou o orçamento feito pela entidade para o ano de 2024, ressaltando que a primeira versão feita pela EAF não tinham sido incluídas as cidades que estão sendo antecipadas no mês de julho, de modo que foi feito esse ajuste, nos termos das premissas apontadas no *slide* abaixo reproduzidos:

Item	Descrição
5. Status GT Financeiro – Orçamento 2024 Premissas Documento modificado pela última vez: ter às 16:13 RH 96 HC FSS Instalações – Apenas “rescaldo” Equipamentos – Apenas “rescaldo” Rede Privativa Previsão de Início da construção da Rede Móvel e Fixa FINANCEIRO IPCA – 3,87% USD – R\$ 5,00 SELIC – 0,8% am *Base Relatório Focus – 25/08/2023 PIS/COFINS – Regime não cumulativo PIS/COFINS (Operacional) – 9,25% PIS/COFINS (Financeiro) – 4,65% IRPJ/CSLL (Financeiro) – 34,00% COMUNICAÇÃO Cidades atendidas – 2.491 ATENDIMENTO Quantidade média de PA's – 1.488 Quantidade de PA's em dez/24 – 1.500 TVRO Instalações – 2.700k Equipamentos (Kits) – 2.700k PAIS Infovia 02 – Entrega Infovia 03 – Entrega Infovia 04 – Instalação Infovia 05 – Cabos e EVR Infovia 06 – Cabos e EVR Infovia 08 – Cabos e EVR	
Sobre o orçamento de 2024, o Sr. Paulo Roberto Cruz Cozza fez os seguintes destaques: 1) Rede Privativa: informou que os números foram postergados, visto que, até o mês de junho, a entidade não havia feito nada ainda em função das indefinições dessa construção, de modo que houve uma redução desse orçamento; 2) Atendimento: informou que houve uma redução na quantidade PA's para 1.500, sob o argumento de que estariam fazendo alguns ajustes no CRM, com a implementação de um CRM novo e desenvolvido em casa e que trará alguns ganhos importantes e redução no custo; 3) TVRO: informou que elevaram o número de instalações para 2.700k, considerando a entrada das novas cidades. Assim, o Sr. Paulo Roberto Cruz Cozza apresentou ao grupo o Orçamento de 2024, destacando as informações referentes às colunas “Orçado 2024” e “Consumo Projeto”, contidas no seguinte <i>slide</i>:	

Item

Descrição

5. Status GT Financeiro – Orçamento 2024

DRE	Orçamento 2024	Real 2023	Varição
Receita Diferida Líquida	2.061	1.111	(950)
TJFO	1.836	1.070	(766)
PSS	3	35	32
PAS	222	5	(217)
REDE PRIVATVA	0	0	0
Custo	(1.766)	(909)	857
TJFO	(1.566)	(875)	692
PSS	(3)	(34)	(31)
PAS	(215)	0	215
REDE PRIVATVA	0	0	0
Despesa	(275)	(201)	74
Compensação e Condição	(9)	(7)	2
Comunicação	(211)	(161)	49
Corporativa	(40)	(24)	16
Genf	(6)	(9)	3
Outros	(1)	0	1
Resultado Operacional	0	0	(0)
Resultado Financeiro	389	832	443
RPJ e CSL	(187)	(274)	(87)
Resultado do Exercício	202	558	357
ESTOQUE EM CONSTRUÇÃO	Orçamento 2024	Real 2023	Varição
TOTAL	698	177	(521)
PAS	307	106	(201)
REDE PRIVATVA	351	9	(342)
ATIVO FMO	Orçamento 2024	Real 2023	Varição
TOTAL	2	2	(0)
ADMINISTRATIVO	2	2	(0)

Rateio Custos Administrativos

Projeto	Base Rateio	% Rateio	Valor Rateado	Total com Rateio
Total	(1.995)	100,0%	389	(2.061)
TJFO	(1.778)	89,1%	(57)	(1.836)
PSS	(3)	0,1%	(0)	(3)
PAS + REDE PRIVATVA	(215)	10,8%	(7)	(222)
REDE PRIVATVA	0	0,0%	0	0

Consumo Projeto

Projeto	Valor Aportado	Consumo Acumulado até 2023	Consumo 2024	Consumo Projeto	Saldo do Projeto	% Saldo
Total	6.313	(1.509)	(2.719)	(4.228)	2.085	33%
TJFO	3.589	(1.229)	(1.822)	(3.050)	529	15%
PSS	391	(90)	(3)	(93)	298	76%
PAS + REDE PRIVATVA	2.342	(190)	(894)	(1.084)	1.258	54%
PAS	1.245	(177)	(535)	(712)	533	43%
REDE PRIVATVA	898	(113)	(359)	(372)	525	59%

ORÇAMENTO TOTAL
(Custo + Despesas + Estoque + Capex + Impostos)

R\$ 2.897 Milhões

EAF

Na sequência, o Sr. Paulo Roberto Cruz Cozza exibiu o fluxo de caixa previsto no Orçamento de 2024, realizando a leitura das informações dispostas no slide abaixo:

5. Status GT Financeiro – Orçamento 2024

Fluxo de Caixa

Créditos	Orçamento 2024	Real 2023	Varição
Saldo Inicial	6.829	6.811	17
Receita Financeira	408	633	225
TOTAL	7.237	7.444	207
Debitos	Orçamento 2024	Real 2023	Varição
Impostos	(922)	(971)	49
Compra Equipamentos	(1.147)	(420)	727
PAS + Rede Privata	(532)	(573)	41
Publicidade	(536)	(567)	31
Taxas	(210)	(260)	50
Outros	(244)	(181)	63
TOTAL	(3.591)	(2.992)	599
Saldo Final	3.646	4.452	806

EAF

Finalizadas as informações sobre o Orçamento de 2024, o Sr. Paulo Roberto Cruz Cozza passou a reportar os resultados consolidados do 2º Trimestre de 2024, para evitar a repetição de números, conforme slide a seguir:

Item

Descrição

5. Status GT Financeiro – Resultado 2º Tri/2024

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2º TRI/2024

R\$ mil				R\$ mil			
ATIVO				DRE			
Grupos Contábeis	Jun/24	Jun/23	Varição	Grupos Contábeis	Jun/24	Jun/23	Varição
Caixa e banco	174	5	171	Receita Operacional Líquida	841.784	381.589	460.196
Depósitos Financeiros	5.217.768	4.459.335	(3.431.545)	Cartas de produção entregues	(241.898)	(141.990)	(100.308)
Deposito a receber	305.001	44.370	45.630	Despesas com pessoal	(23.202)	(16.668)	(6.534)
Adiantamentos	27.382	44.233	209.448	Anuenciagem e frete	(37.902)	(14.387)	(23.515)
Estoque	452.035	180.271	271.764	Cartas de notificação	(340.407)	(108.088)	(232.319)
Outros ativos circulantes	232	22	210	Consultorias e auditorias	(4.602)	(1.727)	(2.875)
Ativo Circulante	5.945.446	6.954.021	(1.008.575)	Publicidade	(96.247)	(74.093)	(22.154)
De Errendia	835	0	835	Outros despesas operacionais	(71.402)	(12.642)	(58.760)
Embalagens	2.018	1.784	234	Custos e Despesas Operacionais	(841.784)	(181.589)	(460.195)
Ativo Não Circulante	2.872	1.786	1.086	Resultado Operacional	0	0	0
ATIVO TOTAL	5.945.446	6.954.021	(1.008.575)	Resultado Financeiro	293.055	428.309	(135.254)
PASSIVO				SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			
Grupos Contábeis	Jun/24	Jun/23	Varição	Superávit e C&L	2024	2023	Varição
Prestado e empenho a pagar	15.511	9.002	12.509		(153.964)	82.412	(236.376)
Tributos	52.411	95.384	(42.973)				
Fornecedores	456.426	573.255	283.339				
Passivo Circulante	513.348	277.641	235.697				
Projetos e Realizar	4.293.918	6.031.537	(1.737.619)				
Passivo Não Circulante	4.293.918	6.031.537	(1.737.619)				
Superávit acumulado em exercícios anteriores	161.271	361.647	(200.376)				
Superávit acumulado no exercício atual	180.910	274.743	(93.833)				
Patrimônio Social	342.181	636.390	(294.209)				
PASSIVO TOTAL	5.945.446	6.954.021	(1.008.575)				

Em relação ao *slide* acima, o Sr. Paulo Roberto Cruz Cozza informou que os grandes impactos seriam na parte de adiantamento de estoque, onde se observa um estoque expressivo. Registrou que foi realizada a implantação, no mês de junho, do SAP, e que, com isso, estariam migrando toda a parte financeira da entidade para esse sistema. Relembrou que, antigamente, isso estava no escritório terceirizado e que, como o resultado do trabalho do escritório não estava a contento e o sistema utilizado pertencia a eles, acharam melhor trazer internamente, tendo, portanto, uma redução de custos. Informou, assim, que estariam com um adiantamento maior, pois não conseguiram dar entrada em todas as notas a tempo do pagamento e as notas estariam lançadas na conta do fornecedor, sendo que, no próximo trimestre, terão uma baixa dentro do sistema.

Ainda sobre os resultados do 2º Trimestre de 2024, o Sr. Paulo Roberto Cruz Cozza projetou o *slide* abaixo reproduzido e destacou as informações contidas na tabela, bem como as principais variações ocorridas nos projetos de TVRO, PAIS e Rede Privativa e no resultado financeiro:

Em relação ao *slide* acima, o **Sr. Paulo Roberto Cruz Cozza** informou que os grandes impactos seriam na parte de adiantamento de estoque, onde se observa um estoque expressivo. Registrou que foi realizada a implantação, no mês de junho, do SAP, e que, com isso, estariam migrando toda a parte financeira da entidade para esse sistema. Lembrou que, antigamente, isso estava no escritório terceirizado e que, como o resultado do trabalho do escritório não estava a contento e o sistema utilizado pertencia a eles, acharam melhor trazer internamente, tendo, portanto, uma redução de custos. Informou, assim, que estariam com um adiantamento maior, pois não conseguiram dar entrada em todas as notas a tempo do pagamento e as notas estariam lançadas na conta do fornecedor, sendo que, no próximo trimestre, terão uma baixa dentro do sistema.

Ainda sobre os resultados do 2º Trimestre de 2024, o **Sr. Paulo Roberto Cruz Cozza** projetou o *slide* abaixo reproduzido e destacou as informações contidas na tabela, bem como as principais variações ocorridas nos projetos de TVRO, PAIS e Rede Privativa e no resultado financeiro:

Item

Descrição

5. Status GT Financeiro – Resultado 2º Tri/2024

DRE	Orçado YTD JUN/24	YTD JUN/24	Variação	YTD JUN/23
Receita Diferida Líquida	934	868	(66)	126
TVRO	812	867	55	107
FSS	2	2	0	13
PAIS	0	0	0	5
REDE PRIVATIVA	0	0	0	5
Custo	(789)	(743)	46	(64)
TVRO	(786)	(740)	46	(56)
FSS	(3)	(3)	(0)	(7)
PAIS	0	(0)	(0)	(1)
REDE PRIVATIVA	0	0	0	(1)
Despesa	(145)	(127)	18	(63)
Compliance e Governança	(0)	(0)	1	(1)
Comunicação	(133)	(101)	32	(53)
Operativa	(20)	(17)	3	(6)
Serviço	(7)	(6)	1	(0)
Outros	0	(0)	(0)	(0)
Resultado Operacional	0	0	0	0
Resultado Financeiro	234	293	59	238
IRPJ e CRL	(184)	(101)	83	(70)
Resultado do Exercício	90	192	101	168
ESTOQUE EM CONSTRUÇÃO	Orçado YTD JUN/24	YTD JUN/24	Variação	YTD JUN/23
TOTAL	253	38	(215)	8
PAIS	142	53	(89)	4
REDE PRIVATIVA	11	5	(6)	4
ATIVO FMO	Orçado YTD JUN/24	YTD JUN/24	Variação	YTD JUN/23
TOTAL	1	0	(1)	2
ADMINISTRATIVO	1	0	(1)	2

Principais Variações

- TVRO (economia de R\$ 48 Milhões)
 - Custo médio
 - Estimado R\$ 477
 - Realizado R\$ 398
 - Instalações
 - Estimado R\$ 1.350k
 - Realizado R\$ 1.500k
 - Redução - 7MM
 - Call center -6,2MM
 - Ti - 1,2 MM
 - Imposto - 14,7 MM
 - Pessoal - 1,4MM
 - Frete - 10MM
- Resultado Financeiro – melhora em função da não realização do caixa projetado e das melhores taxas de aplicação negociadas
 - Estimado 0,801mm
 - Realizado 0,971mm (médias)
- PAIS
 - No aguardo da liberação das licenças ambientais
- Rede Privativa – em processo de RFP

No que se refere ao *slide* em apreço, o Sr. Paulo Roberto Cruz Cozza fez os seguintes destaques:

- 1) Quanto aos resultados financeiros, registrou outro efeito que será visto no fluxo de caixa e que diz respeito aos pagamentos, uma vez que tiveram muita postergação de pagamento, principalmente na parte dos kits do TVRO, visto que houve um atraso na entrega pelos fornecedores, em função dos problemas da seca em Manaus/AM e problemas que tiveram no porto para receber o material, ressaltando que os fornecedores, quando importam, a maior é para Manaus/AM;
- 2) Quanto ao projeto PAIS, informou que houve uma redução forte em função da questão da demora que tiveram, até o momento, do lançamento dos cabos, por causa do problema das licenças, bem como a compra dos cabos que, na verdade, acabaram fechando no mês de julho e, portanto, trarão no próximo fechamento com maior clareza; e
- 3) Quanto ao projeto Rede Privativa, reiterou que o orçamento foi baixado, visto que não realizaram quase nada e também teria uma economia refletida.

Em seguida, o Sr. Paulo Roberto Cruz Cozza exibiu o *slide* a seguir transcrito que mostra o rateio e o consumo de cada projeto e destacou as informações nele contidas, em especial aquelas constantes nas colunas “Consumo Projeto” e “Saldo do Projeto”:

No que se refere ao *slide* em apreço, o Sr. Paulo Roberto Cruz Cozza fez os seguintes destaques:

- 1) Quanto aos resultados financeiros, registrou outro efeito que será visto no fluxo de caixa e que diz respeito aos pagamentos, uma vez que tiveram muita postergação de pagamento, principalmente na parte dos kits do TVRO, visto que houve um atraso na entrega pelos fornecedores, em função dos problemas da seca em Manaus/AM e problemas que tiveram no porto para receber o material, ressaltando que os fornecedores, quando importam, a maior é para Manaus/AM;
- 2) Quanto ao projeto PAIS, informou que houve uma redução forte em função da questão da demora que tiveram, até o momento, do lançamento dos cabos, por causa do problema das licenças, bem como a compra dos cabos que, na verdade, acabaram fechando no mês de julho e, portanto, trarão no próximo fechamento com maior clareza; e
- 3) Quanto ao projeto Rede Privativa, reiterou que o orçamento foi baixado, visto que não realizaram quase nada e também teria uma economia refletida.

Em seguida, o Sr. Paulo Roberto Cruz Cozza exibiu o *slide* a seguir transcrito que mostra o rateio e o consumo de cada projeto e destacou as informações nele contidas, em especial aquelas constantes nas colunas “Consumo Projeto” e “Saldo do Projeto”:

Item

Descrição

5. Status GT Financeiro – Resultado 2º Tri/2024

Rateio e Consumo do Projeto

Projeto	Base Rateio	% Rateio	Valor Rateado	Total com Rateio
Total	68413	100,0%	1295	69708
TWID				
PRIS	(1)	0,2%	(5)	(5)
PRIS + REDE PRIVATUA	(28)	4,2%	(1)	(29)
PRIS	(33)	3,7%	(3)	(36)
REDE PRIVATUA	(5)	0,5%	(5)	(5)

Critério de Rateio

- Inclusão de todo a despesa de comunicação, Call center e de TI (softwares e serviços) no projeto TWID
- Inclusão dos valores incorridos do PRIS e Rede Privativa que são ESTOQUE no custo dos respectivos projetos
- Demais despesas rateadas em função dos % calculados no lado

Projeto	Valor Aportado	Consumo Até 2023	Consumo 2024	Consumo Projeto	Saldo do Projeto	% Saldo
Total	8.313	(1.509)	(206)	(2.415)	3.183	61,75%
TWID						
PRIS	391	(196)	(2)	(197)	194	49,49%
PRIS + REDE PRIVATUA	2.342	(129)	(20)	(249)	2.093	89,34%
PRIS	2.342	(127)	(18)	(245)	2.097	89,53%
REDE PRIVATUA	900	(12)	(2)	(14)	886	98,33%

O Sr. Paulo Roberto Cruz Cozza passou a reportar as informações do Fluxo de Caixa do 2º Trimestre de 2024, nos termos do seguinte slide por ele exibido:

5. Status GT Financeiro – Resultado 2º Tri/2024

Fluxo de Caixa 2º Tri/2024

Entradas	Orçado	YTD JUN/24	Variação	YTR JUN/23
Saldo Inicial	6.039	6.039	0	6.011
Receita Financeira	245	203	(42)	445
TOTAL	6.285	6.242	(43)	7.359

Saídas	Orçado	YTD JUN/24	Variação	YTR JUN/23
Provisão	(236)	(242)	(6)	(26)
Compra Equipamentos	(143)	(297)	(154)	(106)
PRIS + Rede Privativa	(173)	(25)	148	(25)
Publicidade	(124)	(107)	17	(55)
Tributos	(107)	(105)	2	(109)
Outros	(180)	(140)	40	(64)
TOTAL	(1.163)	(1.116)	47	(365)
SALDO	4.920	5.126	206	6.994

Principais Variações

- Resultado Financeiro – melhora em função da não realização do caixa projetado e das melhores taxas de aplicação negociadas:
 - Estimado 0,80%am
 - Realizado 0,51%am (prelím)
- Compra de Equipamentos – atraso da entrega devido a seca dos rios
- Rede Privativa – em processo de RFP.

Ato contínuo, ainda sobre o resultado do 2º Trimestre de 2024, o Sr. Paulo Roberto Cruz Cozza projetou o slide, abaixo reproduzido, para apresentar dados sobre as aplicações financeiras, ressaltando que a entidade mantém a sua política e busca prolongar, o máximo possível, as aplicações, com o objetivo de conseguir as melhores taxas, de modo que estão alcançando um rendimento melhor do que o previsto:

Ato contínuo, ainda sobre o resultado do 2º Trimestre de 2024, o Sr. **Paulo Roberto Cruz Cozza** projetou o *slide*, abaixo reproduzido, para apresentar dados sobre as aplicações financeiras, ressaltando que a entidade mantém a sua política e busca prolongar, o máximo possível, as aplicações, com o objetivo de conseguir as melhores taxas, de modo que estão alcançando um rendimento melhor do que o previsto:

Item

Descrição

5. Status GT Financeiro – Resultado 2º Tri/2024

Aplicações Financeiras

Item	Problema	Quantidade	Resolução	Valor em R\$	Valor em R\$
				Antes	Depois
Infovias 01	Infovias 01	100	100	100	100
Infovias 02	Infovias 02	100	100	100	100
Infovias 03	Infovias 03	100	100	100	100
Infovias 04	Infovias 04	100	100	100	100
Infovias 05	Infovias 05	100	100	100	100
Infovias 06	Infovias 06	100	100	100	100
Infovias 07	Infovias 07	100	100	100	100
Infovias 08	Infovias 08	100	100	100	100
Infovias 09	Infovias 09	100	100	100	100
Infovias 10	Infovias 10	100	100	100	100
Infovias 11	Infovias 11	100	100	100	100
Infovias 12	Infovias 12	100	100	100	100
Infovias 13	Infovias 13	100	100	100	100
Infovias 14	Infovias 14	100	100	100	100
Infovias 15	Infovias 15	100	100	100	100
Infovias 16	Infovias 16	100	100	100	100
Infovias 17	Infovias 17	100	100	100	100
Infovias 18	Infovias 18	100	100	100	100
Infovias 19	Infovias 19	100	100	100	100
Infovias 20	Infovias 20	100	100	100	100
Infovias 21	Infovias 21	100	100	100	100
Infovias 22	Infovias 22	100	100	100	100
Infovias 23	Infovias 23	100	100	100	100
Infovias 24	Infovias 24	100	100	100	100
Infovias 25	Infovias 25	100	100	100	100
Infovias 26	Infovias 26	100	100	100	100
Infovias 27	Infovias 27	100	100	100	100
Infovias 28	Infovias 28	100	100	100	100
Infovias 29	Infovias 29	100	100	100	100
Infovias 30	Infovias 30	100	100	100	100
Infovias 31	Infovias 31	100	100	100	100
Infovias 32	Infovias 32	100	100	100	100
Infovias 33	Infovias 33	100	100	100	100
Infovias 34	Infovias 34	100	100	100	100
Infovias 35	Infovias 35	100	100	100	100
Infovias 36	Infovias 36	100	100	100	100
Infovias 37	Infovias 37	100	100	100	100
Infovias 38	Infovias 38	100	100	100	100
Infovias 39	Infovias 39	100	100	100	100
Infovias 40	Infovias 40	100	100	100	100
Infovias 41	Infovias 41	100	100	100	100
Infovias 42	Infovias 42	100	100	100	100
Infovias 43	Infovias 43	100	100	100	100
Infovias 44	Infovias 44	100	100	100	100
Infovias 45	Infovias 45	100	100	100	100
Infovias 46	Infovias 46	100	100	100	100
Infovias 47	Infovias 47	100	100	100	100
Infovias 48	Infovias 48	100	100	100	100
Infovias 49	Infovias 49	100	100	100	100
Infovias 50	Infovias 50	100	100	100	100
Infovias 51	Infovias 51	100	100	100	100
Infovias 52	Infovias 52	100	100	100	100
Infovias 53	Infovias 53	100	100	100	100
Infovias 54	Infovias 54	100	100	100	100
Infovias 55	Infovias 55	100	100	100	100
Infovias 56	Infovias 56	100	100	100	100
Infovias 57	Infovias 57	100	100	100	100
Infovias 58	Infovias 58	100	100	100	100
Infovias 59	Infovias 59	100	100	100	100
Infovias 60	Infovias 60	100	100	100	100
Infovias 61	Infovias 61	100	100	100	100
Infovias 62	Infovias 62	100	100	100	100
Infovias 63	Infovias 63	100	100	100	100
Infovias 64	Infovias 64	100	100	100	100
Infovias 65	Infovias 65	100	100	100	100
Infovias 66	Infovias 66	100	100	100	100
Infovias 67	Infovias 67	100	100	100	100
Infovias 68	Infovias 68	100	100	100	100
Infovias 69	Infovias 69	100	100	100	100
Infovias 70	Infovias 70	100	100	100	100
Infovias 71	Infovias 71	100	100	100	100
Infovias 72	Infovias 72	100	100	100	100
Infovias 73	Infovias 73	100	100	100	100
Infovias 74	Infovias 74	100	100	100	100
Infovias 75	Infovias 75	100	100	100	100
Infovias 76	Infovias 76	100	100	100	100
Infovias 77	Infovias 77	100	100	100	100
Infovias 78	Infovias 78	100	100	100	100
Infovias 79	Infovias 79	100	100	100	100
Infovias 80	Infovias 80	100	100	100	100
Infovias 81	Infovias 81	100	100	100	100
Infovias 82	Infovias 82	100	100	100	100
Infovias 83	Infovias 83	100	100	100	100
Infovias 84	Infovias 84	100	100	100	100
Infovias 85	Infovias 85	100	100	100	100
Infovias 86	Infovias 86	100	100	100	100
Infovias 87	Infovias 87	100	100	100	100
Infovias 88	Infovias 88	100	100	100	100
Infovias 89	Infovias 89	100	100	100	100
Infovias 90	Infovias 90	100	100	100	100
Infovias 91	Infovias 91	100	100	100	100
Infovias 92	Infovias 92	100	100	100	100
Infovias 93	Infovias 93	100	100	100	100
Infovias 94	Infovias 94	100	100	100	100
Infovias 95	Infovias 95	100	100	100	100
Infovias 96	Infovias 96	100	100	100	100
Infovias 97	Infovias 97	100	100	100	100
Infovias 98	Infovias 98	100	100	100	100
Infovias 99	Infovias 99	100	100	100	100
Infovias 100	Infovias 100	100	100	100	100

Observações

- Redução da Selic para 10,50% em Abril/2024
- Média de rendimento das aplicações: 106% CDI
- Acompanhamento do mercado em busca de opções de investimento caso a Selic continue a diminuir
- Aporte Inicial – R\$ 6.313milhões

Rendimento acumulado Líquido

De 2022 a Dez/2023 - R\$ 924milhões

De Jan a Jun/2024 - R\$ 192milhões

EAF

Concluída a sua manifestação, o Sr. Paulo Roberto Cruz Cozza devolveu a palavra ao Sr. Leandro Guerra.

Retomando a sua apresentação, o Sr. Leandro Guerra passou a reportar o sexto ponto de sua agenda, Projeto PAIS, exibindo o *slide* abaixo reproduzido para mostrar o mapa do projeto Norte Conectado, com as 6 Infovias do Projeto EAF, destacando que a execução ocorre em duas etapas, sendo que as Infovias 02, 03 e 04, compõem a Etapa 1, e as Infovias 05, 06 e 08, compõem a Etapa 2 do projeto:

6. NORTE CONECTADO > As 6 Infovias do Projeto EAF

Em seguida, o Sr. Leandro Guerra destacou os pontos de atenção quanto ao prazo do Projeto PAIS, nos termos do *slide* abaixo transcrito, ressaltando que o prazo final para a implantação das 6 infovias é o mês de fevereiro de 2026:

Item

Descrição

6. Pontos de atenção quanto ao prazo do Projeto PAIS

Ponto de Atenção	Descrição
Licenciamento Ambiental do IBAMA	1. Emissão da Licença de Implantação (LI); 2. Parte do IBAMA permanece em greve; 3. Necessidade de análise simultânea dos pedidos de licenciamento.
Múltiplos lançamentos	Limitação de capacidade técnica e equipamentos.
Seca no Amazonas	Seca grave diminui o nível dos rios restringindo as janelas de lançamento de cabos e a realização dos EVRs da Etapa 02.
Fragilidades na cadeia logística internacional	Conflitos Internacionais impactam na logística

Amazonas tem cidades em estado de emergência por seca

Um período de seca no Amazonas gerou um risco de incêndio significativo no Estado brasileiro, segundo o IBAMA, que também registra o grande número de incêndios que geram o licenciamento de áreas.

Seca afeta 10 mil pessoas, isola comunidades e causa desabastecimento no Amazonas

Apogeu a greve dos servidores públicos em greve no Amazonas de 2023. Dos 12 municípios do estado, 10 estão em estado de emergência.

Amazonas

Seca no Solimões já dificulta cargas e passageiros a Benjamin Constant

Em 15 dias de julho, o alto no Solimões, em frente a Tabatinga, deixou mais de 1 milhão de pessoas sem acesso ao rio.

Maersk diz que interrupção de transporte no Mar Vermelho gera efeitos globais

Empresas têm decidido embarcações para o Canal de Suez para evitar ataques de milícias Houthi.

Maersk

STJ determina retorno de servidores do Ibama e ICMBio em greve

MOVIMENTO GREVISTA REVOGOU SE OFICIALMENTE NO DIA DA 1ª SEMANA DE JULHO DE 2023 E O PRESIDENTE DO PAÍS ADOTOU A PARALISAÇÃO NA SEGURANÇA PÚBLICA.

Greve no Ibama: parte dos servidores ambientais segue em paralisação

Na quinta-feira, 4, uma liminar determinou o retorno de todos os servidores responsáveis pelo licenciamento ambiental, gestão de unidades de conservação, registro e substituição de fauna, além do controle e prevenção de impactos técnicos e emergenciais ambientais.

EA

Sobre o *slide* em tela, o Sr. **Leandro Guerra** fez os seguintes destaques:

- 1) Quanto ao licenciamento ambiental do IBAMA, registrou a permanência da greve do órgão, bem como a necessidade de análise simultânea dos pedidos de licenciamento, que seria uma característica do IBAMA, e afirmou que, atualmente, eles estão dando foco à Infovia 04;
- 2) Quanto aos múltiplos lançamentos, afirmou que, em 2025, a entidade tem o desafio de lançamento de toda a Etapa 2, com as Infovias 05, 06 e 08, que seriam três infovias de longa distância, além da própria Infovia 02 que foi reprogramada para o início de 2025;
- 3) Quanto à seca do Amazonas, informou que há notícias de que a seca deste ano tende a ser mais rigorosa em comparação ao ano anterior, o que restringe a janela de lançamento dos cabos e a janela de operação e de instalação de equipamentos, caixas de ancoragem, CMAD e *containers*, que são impactados pelo encurtamento da janela de operação em função da seca; e
- 4) Quanto às fragilidades na cadeia logística internacional, reiterou os efeitos das guerras sobre a logística, o despacho de navios e o transporte dos equipamentos, especialmente aqueles que vêm da China.

Seguindo, o Sr. **Leandro Guerra** exibiu o *slide* abaixo reproduzido que mostra o *status* do Projeto PAIS em relação à Infovia 03, e destacou as seguintes informações:

https://sei.anatel.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13999873&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001283&infra_hash=1...25/50

Passando para a Infovia 04, o **Sr. Leandro Guerra** projetou o seguinte *slide* que detalha o seu *status*, com as informações sobre a sua execução em relação à implantação do *Backbone* e da Rede Metropolitana:

Item

Descrição

6. PAIS – Status

Infovia 04

Rio Branco

Evolução da Infovia

Estados de viabilidade	Aquisição e fabricação de cabos	Licenciamentos e autorizações ambientais	Infraestrutura terrestre (IPA, CMAD e Gabinete externo)	Lançamento do cabo	Ativação do backbone	Ativação da rede metropolitana
✓	✓	●	✓	○	○	●

Detalhamento

Backbone:

- ✓ Implantação do IPA – [REDACTED]
- ✓ Implantação do CMAD – [REDACTED]
- ✓ Implantação Equipamento DWDM – [REDACTED]
- ✓ Emissão da Autorização Marinha – [REDACTED]
- ✓ Emissão da Licença de Instalação (LI) – Em andamento no IBAMA
- > Implantação do Cabo Subaquático – No aguardo LI/IBAMA, previsão de início D+10
- > Ativação do Backbone – No aguardo LI/IBAMA, previsão de início D+10

Rede Metropolitana:

- ✓ Elaboração de projeto 4 cidades – [REDACTED]
- ✓ Cessão de Uso Compartilhado de Pontes 4 cidades autorizadas – [REDACTED]
- > Implantação da Rede Metropolitana (Distribuição e Acesso)
 - ✓ Implantação Boa Vista e Caracará – [REDACTED]
 - ✓ Implantação Vila de Moura e Balaçu – Em construção de rede, término previsto Ago/24

Percurso total:
515 km de cabo subaquático e 132 km de cabo terrestre

População atendida:
+ 430 mil habitantes

LEGENDA

- ✓ concluído
- execução
- planejado

Observação

↗ **Janela de lançamento atual da Infovia 04**

- > 06/08 Limite para Emissão da LI (IBAMA)
- > 16/08 Limite para Início da Implantação

Nota: Emissão da LI realizada após a data de 06/08, estará inviabilizando o lançamento do cabo subaquático para este ano de 2024. É será reprogramando para o ano de 2025 no período Abril a Ago/25 de viabilidade hidrográfica.

O Sr. **Leandro Guerra** destacou que a Infovia 04 estaria praticamente pronta para ser lançada e estaria aguardando somente a licença de instalação do IBAMA, ressaltando que a entidade colocou uma data-limite, 06 de agosto, para a necessidade de se ter essa licença de instalação, em função da projeção da condição geográfica do rio, visto que sabem que, se ultrapassar essa data, dificilmente conseguirão lançar nesta janela atual, sendo que o lançamento seria postergado provavelmente a partir dos meses de março ou abril de 2025. afirmou que esse é um tema que a entidade já vem interagindo com o Ministério das Comunicações que tem dado apoio, além da Anatel, para conseguir essa licença e poderem, até o dia 06 de agosto, lançar nessa janela.

Ainda sobre a Infovia 04, o Sr. **Leandro Guerra** projetou o slide a seguir transcrito para mostrar os detalhes das condições hidrográficas da Infovia 04, ressaltando que há uma situação de risco a partir do dia 10 de agosto, o que reforça a necessidade de conseguir a licença até o dia 06 de agosto:

O Sr. **Leandro Guerra** destacou que a Infovia 04 estaria praticamente pronta para ser lançada e estaria aguardando somente a licença de instalação do IBAMA, ressaltando que a entidade colocou uma data-limite, 06 de agosto, para a necessidade de se ter essa licença de instalação, em função da projeção da condição geográfica do rio, visto que sabem que, se ultrapassar essa data, dificilmente conseguirão lançar nesta janela atual, sendo que o lançamento seria postergado provavelmente a partir dos meses de março ou abril de 2025. afirmou que esse é um tema que a entidade já vem interagindo com o Ministério das Comunicações que tem dado apoio, além da Anatel, para conseguir essa licença e poderem, até o dia 06 de agosto, lançar nessa janela.

Ainda sobre a Infovia 04, o **Sr. Leandro Guerra** projetou o *slide* a seguir transcrito para mostrar os detalhes das condições hidrográficas da Infovia 04, ressaltando que há uma situação de risco a partir do dia 10 de agosto, o que reforça a necessidade de conseguir a licença até o dia 06 de agosto:

Item

Descrição

6. PAIS – Status

INFOVIA 04 – CONDIÇÕES HÍDRICA

➤ Monitoramento e Análises do Nível dos Rios
✓ Boletim emitido pelo SGB – Serviço Geológico do Brasil;

Cota em: 18/07/2024 : 048 cm

Referência Hidrográfica ano 2023

Ato contínuo, o Sr. **Leandro Guerra** exibiu o *slide* abaixo reproduzido que passa a detalhar as informações sobre a execução da Infovia 02:

6. PAIS – Status

Infovia 02

Rio Solimões

Percorso total:
1.200 km de cabo subaquático / 30 km de cabo terrestre

População atendida:
+370 mil habitantes

LEGENDA

- concluído
- em execução
- planejado

Detalhamento

Backbone:

- ✓ Implantação do IPA – [REDACTED]
- ✓ Implantação do CMAD – [REDACTED]
- ✓ Implantação Equipamento DWDM – [REDACTED]
- ✓ Emissão da Autorização Marinha – [REDACTED]
- ✓ Emissão da Licença de Instalação (LI) – [REDACTED]
- Implantação do Cabo Subaquático – Reprogramado para início em Dez/24
- Ativação do Backbone – Reprogramado para início em Dez/24

Rede Metropolitana:

- ✓ Elaboração de projeto 13 cidades – [REDACTED]
- Cessão de Uso Compartilhado de Postes 12 cidades autorizadas e 1 em análise
- Implantação da Rede Metropolitana Jun/24 a Dez/24 (Distribuição e Acesso)
- ✓ Têrê, Alvarães e Uruíni em processo de construção
- ✓ Demais localidades, implantação programada

➤ Inviabilidade de lançamento do Cabo

- 10/Jul a 30/Nov Restrição Hidrográfica
- 12/07 Emissão da LI
- Próxima Janela de Viabilidade
- Dez/24 a Jun/25

EAF

Ato contínuo, o Sr. Leandro Guerra exibiu o slide abaixo reproduzido que passa a detalhar as informações sobre a execução da Infovia 02:

Item	Descrição																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	A respeito da Infovia 02, o Sr. Leandro Guerra destacou que a licença de instalação já teria saído, mas, infelizmente, ela foi emitida no dia 12 de julho, em uma condição em que não permitia mais realizar o lançamento, tendo ultrapassado a data-limite em 10 dias. Afirmou que isso impossibilitou o lançamento, porque havia um risco muito grande de a plataforma/balsa encalhar com todo o equipamento no meio do caminho, de modo que a decisão tomada foi no sentido de não realizar o lançamento e aguardar a próxima janela que, por sua vez, estaria prevista a partir do mês de dezembro deste ano. Dito isso, o Sr. Leandro Guerra passou a realizar a leitura do <i>slide</i> em relação às Redes Metropolitanas. Ainda sobre a Infovia 02, o Sr. Leandro Guerra apresentou, nos termos do <i>slide</i> transcrito abaixo, o detalhe de todo o mapeamento e acompanhamento das condições hídricas da referida infovia referente à análise do lançamento do período de 12 de julho. Nesse sentido, afirmou que a entidade vinha acompanhando diária e previamente, com relatórios da própria Universidade do Estado do Amazonas e do Serviço Geológico do Brasil, bem como relatório da Empresa Navegação Prates, parceiro da EAF na região para lançamento do cabo, que possui uma equipe de avaliação técnica das condições do rio para que o lançamento seja realizado: 6. PAIS – Status INFOVIA 02 – CONDIÇÕES HÍDRICA ➤ Monitoramento e Análises do Nível dos Rios ✓ Relatório emitido pela UEA - Universidade do Estado do Amazonas; ✓ Boletim emitido pelo SGB – Serviço Geológico do Brasil; ✓ Parecer Técnico emitido pela Empresa Navegação Prates; ✓ Análise e Projeções EAF; e ✓ Reportagens e Imagens. LABCLIM LABORATÓRIO DE CLIMATOLOGIA E METEOROLOGIA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA PARCERIA DE PRODUÇÃO DO NACIONAL HÍDRICA E CLIMÁTICA DO AMAZONAS LABCLIM LABORATÓRIO DE CLIMATOLOGIA E METEOROLOGIA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA 15 de julho de 2024 - LABCLIM - Laboratório de Modelagem do Sistema Climático Terrestre SGB SERVIÇO GEOLOGICO DO BRASIL ANÁLISE DE RISCO PARA O LANÇAMENTO DO CABO RESUMO <table><tr><th>Item</th><th>Descrição</th><th>Valor</th><th>Unidade</th></tr><tr><td>1</td><td>Altura da água</td><td>12,5</td><td>m</td></tr><tr><td>2</td><td>Profundidade do rio</td><td>10,0</td><td>m</td></tr><tr><td>3</td><td>Velocidade da correnteza</td><td>0,5</td><td>m/s</td></tr><tr><td>4</td><td>Temperatura da água</td><td>28,0</td><td>°C</td></tr><tr><td>5</td><td>Umidade relativa do ar</td><td>85,0</td><td>%</td></tr><tr><td>6</td><td>Pressão atmosférica</td><td>1013,2</td><td>hPa</td></tr><tr><td>7</td><td>Velocidade do vento</td><td>1,5</td><td>m/s</td></tr><tr><td>8</td><td>Temperatura do ar</td><td>30,0</td><td>°C</td></tr><tr><td>9</td><td>Umidade relativa do ar</td><td>75,0</td><td>%</td></tr><tr><td>10</td><td>Pressão atmosférica</td><td>1013,2</td><td>hPa</td></tr><tr><td>11</td><td>Velocidade do vento</td><td>1,5</td><td>m/s</td></tr><tr><td>12</td><td>Temperatura do ar</td><td>30,0</td><td>°C</td></tr><tr><td>13</td><td>Umidade relativa do ar</td><td>75,0</td><td>%</td></tr><tr><td>14</td><td>Pressão atmosférica</td><td>1013,2</td><td>hPa</td></tr><tr><td>15</td><td>Velocidade do vento</td><td>1,5</td><td>m/s</td></tr><tr><td>16</td><td>Temperatura do ar</td><td>30,0</td><td>°C</td></tr><tr><td>17</td><td>Umidade relativa do ar</td><td>75,0</td><td>%</td></tr><tr><td>18</td><td>Pressão atmosférica</td><td>1013,2</td><td>hPa</td></tr><tr><td>19</td><td>Velocidade do vento</td><td>1,5</td><td>m/s</td></tr><tr><td>20</td><td>Temperatura do ar</td><td>30,0</td><td>°C</td></tr><tr><td>21</td><td>Umidade relativa do ar</td><td>75,0</td><td>%</td></tr><tr><td>22</td><td>Pressão atmosférica</td><td>1013,2</td><td>hPa</td></tr><tr><td>23</td><td>Velocidade do vento</td><td>1,5</td><td>m/s</td></tr><tr><td>24</td><td>Temperatura do ar</td><td>30,0</td><td>°C</td></tr><tr><td>25</td><td>Umidade relativa do ar</td><td>75,0</td><td>%</td></tr><tr><td>26</td><td>Pressão atmosférica</td><td>1013,2</td><td>hPa</td></tr><tr><td>27</td><td>Velocidade do vento</td><td>1,5</td><td>m/s</td></tr><tr><td>28</td><td>Temperatura do ar</td><td>30,0</td><td>°C</td></tr><tr><td>29</td><td>Umidade relativa do ar</td><td>75,0</td><td>%</td></tr><tr><td>30</td><td>Pressão atmosférica</td><td>1013,2</td><td>hPa</td></tr><tr><td>31</td><td>Velocidade do vento</td><td>1,5</td><td>m/s</td></tr><tr><td>32</td><td>Temperatura do ar</td><td>30,0</td><td>°C</td></tr><tr><td>33</td><td>Umidade relativa do ar</td><td>75,0</td><td>%</td></tr><tr><td>34</td><td>Pressão atmosférica</td><td>1013,2</td><td>hPa</td></tr><tr><td>35</td><td>Velocidade do vento</td><td>1,5</td><td>m/s</td></tr><tr><td>36</td><td>Temperatura do ar</td><td>30,0</td><td>°C</td></tr><tr><td>37</td><td>Umidade relativa do ar</td><td>75,0</td><td>%</td></tr><tr><td>38</td><td>Pressão atmosférica</td><td>1013,2</td><td>hPa</td></tr><tr><td>39</td><td>Velocidade do vento</td><td>1,5</td><td>m/s</td></tr><tr><td>40</td><td>Temperatura do ar</td><td>30,0</td><td>°C</td></tr><tr><td>41</td><td>Umidade relativa do ar</td><td>75,0</td><td>%</td></tr><tr><td>42</td><td>Pressão atmosférica</td><td>1013,2</td><td>hPa</td></tr><tr><td>43</td><td>Velocidade do vento</td><td>1,5</td><td>m/s</td></tr><tr><td>44</td><td>Temperatura do ar</td><td>30,0</td><td>°C</td></tr><tr><td>45</td><td>Umidade relativa do ar</td><td>75,0</td><td>%</td></tr><tr><td>46</td><td>Pressão atmosférica</td><td>1013,2</td><td>hPa</td></tr><tr><td>47</td><td>Velocidade do vento</td><td>1,5</td><td>m/s</td></tr><tr><td>48</td><td>Temperatura do ar</td><td>30,0</td><td>°C</td></tr><tr><td>49</td><td>Umidade relativa do ar</td><td>75,0</td><td>%</td></tr><tr><td>50</td><td>Pressão atmosférica</td><td>1013,2</td><td>hPa</td></tr><tr><td>51</td><td>Velocidade do vento</td><td>1,5</td><td>m/s</td></tr><tr><td>52</td><td>Temperatura do ar</td><td>30,0</td><td>°C</td></tr><tr><td>53</td><td>Umidade relativa do ar</td><td>75,0</td><td>%</td></tr><tr><td>54</td><td>Pressão atmosférica</td><td>1013,2</td><td>hPa</td></tr><tr><td>55</td><td>Velocidade do vento</td><td>1,5</td><td>m/s</td></tr><tr><td>56</td><td>Temperatura do ar</td><td>30,0</td><td>°C</td></tr><tr><td>57</td><td>Umidade relativa do ar</td><td>75,0</td><td>%</td></tr><tr><td>58</td><td>Pressão atmosférica</td><td>1013,2</td><td>hPa</td></tr><tr><td>59</td><td>Velocidade do vento</td><td>1,5</td><td>m/s</td></tr><tr><td>60</td><td>Temperatura do ar</td><td>30,0</td><td>°C</td></tr><tr><td>61</td><td>Umidade relativa do ar</td><td>75,0</td><td>%</td></tr><tr><td>62</td><td>Pressão atmosférica</td><td>1013,2</td><td>hPa</td></tr><tr><td>63</td><td>Velocidade do vento</td><td>1,5</td><td>m/s</td></tr><tr><td>64</td><td>Temperatura do ar</td><td>30,0</td><td>°C</td></tr><tr><td>65</td><td>Umidade relativa do ar</td><td>75,0</td><td>%</td></tr><tr><td>66</td><td>Pressão atmosférica</td><td>1013,2</td><td>hPa</td></tr><tr><td>67</td><td>Velocidade do vento</td><td>1,5</td><td>m/s</td></tr><tr><td>68</td><td>Temperatura do ar</td><td>30,0</td><td>°C</td></tr><tr><td>69</td><td>Umidade relativa do ar</td><td>75,0</td><td>%</td></tr><tr><td>70</td><td>Pressão atmosférica</td><td>1013,2</td><td>hPa</td></tr><tr><td>71</td><td>Velocidade do vento</td><td>1,5</td><td>m/s</td></tr><tr><td>72</td><td>Temperatura do ar</td><td>30,0</td><td>°C</td></tr><tr><td>73</td><td>Umidade relativa do ar</td><td>75,0</td><td>%</td></tr><tr><td>74</td><td>Pressão atmosférica</td><td>1013,2</td><td>hPa</td></tr><tr><td>75</td><td>Velocidade do vento</td><td>1,5</td><td>m/s</td></tr><tr><td>76</td><td>Temperatura do ar</td><td>30,0</td><td>°C</td></tr><tr><td>77</td><td>Umidade relativa do ar</td><td>75,0</td><td>%</td></tr><tr><td>78</td><td>Pressão atmosférica</td><td>1013,2</td><td>hPa</td></tr><tr><td>79</td><td>Velocidade do vento</td><td>1,5</td><td>m/s</td></tr><tr><td>80</td><td>Temperatura do ar</td><td>30,0</td><td>°C</td></tr><tr><td>81</td><td>Umidade relativa do ar</td><td>75,0</td><td>%</td></tr><tr><td>82</td><td>Pressão atmosférica</td><td>1013,2</td><td>hPa</td></tr><tr><td>83</td><td>Velocidade do vento</td><td>1,5</td><td>m/s</td></tr><tr><td>84</td><td>Temperatura do ar</td><td>30,0</td><td>°C</td></tr><tr><td>85</td><td>Umidade relativa do ar</td><td>75,0</td><td>%</td></tr><tr><td>86</td><td>Pressão atmosférica</td><td>1013,2</td><td>hPa</td></tr><tr><td>87</td><td>Velocidade do vento</td><td>1,5</td><td>m/s</td></tr><tr><td>88</td><td>Temperatura do ar</td><td>30,0</td><td>°C</td></tr><tr><td>89</td><td>Umidade relativa do ar</td><td>75,0</td><td>%</td></tr><tr><td>90</td><td>Pressão atmosférica</td><td>1013,2</td><td>hPa</td></tr><tr><td>91</td><td>Velocidade do vento</td><td>1,5</td><td>m/s</td></tr><tr><td>92</td><td>Temperatura do ar</td><td>30,0</td><td>°C</td></tr><tr><td>93</td><td>Umidade relativa do ar</td><td>75,0</td><td>%</td></tr><tr><td>94</td><td>Pressão atmosférica</td><td>1013,2</td><td>hPa</td></tr><tr><td>95</td><td>Velocidade do vento</td><td>1,5</td><td>m/s</td></tr><tr><td>96</td><td>Temperatura do ar</td><td>30,0</td><td>°C</td></tr><tr><td>97</td><td>Umidade relativa do ar</td><td>75,0</td><td>%</td></tr><tr><td>98</td><td>Pressão atmosférica</td><td>1013,2</td><td>hPa</td></tr><tr><td>99</td><td>Velocidade do vento</td><td>1,5</td><td>m/s</td></tr><tr><td>100</td><td>Temperatura do ar</td><td>30,0</td><td>°C</td></tr></table> Relatório da Prates enviado em anexo EAF	Item	Descrição	Valor	Unidade	1	Altura da água	12,5	m	2	Profundidade do rio	10,0	m	3	Velocidade da correnteza	0,5	m/s	4	Temperatura da água	28,0	°C	5	Umidade relativa do ar	85,0	%	6	Pressão atmosférica	1013,2	hPa	7	Velocidade do vento	1,5	m/s	8	Temperatura do ar	30,0	°C	9	Umidade relativa do ar	75,0	%	10	Pressão atmosférica	1013,2	hPa	11	Velocidade do vento	1,5	m/s	12	Temperatura do ar	30,0	°C	13	Umidade relativa do ar	75,0	%	14	Pressão atmosférica	1013,2	hPa	15	Velocidade do vento	1,5	m/s	16	Temperatura do ar	30,0	°C	17	Umidade relativa do ar	75,0	%	18	Pressão atmosférica	1013,2	hPa	19	Velocidade do vento	1,5	m/s	20	Temperatura do ar	30,0	°C	21	Umidade relativa do ar	75,0	%	22	Pressão atmosférica	1013,2	hPa	23	Velocidade do vento	1,5	m/s	24	Temperatura do ar	30,0	°C	25	Umidade relativa do ar	75,0	%	26	Pressão atmosférica	1013,2	hPa	27	Velocidade do vento	1,5	m/s	28	Temperatura do ar	30,0	°C	29	Umidade relativa do ar	75,0	%	30	Pressão atmosférica	1013,2	hPa	31	Velocidade do vento	1,5	m/s	32	Temperatura do ar	30,0	°C	33	Umidade relativa do ar	75,0	%	34	Pressão atmosférica	1013,2	hPa	35	Velocidade do vento	1,5	m/s	36	Temperatura do ar	30,0	°C	37	Umidade relativa do ar	75,0	%	38	Pressão atmosférica	1013,2	hPa	39	Velocidade do vento	1,5	m/s	40	Temperatura do ar	30,0	°C	41	Umidade relativa do ar	75,0	%	42	Pressão atmosférica	1013,2	hPa	43	Velocidade do vento	1,5	m/s	44	Temperatura do ar	30,0	°C	45	Umidade relativa do ar	75,0	%	46	Pressão atmosférica	1013,2	hPa	47	Velocidade do vento	1,5	m/s	48	Temperatura do ar	30,0	°C	49	Umidade relativa do ar	75,0	%	50	Pressão atmosférica	1013,2	hPa	51	Velocidade do vento	1,5	m/s	52	Temperatura do ar	30,0	°C	53	Umidade relativa do ar	75,0	%	54	Pressão atmosférica	1013,2	hPa	55	Velocidade do vento	1,5	m/s	56	Temperatura do ar	30,0	°C	57	Umidade relativa do ar	75,0	%	58	Pressão atmosférica	1013,2	hPa	59	Velocidade do vento	1,5	m/s	60	Temperatura do ar	30,0	°C	61	Umidade relativa do ar	75,0	%	62	Pressão atmosférica	1013,2	hPa	63	Velocidade do vento	1,5	m/s	64	Temperatura do ar	30,0	°C	65	Umidade relativa do ar	75,0	%	66	Pressão atmosférica	1013,2	hPa	67	Velocidade do vento	1,5	m/s	68	Temperatura do ar	30,0	°C	69	Umidade relativa do ar	75,0	%	70	Pressão atmosférica	1013,2	hPa	71	Velocidade do vento	1,5	m/s	72	Temperatura do ar	30,0	°C	73	Umidade relativa do ar	75,0	%	74	Pressão atmosférica	1013,2	hPa	75	Velocidade do vento	1,5	m/s	76	Temperatura do ar	30,0	°C	77	Umidade relativa do ar	75,0	%	78	Pressão atmosférica	1013,2	hPa	79	Velocidade do vento	1,5	m/s	80	Temperatura do ar	30,0	°C	81	Umidade relativa do ar	75,0	%	82	Pressão atmosférica	1013,2	hPa	83	Velocidade do vento	1,5	m/s	84	Temperatura do ar	30,0	°C	85	Umidade relativa do ar	75,0	%	86	Pressão atmosférica	1013,2	hPa	87	Velocidade do vento	1,5	m/s	88	Temperatura do ar	30,0	°C	89	Umidade relativa do ar	75,0	%	90	Pressão atmosférica	1013,2	hPa	91	Velocidade do vento	1,5	m/s	92	Temperatura do ar	30,0	°C	93	Umidade relativa do ar	75,0	%	94	Pressão atmosférica	1013,2	hPa	95	Velocidade do vento	1,5	m/s	96	Temperatura do ar	30,0	°C	97	Umidade relativa do ar	75,0	%	98	Pressão atmosférica	1013,2	hPa	99	Velocidade do vento	1,5	m/s	100	Temperatura do ar	30,0	°C
Item	Descrição	Valor	Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	Altura da água	12,5	m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2	Profundidade do rio	10,0	m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	Velocidade da correnteza	0,5	m/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	Temperatura da água	28,0	°C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
5	Umidade relativa do ar	85,0	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
6	Pressão atmosférica	1013,2	hPa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
7	Velocidade do vento	1,5	m/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	Temperatura do ar	30,0	°C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
9	Umidade relativa do ar	75,0	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
10	Pressão atmosférica	1013,2	hPa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
11	Velocidade do vento	1,5	m/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
12	Temperatura do ar	30,0	°C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
13	Umidade relativa do ar	75,0	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
14	Pressão atmosférica	1013,2	hPa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
15	Velocidade do vento	1,5	m/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
16	Temperatura do ar	30,0	°C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
17	Umidade relativa do ar	75,0	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
18	Pressão atmosférica	1013,2	hPa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
19	Velocidade do vento	1,5	m/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
20	Temperatura do ar	30,0	°C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
21	Umidade relativa do ar	75,0	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
22	Pressão atmosférica	1013,2	hPa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
23	Velocidade do vento	1,5	m/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
24	Temperatura do ar	30,0	°C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
25	Umidade relativa do ar	75,0	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
26	Pressão atmosférica	1013,2	hPa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
27	Velocidade do vento	1,5	m/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
28	Temperatura do ar	30,0	°C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
29	Umidade relativa do ar	75,0	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
30	Pressão atmosférica	1013,2	hPa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
31	Velocidade do vento	1,5	m/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
32	Temperatura do ar	30,0	°C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
33	Umidade relativa do ar	75,0	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
34	Pressão atmosférica	1013,2	hPa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
35	Velocidade do vento	1,5	m/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
36	Temperatura do ar	30,0	°C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
37	Umidade relativa do ar	75,0	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
38	Pressão atmosférica	1013,2	hPa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
39	Velocidade do vento	1,5	m/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
40	Temperatura do ar	30,0	°C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
41	Umidade relativa do ar	75,0	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
42	Pressão atmosférica	1013,2	hPa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
43	Velocidade do vento	1,5	m/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
44	Temperatura do ar	30,0	°C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
45	Umidade relativa do ar	75,0	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
46	Pressão atmosférica	1013,2	hPa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
47	Velocidade do vento	1,5	m/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
48	Temperatura do ar	30,0	°C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
49	Umidade relativa do ar	75,0	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
50	Pressão atmosférica	1013,2	hPa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
51	Velocidade do vento	1,5	m/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
52	Temperatura do ar	30,0	°C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
53	Umidade relativa do ar	75,0	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
54	Pressão atmosférica	1013,2	hPa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
55	Velocidade do vento	1,5	m/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
56	Temperatura do ar	30,0	°C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
57	Umidade relativa do ar	75,0	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
58	Pressão atmosférica	1013,2	hPa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
59	Velocidade do vento	1,5	m/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
60	Temperatura do ar	30,0	°C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
61	Umidade relativa do ar	75,0	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
62	Pressão atmosférica	1013,2	hPa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
63	Velocidade do vento	1,5	m/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
64	Temperatura do ar	30,0	°C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
65	Umidade relativa do ar	75,0	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
66	Pressão atmosférica	1013,2	hPa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
67	Velocidade do vento	1,5	m/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
68	Temperatura do ar	30,0	°C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
69	Umidade relativa do ar	75,0	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
70	Pressão atmosférica	1013,2	hPa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
71	Velocidade do vento	1,5	m/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
72	Temperatura do ar	30,0	°C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
73	Umidade relativa do ar	75,0	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
74	Pressão atmosférica	1013,2	hPa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
75	Velocidade do vento	1,5	m/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
76	Temperatura do ar	30,0	°C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
77	Umidade relativa do ar	75,0	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
78	Pressão atmosférica	1013,2	hPa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
79	Velocidade do vento	1,5	m/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
80	Temperatura do ar	30,0	°C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
81	Umidade relativa do ar	75,0	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
82	Pressão atmosférica	1013,2	hPa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
83	Velocidade do vento	1,5	m/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
84	Temperatura do ar	30,0	°C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
85	Umidade relativa do ar	75,0	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
86	Pressão atmosférica	1013,2	hPa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
87	Velocidade do vento	1,5	m/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
88	Temperatura do ar	30,0	°C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
89	Umidade relativa do ar	75,0	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
90	Pressão atmosférica	1013,2	hPa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
91	Velocidade do vento	1,5	m/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
92	Temperatura do ar	30,0	°C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
93	Umidade relativa do ar	75,0	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
94	Pressão atmosférica	1013,2	hPa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
95	Velocidade do vento	1,5	m/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
96	Temperatura do ar	30,0	°C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
97	Umidade relativa do ar	75,0	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
98	Pressão atmosférica	1013,2	hPa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
99	Velocidade do vento	1,5	m/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
100	Temperatura do ar	30,0	°C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Especificamente sobre o Relatório da Empresa Navegação Prates, o **Sr. Leandro Guerra** exibiu o seguinte *slide*, destacando que ele teria sido emitido no dia 12 de julho, data em que obtiveram a licença e que recomendava fortemente que não fosse realizado o lançamento, devido aos riscos à própria tripulação e à carga, devidamente comprovado e com todas as indicações que se encontram no referido Relatório, tendo servido de motivação para a EAF tomar a sua decisão no sentido de cancelar o lançamento nessa janela de operação:

Também para mostrar o *status* das condições hídricas da região e o nível baixo do Rio Solimões, o **Sr. Leandro Guerra** projetou o seguinte *slide*, constatando que a seca vem atingindo severamente toda a região amazônica:

Em seguida, o **Sr. Leandro Guerra** apresentou as informações sobre o Plano de Implantação da Etapa 1 que envolve as Infovias 02, 03 e 04, cujo cronograma sobre o lançamento dos cabos, com o prazo de duração, previsões de início e de fim, bem como a presença de restrições hidrográficas e outras, encontra-se no *slide* abaixo reproduzido e por ele exibido, com a leitura das informações nele contidas:

Item

Descrição

6. PAIS ETAPA 01 – Plano de Implantação

✓ Implantação do cabo subaquático

	DURAÇÃO (lançamento do cabo)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM	RESTRIÇÕES HIDROGRÁFICAS	RESTRIÇÕES Licença e Autorizações (Status)	
INFOVIA 03	18 dias	12/03/24	30/03/24**	Sem Restrições	IBAMA Em processo (L1)	MARINHA Emissão (PSP)
INFOVIA 04	11 dias	D1+10 dias*	D1+21 dias	SET a MAR	IBAMA Em processo (L1)	MARINHA Emissão (PSP)
INFOVIA 02	29 dias	D2+10 dias*	D2+39 dias	JUL a NOV	IBAMA Emissão (L1)	MARINHA Emissão (PSP)

*As datas planejadas de início de lançamento dependem essencialmente da emissão das licenças ambientais pelo IBAMA, autorização da Marinha e das condições hidrográficas.

** A Infovia 03 foi substituída como exceção de AF03 e PO03A de PEDROS.

Legenda

CONCLUÍDO

EM EXECUÇÃO

EA

F

E, da mesma maneira, o Sr. **Leandro Guerra** apresentou as informações sobre o Plano de Implantação da Etapa 2 que envolve as Infovias 05, 06 e 08, cujo cronograma sobre o lançamento dos cabos, com o prazo de duração, previsões de início, restrições hidrográficas e licenças, foi exibido no seguinte *slide*:

6. PAIS ETAPA 02 – Plano de Implantação

	DURAÇÃO (lançamento do cabo)	PREVISÃO INÍCIO	RESTRIÇÕES HIDROGRÁFICAS	Licença e Autorizações (Status)	
INFOVIA 05	30 dias	D3+15 dias*	JUN a NOV	IBAMA	MARINHA
INFOVIA 06	60 dias	D4+15 dias*	JUN a NOV	IBAMA	MARINHA
INFOVIA 08	60 dias	D5+15 dias*	JUL a OUT	IBAMA	MARINHA

*As datas planejadas de início de lançamento dependem essencialmente da emissão das licenças ambientais pelo IBAMA, autorização da Marinha e das condições hidrográficas.

Legenda

CONCLUÍDO

EM EXECUÇÃO

EA

F

A respeito do cronograma de implantação da Etapa 2, o Sr. **Leandro Guerra** registrou que a EAF estaria na fase de contratação da empresa que realizará o Estudo de Viabilidade de Rota, para que possam submeter ao IBAMA os pedidos de licenças ambientais.

O Sr. **Leandro Guerra** exibiu o *slide* abaixo reproduzido com o objetivo mostrar o procedimento padronizado para transferência de infraestruturas da Infovia 03:

https://sei.anatel.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13999873&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001283&infra_hash=1...

32/50

20/08/24, 23:37	SEI/ANATEL - 12452042 - Registro de Reunião
Item	Descrição
	Por fim, com relação à Rede Privativa de Governo - Rede Móvel, o Sr. Leandro Guerra exibiu o <i>slide</i> abaixo e, do mesmo modo, realizou a leitura das informações nele contidas: 7. Rede Privativa de Governo – Rede Móvel ✓ EAF aguarda a aprovação pelo GAISPI do modelo a ser adotado na implantação da Rede Móvel. ✓ Após a aprovação do modelo a EAF, irá encaminhar ao GT REDES os projetos e cronograma planejado para atendimento. ✓ EAF aguarda definição quanto à regulamentação da Portaria 1.924/2021 Mcom para aquisição dos equipamentos necessários para a implantação da rede móvel. ✓ EAF participa junto com Mcom, ABIN e Coordenador GT Redes das discussões técnicas e modelo de contratação para a funcionalidade de CRIPTOGRAFIA a ser validada no GAISPI para fins de implementação na Rede Privada de Governo.  Concluída a apresentação, o Presidente do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apresentado. Concedida a palavra, o Sr. Hermano Barros Tercius cumprimentou a todos, inicialmente, e informou que o Ministério teria agendado uma reunião com o IBAMA para o dia 31 de julho às 14:30h, com o objetivo de tentar resolver a questão da Infovia 02 que está com esse limite do dia 06 de agosto. Com relação à Infovia 04, o Sr. Hermano Barros Tercius registrou que tiveram uma briga grande para conseguir e que estavam com a expectativa para o início da semana do dia 12, entre o dia 8 e dia 9, e que teria saído uma provisória, ressaltando, entretanto, que eles teriam sido comunicados de que daria certo caso saísse a definitiva até o dia 12. Nesse contexto, afirmou que, para a surpresa do Ministério, no próprio dia 12, por volta do horário de 12h, chegou essa informação da EAF no sentido de que não daria mais para mandar e que parece que teria sido em razão da antecipação da seca. Consignou, ainda, que ficou surpreso com a manifestação do Sr. Leandro Guerra nesta Reunião no sentido de que teria ocorrido 10 dias de diferença, e afirmou que correriam para não acontecer a mesma situação na Infovia 04. Finalizou afirmando que todos devem estar acompanhando essa greve e o quanto isso estaria dificultando, registrando que falaria de outros temas, a exemplo das definições da Rede Privativa, nos próximos itens desta Pauta. O Presidente do GAISPI confirmou que teria um item específico para manifestar-se sobre a Rede Privativa, o qual o Sr. Marcos Vieira Baeta Neves, Coordenador do GT-REDE, reportará ao Grupo sobre o tema. Concedida a palavra, o Sr. Leandro Guerra agradeceu o empenho do Ministério das Comunicações e afirmou que sabem que eles se empenharam bastante para conseguir a licença, e registrou que essa questão do prazo, conforme colocado em outras Reuniões do GAISPI, era o final do mês de julho, e que existe sempre aquele hiato no início de agosto e que a dinâmica da natureza não se controla, reiterando que, neste ano, o nível do rio vem secando mais rápido em relação ao ano anterior, apresentando um comportamento atípico. Afirmou que o Grupo deve considerar essas situações e entende que é uma decisão difícil, visto que todos sabem o quanto gostariam de ter lançado o cabo, mas o fato é que ficará para o próximo ciclo e que o mês de dezembro já estaria próximo, salientando que o cabo está preservado para que possam lançar com segurança. No que se refere à Infovia 04, o Sr. Leandro Guerra registrou que gostaria de destacar que a entidade tem essa segurança do dia 06 de agosto e que o fato é que um dia faz muita diferença, reiterando o comportamento atípico deste ano, e que estariam monitorando diariamente e atualizando, sendo que a perspectiva é a de que estariam preocupados, visto que a LP ainda não saiu. Nesse sentido, consignou que sabe que o IBAMA primeiramente emite a LP, para somente depois emitir a LI, e que, em alguns casos muito especiais, ele consegue emitir as duas licenças ao mesmo tempo, de sorte que a EAF também traz essa ideia, já tendo colocado isso junto ao IBAMA e que também contam com a ajuda do Ministério das Comunicações, para que possam conseguir as duas licenças ao mesmo tempo e, assim, possibilitar o lançamento da Infovia 04, visto que estaria tudo pronto em relação à parte terrestre. O Sr. Leandro Guerra finalizou sua manifestação agradecendo mais uma vez o suporte que o Ministério das Comunicações tem dado à entidade e que estariam em comunicação constante com ele.

https://sei.anatel.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13999873&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001283&infra_hash=1...

34/50

Item

Descrição

Na sequência, o **Sr. Takeshi Ikeda** exibiu o *slide* abaixo, destacando as informações nele contidas em relação às fases, mês de liberação, estados liberados e quantidade de municípios:

GT-Migração/Mitigação

FASE	MÊS DE LIBERAÇÃO	ESTADOS LIBERADOS	QUANTIDADE MUNICÍPIOS
FASE 5 A	abr/24	MA; ES; SE	220
FASE 5 B	mai/24	PB; RO; TO	236
FASE 5 C	jun/24	AC; AM; GO	168
FASE 6 A / 6 B	jul/24	MS	506
FASE 6 C	ago/24	MT; PA; PI	194
FASE 6 D	set/24	MG	189
FASE 6 E	out/24	CE; RN; PE	189
FASE 6 F	nov/24	BA	190

Municípios com 5G liberado (4.134 até Maio/24)

Municípios liberados na Fase 5 C

Municípios sendo liberados na fase 6

Fase 6 – 1.268 municípios

Com o intuito de detalhar as Fases 6-A e 6-B, o **Sr. Takeshi Ikeda** projetou o *slide* abaixo reproduzido, e lembrou que a Fase 6-A teria sido uma solicitação do setor de TV, para antecipar o atendimento dos municípios em que não existiria a TV terrestre disponível:

Item

Descrição

GT-Migração/Mitigação

FASE 6-A
315 Municípios
Iniciado TVRO em 01/07/2024

FASE 6-B
191 Municípios
Iniciado TVRO em 15/07/2024

Ato contínuo, o **Sr. Takeshi Ikeda** exibiu um gráfico que mostra a evolução da liberação da faixa de 3,5 GHz, destacando as informações nele contidas:

Relato das atividades do GT-Migração/Mitigação

Evolução Liberação da faixa de 3,5 GHz

FASE 6 (1268)

4808 municípios - FASE 6-A / 6-B

FASE 3 (1103)

FASE 2 (480)

FASE 1 (27)


FASE 5 (624)

FASE 4 (2068)

Municípios Liberados
4.808 (~86,3% - incluindo deliberação)
FASE 6-A / 6-B
506 Municípios (9%)
FASE 6 - Faltam
762 Municípios (13,6%)

Ainda nesse contexto, o **Sr. Takeshi Ikeda** exibiu o gráfico abaixo:

Item	Descrição
	Relato das atividades do GT-Migração/Mitigação Liberação da faixa de 3,5 GHz (192,9 Milhões) 92,33% Municípios Liberados 4.808 (~86,3% - incluindo deliberação) FASE B-A / B-B 506 Municípios (9%) FASE C - Faltam 762 Municípios (13,6%) O Sr. Takeshi Ikeda informou que outro ponto tratado no GT se referiu à questão da reinstalação de TVRO no estado do Rio Grande do Sul, matéria tratada na 28ª Reunião Ordinária do GAISPI e, nessa linha, projetou o seguinte slide: GT-Migração/Mitigação Reinstalação TVRO no Rio Grande do Sul - Notícia Anatel (https://www.gov.br/anatel/gpt-br/assuntos/noticias/familias-cadastradas-em-programas-sociais-poderao-receber-novas-parabolicas-digitais-em-caso-de-perda-por-cao-da-chuva) - EAF está com os sistemas preparados; - Data de corte da instalação 09/05/2024; - Total de instalação até 09/05/2024: 20.814; ~1500 instalações realizadas desde 01/06. - Somente por solicitação do interessado; - Assunto levado na 28ª RO do GAISPI: - Houve questionamento se não seria um "duplo pagamento" de kits; - Consulta PFE;

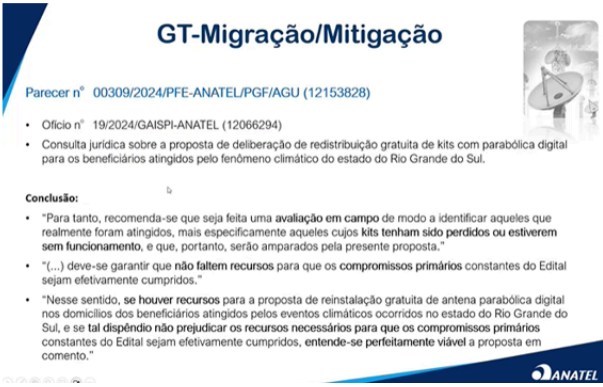20/08/24, 23:37	
SEI/ANATEL - 12452042 - Registro de Reunião	
Item	Descrição
	Sobre esse tema, o Sr. Takeshi Ikeda apresentou trechos da conclusão do Parecer da Procuradoria Federal Especializada junto à Anatel (PFE-Anatel) já mostrada pelo Sr. Leandro Guerra, conforme o seguinte <i>slide</i>:  No que se refere ao <i>slide</i> em apreço, o Sr. Takeshi Ikeda fez os seguintes destaques: 1) Quanto aos recursos, informou que a questão estaria atendida em relação ao que já foi apresentado; e 2) Quanto à questão dos kits, informou que seria realizada a avaliação em campo e será realizado o registrado em separado, conforme apresentado pelo Sr. Leandro Guerra. Concluída a apresentação, o Presidente do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apresentado. Não havendo manifestações e considerando que neste item não há deliberações, o Presidente do GAISPI passou para o item 4 da Pauta.
4	O Presidente do GAISPI registrou que, conforme apresentado pelo Sr. Takeshi Ikeda, Coordenador do GT-MIGRAÇÃO, os requisitos que permitem deliberar a antecipação da liberação da faixa de 3,5 GHz em mais 506 cidades foram atingidos. Prosseguiu afirmando que, de acordo com o item 6.3.1 do Anexo IV do Edital e a alínea “q” do item 9 do Anexo IV-A do Edital, caberia ao GAISPI decidir se o início do uso da faixa de 3,5 GHz poderá ser antecipado, individualmente por município ou em polígonos. O Presidente do GAISPI, dessa forma, considerando o exposto, colocou em deliberação a proposta de antecipação da liberação do uso da faixa de radiofrequências de 3.300 MHz a 3.700 MHz a partir do dia 05 de agosto de 2024 nas 506 cidades apresentadas, questionando aos membros do GAISPI se todos estariam de acordo com a proposta. Não havendo manifestações contrárias, o Presidente do GAISPI declarou que fica aprovada a antecipação da liberação do uso da faixa de radiofrequências de 3.300 MHz a 3.700 MHz a partir do dia 05 de agosto de 2024 nas 506 cidades já apresentadas. Também determinou que a Secretaria Executiva do GAISPI anexasse a lista dessas cidades à Ata da presente Reunião. Na sequência, o Presidente do GAISPI ressaltou que, com a presente deliberação, todos os municípios do estado do Mato Grosso do Sul foram liberados, totalizando 19 estados brasileiros completamente liberados. Informou que, até o momento, já contam com 4.808 municípios liberados para utilização da faixa de 3,5 GHz por estações do 5G <i>standalone</i>, e que, com isso, a população dessas cidades totaliza aproximadamente 197 milhões de brasileiros, representando pouco mais de 92% da população, que agora possui potencial de atendimento pelas prestadoras, nos prazos que seus modelos estratégicos e de investimentos considerarem mais oportunos.

20/08/24, 23:37		SEI/ANATEL - 12452042 - Registro de Reunião	
		Descrição	
		Finalmente, o Presidente do GAISPI registrou que é importante que essas antecipações em nada alteram o cronograma de atendimento das obrigações de instalação de ERBs, que continua como previsto no Edital, tanto para cidades maiores quanto para as de menor população. Concluída a deliberação, o Presidente do GAISPI passou para o item 5 da Pauta.	
5		O Presidente do GAISPI informou que, conforme apresentado pelo Sr. Takeshi Ikeda, Coordenador do GT-MIGRAÇÃO, essa matéria foi submetida à apreciação na 28ª Reunião Ordinária do GAISPI, ocasião em que o Sr. Wilson Diniz Wellisch questionou se a reinstalação não seria considerada um “duplo pagamento” de kits pela EAF, o que ensejou a suspensão da deliberação para a oitiva da Procuradoria Federal Especializada junto à Anatel. Assim, afirmou que foi consultada a PFE e que a conclusão do parecer foi pela plena aderência aos ditames legais, não havendo óbice à reinstalação gratuita de antena parabólica digital nos domicílios dos beneficiários atingidos pelos eventos climáticos ocorridos no estado do Rio Grande do Sul. Nesse sentido, o Presidente do GAISPI destacou que o sistema da EAF se encontra preparado para permitir a segunda instalação mediante solicitação do beneficiário elegível, considerando que, até a data de 09 de maio de 2024, já haviam sido instaladas 20.814 antenas de TVRO na Banda Ku no estado do Rio Grande do Sul. Assim, o Presidente do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se estariam todos de acordo com a proposta de redistribuição gratuita de kits com parabólica digital nos domicílios dos beneficiários atingidos pelas chuvas no estado do Rio Grande do Sul. Não havendo manifestações contrárias, o Presidente do GAISPI declarou que fica aprovada a diretriz para a reinstalação da antena TVRO na Banda Ku nos domicílios dos beneficiários atingidos pelas chuvas no estado do Rio Grande do Sul. Solicitou que a Secretaria Executiva do GAISPI elaborasse Portaria nos termos da deliberação ocorrida nesta Reunião. Por fim, o Presidente do GAISPI registrou que a Anatel e todos os membros do GAISPI, Ministério das Comunicações e operadoras, se sensibilizam e solidarizam com os eventos ocorridos no estado do Rio Grande do Sul e continuam envidando todos os esforços necessários, dentro de suas atribuições legais, para amenizar a situação enfrentada pela população em decorrência de fenômeno climático sem precedentes. Concedida a palavra, o Sr. Wilson Diniz Wellisch agradeceu, primeiramente, a compreensão de todos por submeter essa pauta à PFE, com o intuito de dar mais segurança ao processo e, em seguida, ressaltou que a conclusão da PFE teria colocado alguns condicionantes e que entende que deveriam ser seguidos. Em resposta, o Presidente do GAISPI solicitou à Secretaria Executiva do GAISPI que, na Portaria que formalizará a presente deliberação, registre as condicionantes apontadas pela Procuradoria Federal Especializada junto à Anatel em seu Parecer. Concluída a deliberação, o Presidente do GAISPI passou para o item 7 da Pauta, lembrando que o item 6 teria sido retirado de Pauta.	
6		ITEM RETIRADO DE PAUTA.	
7		O Presidente do GAISPI concedeu a palavra ao Sra. Paula Fontelles do Valle, Coordenadora do GT-F, para que fizesse um breve relato quanto ao andamento dos trabalhos no âmbito do GT. A Sra. Paula Fontelles do Valle cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e deu início à apresentação sobre o relato das atividades do GT-F, informando que o grupo realizou a sua 14ª Reunião Ordinária no dia 29 de julho de 2024, momento em que a EAF, após a transição da Coordenação do GT-F, teve a oportunidade de apresentar as seguintes matérias: 1) Resultado do 4º Trimestre de 2023; 2) Relatórios do Primeiro e Segundo Trimestres de 2024; 3) Orçamento de 2024; e 4) <i>Status</i> das RFPs. A Sra. Paula Fontelles do Valle registrou que o resultado do 4º Trimestre de 2023, bem como os Relatórios do Primeiro e Segundo Trimestres de 2024, foram apresentados previamente pelo Sr. Paulo Roberto Cruz Cozza à Coordenação e, posteriormente, no GT-F na data de ontem, ocasião em que tiveram a oportunidade de discutir e detalhar todos os pontos, inclusive com a oportunidade que será conferida agora, no mês de agosto, para conversar com os Coordenadores dos GTs, para que seja feito um trabalho mais de perto com as RFPs que se encontram em andamento para cada projeto do GAISPI. A Sra. Paula Fontelles do Valle afirmou que a EAF teria destacado que o relatório da auditoria concluiu pela avaliação de conformidade das contas de 2023 e, que, posteriormente, esse relatório teria sido objeto de apreciação pelo Conselho Fiscal e aprovação em Assembleia Geral Ordinária no mês de abril do corrente ano, conforme estabelece o Estatuto. Na sequência, a Sra. Paula Fontelles do Valle informou que o orçamento para 2024 foi aprovado em Assembleia Geral Ordinária da EAF, ressaltando que foram consideradas as premissas apontadas no relato do Sr. Paulo Roberto Cruz Cozza ao longo desta Reunião, as quais destacou:	


SEI/ANATEL - 12452042 - Registro de Reunião	
Item	Descrição
	1) A entrega das Infovias 02 e 03, ressaltando que a entrega da Infovia 02, segundo <i>report</i> do Sr. Leandro Guerra, teria restado prejudicada pelos motivos já expostos em relação às condições climáticas; 2) A previsão do início da construção das redes móvel e fixa do projeto da Rede Privativa; 3) Os gastos com recursos humanos; 4) A comunicação nas cidades atendidas, já com a expectativa das condições que terão até o final do ano, e respectivos postos de atendimento, segundo estimativa para o ano de 2024, já com a internalização da diminuição dos postos, dada a modificação que acontecerá e será relatada posteriormente pelo GT-F; 5) Instalações dos kits de TVRO; e 6) Dados financeiros e os impostos a serem recolhidos. A Sra. Paula Fontelles do Valle fez os seguintes destaques: 1) Até o fechamento do Relatório do 2º Trimestre, informou que a EAF teria reportado os principais processos de aquisição que foram adjudicados, cujo valor final total é de aproximadamente 420 milhões; 2) Ainda sobre o <i>status</i> das RFPs, afirmou que a EAF teria informado que, neste mês de julho, foram adjudicadas duas RFPs, a saber: a RFP para aquisição de cabos para o projeto de infovias; e a RFP para aquisição de aproximadamente 1 milhão de kits para o projeto de TVRO. Ressaltou que essas RFPs não foram reportadas no momento, tendo em vista que farão parte do relatório do 3º trimestre e serão reportadas oportunamente ao GT-F; e 3) Para os próximos meses, informou que é esperada a continuidade da RFP para o Estudo de EVR para definição das rotas das infovias e o “relançamento” da RFP para a compra de equipamentos para a rede privativa, com ajustes na cotação de preços, a depender das deliberações que ocorrerem nesta Reunião Ordinária. Por fim, a Sra. Paula Fontelles do Valle registrou que todos esses assuntos estão sendo acompanhados pelo GT-F e serão objeto da próxima reunião do grupo a ser marcada oportunamente e, finalizando o seu relato, colocou-se à disposição e agradeceu a atenção de todos. Concluída a apresentação, o Presidente do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apresentado. Não havendo manifestações e considerando que neste item não há deliberações, o Presidente do GAISPI passou para o item 8 da Pauta.
8	O Presidente do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Takeshi Ikeda, Coordenador Substituto do GT-PAIS, para que fizesse um breve relato sobre as atividades no âmbito do GT. O Sr. Takeshi Ikeda cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e deu início à apresentação sobre o relato das atividades do GT-PAIS, exibindo as informações constantes do <i>slide</i> abaixo reproduzido:

Item	Descrição
	GT PAIS Segundo semestre ações da EAF serão direcionadas para as seguintes atividades: Execução de Estudo de Viabilidade Preliminar observando principalmente condições de navegabilidade e infraestrutura de energia elétrica • Infovia 05 (Autazes/AM-Porto Velho/RO) • Infovia 06 (Manacapuru/AM-Rio Branco/AC) • Infovia 08 (Fonte Boa/AM-Cruzeiro do Sul/AC) Integração e Interoperabilidade das Infovias • Manaus/AM (CENTRO DA INFOVIA) • Macapá/AP (Infovia 00 / Infovia 03) • Vila de Moura/AM (PAC / Infovia 04) • Telé/AM (PAC / Infovia 02)  Concluída a apresentação, o Presidente do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apresentado. Não havendo manifestações e considerando que neste item não há deliberações, o Presidente do GAISPI passou para o item 9 da Pauta.
9	O Presidente do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Marcos Vieira Baeta Neves, Coordenador do GT-REDE, para que fizesse um breve relato sobre as atividades no âmbito do GT. O Sr. Marcos Vieira Baeta Neves cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e deu início à apresentação sobre o relato das atividades do GT-REDE, informando que a 12ª Reunião do grupo foi realizada no dia 18 de julho de 2024, projetando o <i>slide</i> abaixo reproduzido que mostra os assuntos em pauta na ocasião: 

Item	Descrição
	Sobre os assuntos tratados na 12ª Reunião do GT-REDE, o Sr. Marcos Vieira Baeta Neves passou a comentar, primeiramente, sobre a Rede Móvel e a Nota Técnica nº 10.131/2024/SEI-MCOM, com a exibição do seguinte <i>slide</i>:  Em seguida, o Sr. Marcos Vieira Baeta Neves projetou o <i>slide</i> a seguir transcrito para explanar acerca da Rede Fixa, especificamente quanto ao faseamento e aos pontos definidos no Ofício nº 17.340/2024/MCOM:  Retomando o tema da Rede Móvel, o Sr. Marcos Vieira Baeta Neves apresentou o modelo que foi definido pela Nota Técnica nº 10.131/2024/SEI-MCOM, a fim de que o grupo tenha um alinhamento de como foi estruturado o produto final, nos termos do <i>slide</i> abaixo reproduzido:

REDE DE MISSÃO CRÍTICA

Faseamento

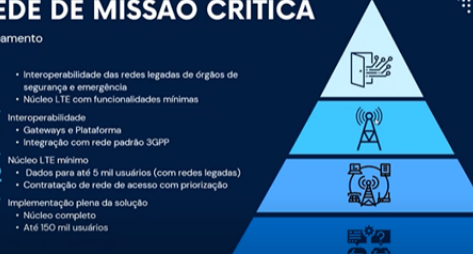

- 1 Interoperabilidade das redes legadas de órgãos de segurança e emergência
 - Núcleo LTE com funcionalidades mínimas
- 1.1 Interoperabilidade
 - Gateways e Plataforma
 - Integração com rede padrão 3GPP
- 1.2 Núcleo LTE mínimo
 - Dados para até 5 mil usuários (com redes legadas)
 - Contratação de rede de acesso com priorização
- 2 Implementação plena da solução
 - Núcleo completo
 - Até 150 mil usuários

Item	Descrição
	Em relação à Fase 1.2 – Núcleo LTE mínimo, acrescentou que a contratação do <i>RAN Sharing</i> seria liderada pela Telebrás e a EAF faria o subsídio dos requisitos técnicos. Na sequência, o Sr. Marcos Vieira Baeta Neves projetou o <i>slide</i> abaixo reproduzido, com as propostas de encaminhamento tanto para o GT-REDE quanto para o GAISPI:  Ainda nesse contexto, o Sr. Marcos Vieira Baeta Neves fez os seguintes destaques: 1) Proposta 01 do GT-REDE: informou que a EAF trará o cronograma da Rede Fixa e da Rede Móvel, já prevendo esses novos cenários, tanto os pontos da Rede Fixa quanto as questões de complementariedade de redes, conforme levantado pelo grupo, acerca da necessidade de que a EAF considere nos projetos essa complementariedade com as redes já existentes; 2) Proposta 01 do GAISPI: quanto aos padrões de governança, ressaltou que o grupo entendeu que seria adequado utilizar o questionário proposto pela EAF nas reuniões pretéritas, uma vez inexistir regulamentação específica da Portaria nº 1924, desde que não seja feita uma restrição quanto à participação nos processos de aquisição; e 3) Proposta 02 do GAISPI: informou que os requisitos técnicos a serem considerados nas negociações do <i>RAN Sharing</i> seriam propostos pela EAF, ressaltando que as negociações em si seriam de responsabilidade do Ministério e da Telebrás; e que a aquisição do produto 2 estaria condicionada à finalização do contrato de <i>RAN Sharing</i>, com o objetivo de se ter a segurança de que a aquisição do núcleo LTE não se daria de forma a não conseguir ser posteriormente implementado. Concluída a apresentação, o Presidente do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apresentado. Concedida a palavra, o Sr. Hermano Barros Terciusi informou que gostaria de trazer algumas observações sobre esses encaminhamentos, primeiramente quanto à Rede Fixa: 1) Especificamente com relação ao ponto “considerar a sobreposição de redes no projeto”, registrou que, após o envio do Ofício com os 6.500 pontos decididos pela Telebrás, com a participação do Ministério e com algumas interações com as empresas, surgiu uma dúvida a partir de uma observação da CGU que, por sua vez, estaria realizando uma auditoria na Rede Fixa e teria questionado possíveis sobreposições das redes de outros órgãos, em especial o MGI com o SERPRO; 2) afirmou que, desde então, fizeram diversas interações com o MGI, esclarecendo que essa auditoria da CGU teria surgido de uma reclamação inicial do MGI e que, dessa auditoria, resultaram duas recomendações para o Ministério das Comunicações e diversas para o MGI, salvo engano, seriam oito recomendações, de modo que o MGI fez a reclamação e recebeu a maior quantidade de recomendações de trabalho e que, depois de diálogo com o MGI, soube que era isso que eles queriam que era participar das discussões; 3) Registrou que o projeto encaminhado estaria bem aderente ao que o MGI espera e que não teria nada que pudesse impedir o começo desse projeto da Rede Fixa neste momento, por estar alinhado com o MGI;

20/08/24, 23:37

SEI/ANATEL - 12452042 - Registro de Reunião

Item	Descrição
	4) afirmou que há uma discussão pequena sobre possíveis áreas de sobreposição, ressaltando que parece ser algo em torno de apenas 5 km, e que também teria uma discussão se essa sobreposição poderia até ser necessária, visto que as redes existentes estariam sobrecarregadas e que possivelmente precisaria fazer; 5) informou que estaria faltando uma última reunião com o SERPRO e a Telebrás, reiterando que não haveria nada que impedisse de começar o projeto da maneira como foi proposto pelo Sr. Marcos Vieira Baeta Neves, considerando essas possíveis sobreposições de redes que poderiam possivelmente diminuir um pouco o que deve ser feito pela EAF; e 6) afirmou que poderia trazer depois ao GAISPI essa informação do que foi verificado acerca das sobreposições, ressaltando que entende que a deliberação já ficaria completa dessa maneira que está proposta. Em complemento, o Sr. Marcos Vieira Baeta Neves registrou que soube que essa auditoria da CGU teria ficado mais restrita ao DF e esclareceu que essa consideração que deve ser feita sobre as sobreposições se estenderia a todas as capitais, visto que é prevista uma rede para as 27 capitais e que pode ser que existam redes municipais sobrepostas ao projeto em alguns estados. Retomando a palavra, o Sr. Hermano Barros Tercius informou que, no que se refere à Portaria comentada e que traz os padrões de governança nas duas redes, ela já estaria pronta e aprovada pela PFE, e que o Ministro estaria apenas aguardando o encaminhamento de tudo para assiná-la ao final, afirmando que, com essa deliberação de hoje, provavelmente já teria essa Portaria assinada o mais rapidamente possível. Em relação à Rede Móvel, o Sr. Hermano Barros Tercius fez as seguintes observações: 1) informou que o projeto proposto pelo Ministério já foi bem colocado pelo Sr. Marcos Vieira Baeta Neves e que, conforme diálogo interno do grupo e com integrantes do GAISPI, poderiam aceitar, neste momento, a autorização do início do Produto 1 da Fase 1; 2) Ressaltou que a Fase 2 somente seria, de fato, iniciada posteriormente, sendo que o Produto 2 da Fase 2, por depender do acordo de <i>RAN Sharing</i> que estão discutindo se poderá ser feito ou não, ele concorda em aprovar, agora, somente o Produto 1.1, conforme colocado pelo Sr. Marcos Vieira Baeta Neves, que diz respeito à interoperabilidade; 3) afirmou que continuariam essa negociação do <i>RAN Sharing</i> e que, avançando, trariam para o GAISPI a aprovação do Produto 1.2, se for o caso, ou direto e possivelmente a aprovação da Fase 2, dependendo do encaminhamento tanto do acordo de <i>RAN Sharing</i> com as prestadoras quanto da própria Telebrás e dos órgãos usuários; 4) informou que estariam em tratativas com o Ministério da Justiça para entender melhor a demanda dessa rede e participar mais do projeto, se for ter a Fase 2; e 5) Registrou seu entendimento de que nada disso justificaria atrasar mais essa interoperabilidade, tendo em vista que ela já seria consenso há um bom tempo, de modo que se deveria liberar a EAF para adquirir esses equipamentos o mais rapidamente possível, trazendo essa entrega e esse benefício ao Poder Público e à sociedade brasileira. Não havendo manifestações adicionais, o Presidente do GAISPI passou para o item 10 da Pauta.
10	O Presidente do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se estariam de acordo com a lista de pontos da Rede Rixa da Rede Privativa de Comunicação da Administração Pública Federal apresentada pelo Coordenador do GT-REDE, Sr. Marcos Vieira Baeta Neves, devidamente circulada entre os membros do GAISPI com a antecedência necessária. Não havendo manifestações contrárias, o Presidente do GAISPI declarou que fica autorizada a utilização da lista de pontos da Rede Fixa para o projeto da Rede Privativa de Comunicação da Administração Pública Federal, nos termos da planilha encaminhada pelo MCOM por meio do Ofício nº 17.340/2024/MCOM, de 22 de maio de 2024, a qual foi devidamente circulada entre os membros do GAISPI com a antecedência necessária. Adicionalmente, o Presidente do GAISPI determinou à EAF que considerasse, no projeto da Rede Fixa, a complementariedade com redes de governo existentes, conforme estabelecido no Edital, bem como avaliasse a viabilidade de aquisição de infraestrutura detida por entidades privadas. Prosseguiu afirmando que, no que diz respeito à preocupação apontada pelo representante da EAF quanto à necessidade de observância de padrões de governança no processo de aquisição de equipamentos para a Rede Privativa, caberia destacar que, na ausência de regulamentação específica, a EAF deverá considerar o que estabelece a Portaria nº 1.924/SEI-MCOM, de 29 de janeiro de 2021. Para tanto, o Presidente do GAISPI informou que poderia ser aplicado o questionário elaborado pela entidade e apresentado neste GAISPI em reuniões pretéritas, sem que seja impedida a participação, <i>a priori</i>, de qualquer fabricante. Nestes termos, o Presidente do GAISPI solicitou à Secretaria Executiva do GAISPI o registro em Ata da presente manifestação. Concluída a deliberação, o Presidente do GAISPI passou para o item 11 da Pauta.
11	O Presidente do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se estariam de acordo com o projeto de Rede Móvel da Rede Privativa de Comunicação da Administração Pública Federal apresentado pelo Coordenador do GT-REDE, Sr. Marcos Vieira Baeta Neves, devidamente circulado entre os membros do GAISPI com a antecedência necessária. Concedida a palavra, o Sr. Anderson Emanuel de Azevedo Gonçalves afirmou que gostaria de compreender com mais detalhes a deliberação e que estaria entendendo que haveria uma fase 1 subdivida em 2 pontos: a aquisição das plataformas de integração de sistemas legados para missão crítica, ponto no qual não teria nenhuma restrição; e quanto à questão que envolve o <i>RAN Sharing</i>, questionou se ela estaria sendo aprovada nesta Reunião Ordinária.

20/08/24, 23:37

SEI/ANATEL - 12452042 - Registro de Reunião

Item	Descrição
	O Presidente do GAISPI esclareceu que essa questão não estaria sendo aprovada hoje, e que ela estaria ficando condicionada à conclusão da negociação do acordo de <i>RAN Sharing</i>. Nesse contexto, reforçou que para se comprar o equipamento e torná-lo útil será necessário o acordo de <i>RAN Sharing</i>, de modo que primeiro se faz o acordo de <i>RAN Sharing</i> e, em seguida, se faz a aquisição. Concedida a palavra, a Sra. Monique Pereira Ibitinga de Barros afirmou que entende que a sua pergunta se assemelha ao questionamento do Sr. Anderson Emanuel de Azevedo Gonçalves, registrando que, com o texto proposto, estariam deliberando pela EAF elaborar os requisitos técnicos para negociação de <i>RAN Sharing</i> e, dito isso, questionou se a EAF elaborará tais requisitos e trará de volta ao GAISPI para uma validação. O Sr. Vinícius Oliveira Caram Guimarães esclareceu que, com essa deliberação, teriam que lançar as novas RFPs, e que tendo as novas RFPs e os acordos de <i>RAN Sharing</i>, partiriam para as aquisições. Com o intuito de explicar sua preocupação, a Sra. Monique Pereira Ibitinga de Barros consignou que a EAF elaborando os requisitos técnicos, talvez as prestadoras que estão na EAF sejam participantes dessa RFP e serem as prestadoras que deliberam os requisitos técnicos torna a situação um pouco difícil, de modo que não sabe se seria melhor a EAF preparar e trazer ao GAISPI para validação, sendo, portanto, essa a sua preocupação. O Sr. Marcos Vieira Baeta Neves esclareceu que havia pensado em fazer isso na forma de diretrizes, ou seja, a EAF elaboraria e apresentaria dentro do GT-REDE, e que, na forma de Diretrizes Técnicas, esses requisitos seriam aprovados e, aí sim, considerados pela Telebrás nas negociações. A Sra. Monique Pereira Ibitinga de Barros questionou se teria uma Ata do GT-REDE. O Sr. Marcos Vieira Baeta Neves esclareceu que se o grupo entender adequado, poderia trazer para a validação do GAISPI, afirmando que, a princípio, não veria problema. O Presidente do GAISPI sugeriu que a matéria fosse levada ao GT-REDE para discussão e, se achar necessário no âmbito do grupo, trariam na próxima Reunião, ressaltando que o importante é a primeira fase, isto é, o primeiro produto, que trata de a plataforma de integração já ser adiantada, visto que essa questão do <i>RAN Sharing</i> seria um acordo de <i>RAN Sharing sui generis</i> e não um acordo tradicional de <i>RAN Sharing</i> como a VIVO, a CLARO e a TIM celebram entre elas. Afirmando ser um acordo diferente, o Presidente do GAISPI salientou a necessidade de verificar como será o seu desenho e para que o projeto como um todo não fique esperando a conclusão dessa negociação, sustentou que a primeira fase já deveria ser antecipada – plataforma de integração – e condicionar o <i>core</i> à conclusão desse processo de negociação que será construído sem referência de mercado. Concedida a palavra, o Sr. Anderson Emanuel de Azevedo Gonçalves reforçou que o nome <i>RAN Sharing</i> entre operadoras se refere ao uso da rede da outra operadora quando ela não tem direito nenhum, além daquele direito que o próprio usuário da operadora tem, ou seja, não existe um super direito. E, nesse ponto, afirmou que gostaria de dizer que o que se tem discutido não se compara com o <i>RAN Sharing</i>, sendo uma rede diferenciada com critérios diferentes que não se enquadram necessariamente no uso padrão que eles têm de mercado. Aproveitando essa manifestação, o Presidente do GAISPI justificou que é por isso essa ponderação de tratá-lo mais adiante, por ser um acordo <i>sui generis</i>, uma vez que, geralmente, os acordos de <i>RAN Sharing</i> que a Anatel aprova, haveria a presença de diferentes partes colocando <i>RAN</i> no acordo, sendo que, neste caso, não haverá. Afirmando que seria como uma exploração industrial de rede e que estariam utilizando o nome <i>RAN Sharing</i> como abuso de linguagem, porém cientes de que não seria o produto <i>RAN Sharing</i> que tradicionalmente a Anatel aprova. Concedida a palavra, o Sr. Antonio Celso Guimarães Teixeira, em complemento à manifestação do Sr. Anderson Emanuel de Azevedo Gonçalves, afirmou que, tecnicamente, nas redes MSX, essa solução se chama SMVNO, isto é, trata-se de uma operação virtual securizada (<i>sic</i>) e que tem vários exemplos internacionais de rede MSX feitas usando isso, e registrou que a EAF está tecnicamente acompanhando esses padrões com a assistência de especialistas da área e que entende que, na especificação, isso será esclarecido. Finalizou afirmando que concorda totalmente com o posicionamento de que o nome correto não seria <i>RAN Sharing</i>, mas, sim, SMVNO. Concedida mais uma vez a palavra, o Sr. Anderson Emanuel de Azevedo Gonçalves afirmou que entende que a atribuição da EAF seria fazer uma proposta de requisitos para a aprovação no GT técnico e depois no GAISPI, e que não seria exatamente a atribuição “elaboração de requisitos para serem considerados na negociação diretamente”, pois estaria parecendo que a EAF faz, entrega e ponto, e que entende que não seria dessa forma. O Presidente do GAISPI questionou ao Sr. Anderson Emanuel de Azevedo Gonçalves e à Sra. Monique Pereira Ibitinga de Barros se eles gostariam de discutir os requisitos técnicos no GT-REDE. Ambos esclareceram que não gostariam que fosse uma decisão da EAF sobre os requisitos técnicos e que poderia ser uma proposição da entidade para avaliação do GT técnico e aprovação pelo GAISPI. O Presidente do GAISPI questionou se os requisitos precisariam mesmo serem aprovados pelo GAISPI e se não poderiam ficar apenas no âmbito do GT-REDE. A Sra. Monique Pereira Ibitinga de Barros afirmou que poderiam ser aprovados pelo GT-REDE se tivesse uma Ata, visto que, normalmente, inexistem registros. Concedida a palavra, o Sr. Leandro Guerra salientou que o Sr. Marcos Vieira Baeta Neves teria feito uma proposta bastante pertinente, em sua visão, uma vez que para complementar diretrizes de redes e sistemas necessariamente passa pelo GT-REDE e depois o GAISPI apenas valida e confirma, sendo esse processo mais simples e natural. Afirmando, então, que a EAF

20/08/24, 23:37		SEI/ANATEL - 12452042 - Registro de Reunião	
	Item	Descrição	
		faria a proposta das especificações no âmbito do GT, por ser uma diretriz e, uma vez alinhado, o GAISPI aprova. O Sr. Vinícius Oliveira Caram Guimarães esclareceu ao Presidente do GAISPI que esse seria o padrão e, em complemento, o Sr. Wilson Diniz Wellisch consignou que o GT não delibera, mas apenas o GAISPI. Feito o debate e não havendo manifestações contrárias, o Presidente do GAISPI declarou que fica autorizado o início da Fase 1 da Rede Móvel Privativa de Comunicação da Administração Pública Federal, nos termos da Nota Técnica nº 10.131/2024/SEI-MCOM, enviada pelo Ministério das Comunicações por meio do Ofício nº 20.196/2024/MCOM, de 06 de junho de 2024, e devidamente circulada entre os membros do GAISPI com a antecedência necessária. Prosseguiu afirmando que, no que diz respeito às atribuições da EAF no processo de negociação do acordo de <i>RAN Sharing</i> previsto no modelo definido para a Rede Móvel, caberia esclarecer estarem restritas à elaboração da proposta de requisitos técnicos que deverão ser apresentados no GT-REDE e aprovados no GAISPI, e que esses requisitos serão considerados quando da negociação de tal acordo pelo MCOM ou pela Telebrás, considerando as atribuições previstas no Decreto nº 9.612, de 17 de dezembro de 2018, alterado pelo Decreto nº 11.299, de 21 de dezembro de 2022. Adicionalmente, o Presidente do GAISPI registrou aplicarem-se à Rede Móvel as mesmas considerações relativas ao processo de aquisição de equipamentos registradas na deliberação havida no item 10 da presente Reunião. afirmou ainda ser importante consignar que a presente autorização se aplica de maneira imediata à aquisição dos equipamentos relacionados ao produto 1 da Fase 1, devendo a aquisição dos equipamentos referentes ao produto 2 da Fase 1, <i>core</i> LTE mínimo, ficar condicionada à conclusão do acordo de <i>RAN Sharing</i>. Nestes termos, solicitou à Secretaria Executiva do GAISPI o registro em Ata da presente manifestação. Concedida a palavra, o Sr. Leandro Guerra afirmou que estaria entendendo que houve o encaminhamento da questão da Portaria e que não poderia deixar de registrar, em relação a esse padrão de governança previsto no Portaria nº 1.924, e considerando essa deliberação tomada nesta Reunião Ordinária que, por sua vez, autoriza o uso do questionário apresentado pela EAF e a não exclusão de qualquer fornecedor que apresente proposta nos processos de concorrência das Redes Privativas Fixa e Móvel, que entende importante e necessário, antes de que a EAF venha a publicar no mercado esses novos processos de concorrência, que a própria entidade faça uma avaliação interna dessas condições para que possam ter um processo com a maior segurança jurídica possível. Desse modo, registrou que gostaria de deixar claro que isso ainda passará por uma avaliação da entidade para que possam dar andamento aos processos de compra que deverão ser republicados agora, a partir dessa deliberação. O Presidente do GAISPI esclareceu que isso estaria expressamente colocado na deliberação do item 10 desta Pauta que, por sua vez, é remetido na deliberação deste item 11, e que assim dispôs: “A EAF deverá considerar o que estabelece a Portaria nº 1.924/SEI-MCOM, de 29 de janeiro de 2021, e para tanto, o poderá ser aplicado o questionário elaborado pela entidade e apresentado em reuniões pretéritas, sem que seja impedida a participação, <i>a priori</i>, de qualquer fabricante”. Concluída a deliberação, o Presidente do GAISPI passou para o item 12 da Pauta.	
12		O Presidente do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Henrique Gomes Pinheiro, Coordenador do GT-COM, para apresentação. O Sr. Henrique Gomes Pinheiro cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e deu início à apresentação sobre o relato das atividades do GT-COM, informando que o grupo se reuniu pela última vez no dia 17 de julho, ocasião em que realizaram o acompanhamento das ações de comunicação da EAF que seguem acontecendo. O Sr. Henrique Gomes Pinheiro destacou também o que foi decidido nesta Reunião Ordinária quanto à reinstalação dos kits do Rio Grande do Sul, afirmando que foi detalhado o plano da EAF sob o ponto de vista da comunicação, em que a entidade começará a atuar com agentes locais, verificando a situação, visto que cada município se encontra em uma situação distinta, alguns já podem iniciar eventualmente o agendamento e as instalações e outros ainda podem se encontrar em uma situação mais crítica, de modo que somente poderão fazer em um momento futuro. Afirmou que, assim detectada com os agentes locais a situação de cada município, a EAF deve iniciar o plano de comunicação local, com a participação e ajuda oferecida pela radiodifusão, pelas suas equipes de jornalismo, e, desta forma, deve acontecer esse processo de reinstalação. Concluída a apresentação, o Presidente do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apresentado. Não havendo manifestações e considerando que neste item não há deliberações, o Presidente do GAISPI passou para o item 13 da Pauta.	
13		O Presidente do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se possuíam outro assunto que quisessem tratar na presente Reunião. Concedida a palavra, o Sr. Leandro Guerra informou que gostaria de realizar uma correção em sua manifestação para registrar, quanto à Infovia 02, que a data era 30 de junho e não 30 de julho, como havia comentado, visto que acabou acontecendo a licença em 12 de julho. O Presidente do GAISPI questionou se a Infovia 04 continua com a data de 06 de agosto, sendo que o Sr. Leandro Guerra confirmou que sim e que essa é a data limite para o lançamento do cabo e que, até essa data, precisariam da licença de instalação.	

20/08/24, 23:37SEI/ANATEL - 12452042 - Registro de Reunião

Item	Descrição
	Não havendo manifestações adicionais, o Presidente do GAISPI passou para o item 14 da Pauta.
14	O Presidente do GAISPI propôs que a próxima Reunião Ordinária do GAISPI seja realizada no dia 27 de agosto de 2024 (terça-feira) às 10:00h, de forma remota, questionando aos membros do GAISPI se estariam todos de acordo com essa data. Não havendo manifestações contrárias, o Presidente do GAISPI declarou que fica definida a data da 31ª Reunião Ordinária do GAISPI para o dia 27 de agosto de 2024 (terça-feira) às 10:00h, de forma remota. Concluídos os assuntos constantes da Pauta, o Presidente do GAISPI declarou encerrada a 30ª Reunião Ordinária do Grupo e agradeceu a presença e o empenho de todos os membros.

Segue a presente Ata de Reunião assinada eletronicamente pelos participantes acima identificados e aprovada na 31ª Reunião Ordinária do GAISPI, realizada em 27 de agosto de 2024.

Referência: Processo nº 53500.088928/2021-76SEI nº 12452042
