



REGISTRO DE REUNIÃO

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DAS SOLUÇÕES PARA OS PROBLEMAS DE INTERFERÊNCIA NA FAIXA DE 3.625 A 3.700 MHZ - GAISPI

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GAISPI

Data	Horário de Início	Horário de Término	Local
24 de setembro de 2024.	09:56	11:12	Plataforma Teams

1. PARTICIPANTES
- 1.1. Membros do GAISPI:

FUNÇÃO	MEMBRO	NOME	Presente na reunião?
Presidente do GAISPI	-	Carlos Manuel Baigorri	NÃO
Secretário Executivo do GAISPI	-	Vinícius Oliveira Caram Guimarães	SIM
Representante do Ministério das Comunicações	Titular	Wilson Diniz Wellisch	NÃO
	Suplente	Maximiliano Salvadori Martinhão	NÃO
Representantes da Proponentes Vencedoras dos Lotes do Tipo B	Titular	Antônio Oscar de Carvalho Petersen	NÃO
	Suplente	Monique Pereira Ibitinga de Barros	SIM
	Titular	Camilla Tedeschi de Toledo Tapias	NÃO
	Suplente	Anderson Emanuel de Azevedo Gonçalves	SIM
	Titular	Mario Girasole	NÃO
	Suplente	Marcelo Concolato Mejias	SIM
Representantes dos Radiodifusores	Titular	Flavio Ferreira de Lara Resende	SIM
	Suplente	Cristiano Reis Lobato Flores	NÃO
	Titular	Samir Amando Granja Nobre Maia	NÃO
	Suplente	Wander Almeida de Souza	NÃO
	Titular	Luiz Carlos Abrahão	SIM
	Suplente	Carlos Eduardo Neiva Melo	NÃO
Representantes das Exploradoras de Satélites	Titular	Lincoln Amazonas Antunes de Oliveira	SIM
	Suplente	Michelle Machado Caldeira	NÃO
	Titular	Fabio Franco Costa de Alencar	SIM
	Suplente	Luis Fernando Barros Costa Fernandes	NÃO
	Titular	Márcio André de Assis Brasil	SIM
	Suplente	Rodrigo Soares Campos	SIM
Representantes das Proponentes Vencedoras dos Lotes C1 a C8 e D1 a D32	Titular	José Roberto Nogueira	NÃO
	Suplente	Katia Costa da Silva Pedroso	NÃO
	Titular	Margaret de Almeida Cadête Moonsammy	SIM
	Suplente	Wagner Zanini Barreira	NÃO
	Titular	Vítor Elísio Góes de Oliveira Menezes	SIM

FUNÇÃO	MEMBRO	NOME	Presente na reunião?
	Suplente	Mariana Rezende	NÃO

PARTICIPANTES EXCEPCIONAIS:

Nome	Representando	Entidade
Marcelo Cotta da Silva	Grupo Telefônica	TELEFÔNICA

1.2. Outros Participantes:

Nome	Órgão/Instituição/Empresa
Chirlene Silva	Anatel (terceirizada)
Henrique Gomes Pinheiro	Anatel/APC - Coordenador do GT-COM
Lauro Leandro Rutkowski	Anatel
Leandro Enrique Lobo Guerra	EAF
Patrícia de Oliveira Abreu	EAF
Paula Fontelles do Valle	Anatel
Sidney Azeredo Nince	Anatel
Takeshi Ikeda	Anatel
Karine Karine Medeiros Dias	Anatel
Marcos Vieira Baeta Neves	Anatel/SOR -Coordenador do GT-REDE
Ricardo Lamongi Dieckmann	EAF
Paulo Roberto Cruz Cozza	EAF
Antonio Celso Guimaraes Teixeira	MCOM
Antônio Parrini Pimenta	EAF
Sebastiao Sergio de Oliveira Junior	TIM
Dulcidio Elias Oliveira Pedrosa	EAF
Marcelo Cotta da Silva	Telefônica
Rogério Adriano Fernandes	Anatel
Silvio Artur Meira Starling	EAF
Vitor Elisio Góes Oliveira Menezes	Liggavc

2. PAUTA

Item	Descrição
1	ITEM 1 DA PAUTA: APROVAÇÃO DA ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024.
2	ITEM 2 DA PAUTA: INFORME DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE ADMINISTRADORA DA FAIXA DE 3,5 GHz (EAF).
3	ITEM 3 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE MIGRAÇÃO E MITIGAÇÃO – GT-MIGRAÇÃO.
4	ITEM 4 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO SOBRE A ANTECIPAÇÃO DE CIDADES PARA A LIBERAÇÃO DO USO DA FAIXA DE RADIOFREQUÊNCIAS DE 3.300 MHZ A 3.700 MHZ.
5	ITEM 5 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO DO PRAZO DE ATENDIMENTO DO ITEM 5.8.1 DA DIRETRIZ DE MIGRAÇÃO.
6	ITEM 6 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DO PROGRAMA AMAZÔNIA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL – GT-PAIS.

Item	Descrição
7	ITEM 7 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE REDE PRIVATIVA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL – GT-REDE.
8	ITEM 8 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO – GT-COM.
9	ITEM 9 DA PAUTA: OUTROS ASSUNTOS.
10	ITEM 10 DA PAUTA: DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE OUTUBRO DE 2024.

3. RELATO DA REUNIÃO

Item	Descrição
Saudação	Inicialmente, o Secretário Executivo do GAISPI, Sr. Vinícius Oliveira Caram Guimarães, deu boas-vindas e agradeceu a presença de todos e informou que devido à excepcional ausência do Presidente do GAISPI, Sr. Carlos Manuel Baigorri, e conforme a previsão do art. 15 do Regimento Interno, faria a sua substituição nesta Reunião. O Secretário Executivo do GAISPI registrou, antes de dar início aos trabalhos da 32ª Reunião Ordinária, a inclusão de item de Pauta que surgiu no GT-MIGRAÇÃO referente à deliberação para aumentar o prazo do atendimento, a pedido dos beneficiários, para instalação do kit em Banda Ku nos casos de interferência, como o item 4 e renumerando-se os itens subsequentes. O Secretário Executivo do GAISPI destacou que a inclusão desse item na Pauta se justifica em razão do avanço do projeto, com a EAF fazendo um trabalho muito bem-feito com o seu time e acelerando esse trabalho de distribuição dos kits, tendo sido reportada na reunião do GT-MIGRAÇÃO, realizada no dia 18, de modo que haveria a necessidade de ter um movimento para essa distribuição de kits em algumas cidades em que o prazo em vez de 5 dias deve ser flexibilizado em 5 e 15. O Secretário Executivo do GAISPI questionou se todos estariam de acordo com a inclusão do item e não houve manifestações. Na sequência, o Secretário Executivo do GAISPI registrou, ainda, a participação de Representante Excepcional, a saber: - Sr. Marcelo Cotta da Silva representando o Grupo Telefônica. Feitos os esclarecimentos iniciais, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 1 da Pauta.
1	O Secretário Executivo do GAISPI informou que a EAF, por meio do seu Presidente, Sr. Leandro Guerra, solicitou ajustes pontuais sobre a minuta da Ata previamente circulada. Desta forma, questionou aos membros do GAISPI se existiriam outros ajustes em relação à versão encaminhada do documento. Não havendo manifestações, o Secretário Executivo do GAISPI declarou que fica aprovada a Ata da 31ª Reunião Ordinária do GAISPI e, ato contínuo, determinou à Secretária Executiva do GAISPI que efetuasse os ajustes, conforme apontados pela EAF, bem como disponibilizasse o documento para conhecimento dos membros do GAISPI. Concluída a deliberação, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 2 da Pauta.
2	O Secretário Executivo do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Leandro Guerra, para que fizesse o relato das atividades. O Sr. Leandro Guerra cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes e passou a projetar uma apresentação, cuja agenda do Informe das atividades da EAF abordou os seguintes itens: - I – Migração TVRO; - II – Planejamento Fase 6; - III – Municípios com limpeza da faixa 3,5 GHz concluída; - IV – Planejamento TVRO – Plano de Aceleração de Instalação; - V – Projeto PAIS; e - VI – Projeto Rede Privativa de Governo. Sobre o primeiro item de sua agenda, <u>Migração TVRO</u>, o Sr. Leandro Guerra projetou o <i>slide</i> abaixo reproduzido que apresenta um gráfico que mostra o acumulado de instalações realizadas mensalmente:

1. Migração TVRO – Acumulado Instalações Realizadas (22/09/24)

Distribuição Regional das Instalações:

Região	Porcentagem
Nordeste	67%
Norte	16%
Sudeste	10%
Centro Oeste	4%
Sul	3%

Acumulado Instalações Realizadas (em milhões):

Data	Acumulado (milhões)
Jun/22	1
Jul/22	119
Ago/22	1.448
Set/22	4.725
Out/22	9.577
Nov/22	14.154
Dez/22	35.250
Jan/23	59.831
Fev/23	95.436
Mar/23	134.208
Abr/23	230.039
Mai/23	376.880
Jun/23	524.737
Jul/23	711.665
Ago/23	932.720
Set/23	1.155.473
Out/23	1.325.715
Nov/23	1.458.334
Dez/23	1.633.152
Jan/24	1.881.671
Fev/24	2.112.249
Mar/24	2.378.295
Abr/24	2.650.314
Mai/24	2.920.208
Jun/24	3.185.997
Jul/24	3.414.429
Ago/24	3.599.248
Set/24	3.730.633

Meta: > 3.760K (set/24)

Logo EAF

Item	Descrição
	2. Planejamento VI–Cronograma Macro (624+1.268 Municípios) OPERAÇÃO TVRO FSS Conclusão 100% das Estações 13/03/2408/04/2406/05/2410/06/2401/07/2415/07/2415/08/2402/09/2401/10/2404/11/24 Codificação do sinal digital na Banda C 03/2404/2405/2406/2407/2408/2409/2410/2411/2401/2502/2503/25 Fase IV Liberação Total Fase V Liberação 27ª GASPI 220 Munic. Fase V Liberação 28ª GASPI 236 Munic. Fase V Liberação 29ª GASPI 168 Munic. Fase VI Liberação 30ª GASPI 315 Munic. Fase VI Liberação 30ª GASPI 191 Munic. Fase VI Liberação 31ª GASPI 194 Munic. Fase VI Liberação 32ª GASPI 189 Munic. Fase VI 189 Munic. Fase VI 190 Munic. Período pós codificação * Etapas: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ FASE V – 624 Municípios FASE VI – 1.268 Municípios Estados atendidos 100% B: MS C: MT PA PI D: MG E: CE RN PE F: BA EA F Sobre o Cronograma Macro, o Sr. Leandro Guerra fez os seguintes destaques: 1) No mês de setembro, a entidade estaria executando a Fase 6-D, que corresponde à 189 municípios; 2) A partir do dia 01 de outubro, a EAF dará início à Fase 6-E atuando em 189 municípios; 3) E no mês de novembro, a última etapa do projeto, a partir do dia 04, darão início à comunicação e instalação da Fase 6-F com 190 municípios; 4) Destacou que, no mês de setembro, haverá a limpeza total do estado de Minas Gerais; no mês de outubro, dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco; e, no mês de novembro, o estado da Bahia. A respeito do planejamento da Fase 6, o Sr. Leandro Guerra projetou o seguinte <i>slide</i> que mostra os 1.268 municípios distribuídos por Unidade da Federação e conforme o seu perfil populacional:

Item	Descrição																						
	2. Planejamento Fase VI (1.268 Municípios) Fase VI - População <table><tr><th>(<=100k)</th><th>(Pool <=30k)</th></tr><tr><td>203</td><td>1.065</td></tr></table> 1.268 Localidades <table><tr><td>BA</td><td>273</td></tr><tr><td>CE</td><td>64</td></tr><tr><td>MG</td><td>396</td></tr><tr><td>MS</td><td>28</td></tr><tr><td>MT</td><td>77</td></tr><tr><td>PA</td><td>59</td></tr><tr><td>PE</td><td>101</td></tr><tr><td>PI</td><td>184</td></tr><tr><td>RN</td><td>86</td></tr></table> EAF	(<=100k)	(Pool <=30k)	203	1.065	BA	273	CE	64	MG	396	MS	28	MT	77	PA	59	PE	101	PI	184	RN	86
(<=100k)	(Pool <=30k)																						
203	1.065																						
BA	273																						
CE	64																						
MG	396																						
MS	28																						
MT	77																						
PA	59																						
PE	101																						
PI	184																						
RN	86																						
	Na sequência, o Sr. Leandro Guerra apresentou o planejamento da Fase 6-E composta por 189 municípios em que a EAF passará a operar a partir do mês de outubro, bem como a sua divisão por Unidades da Federação e de acordo com o seu perfil populacional, destacando que, com isso, concluiriam os estados do Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte:																						

Item	Descrição												
	2. Planejamento Fase VI - E (189 Municípios) Fase VI - E <table><tr><th>(<=100k)</th><th>(Pool <=30k)</th></tr><tr><td>70</td><td>119</td></tr></table>  189 Localidades <table><tr><td>BA</td><td>40</td></tr><tr><td>CE</td><td>25</td></tr><tr><td>PE</td><td>92</td></tr><tr><td>RN</td><td>32</td></tr></table>  O Sr. Leandro Guerra também apresentou a relação dos 189 municípios que serão atendidos na Fase 6-E, conforme o <i>slide</i> abaixo:	(<=100k)	(Pool <=30k)	70	119	BA	40	CE	25	PE	92	RN	32
(<=100k)	(Pool <=30k)												
70	119												
BA	40												
CE	25												
PE	92												
RN	32												

Item	Descrição																																																																																																																																																																																																																														
	2. Planejamento Fase VI - E Outubro/24 (189 Municípios) <table> <tr><th>UF</th><th>Município</th></tr> <tr><td>BA</td><td>Abaré</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Acajutiba</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Adustina</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Antas</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Aporá</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Araci</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Banzaé</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Cansanção</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Caruós</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Chorrochó</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Cícero Dantas</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Cipó</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Coronel João Sá</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Crisópolis</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Curaçá</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Fátima</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Helópolis</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Inhambupe</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Itapicuru</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Itáiba</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Jaguarari</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Jeremoabo</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Macururé</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Monte Santo</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Nordestina</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Nova Soute</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Novo Triunfo</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Oilândia</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Paripiranga</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Quilângue</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Ribeira do Amparo</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Ribeira do Pombal</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Rio Real</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Rodelas</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Santaluz</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Sérvio Dias</td></tr> </table> <table> <tr><th>UF</th><th>Município</th></tr> <tr><td>BA</td><td>Senhor do Bonfim</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Sítio do Quinto</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Tucano</td></tr> <tr><td>BA</td><td>Uauá</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Acopiara</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Alto Santo</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Baixio</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Banabuiú</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Boa Viagem</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Cedro</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Idó</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Iguimirim</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Itacema</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Itatira</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Jaguaretama</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Jaguaribara</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Jaguaribe</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Lavras da Mangabeira</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Mombaça</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Monsenhor Tabosa</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Morada Nova</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Orós</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Pedra Branca</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Pereiro</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Quixelô</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Santa Quitéria</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Senador Pompeu</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Umarí</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Várzea Alegre</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Afogados da Ingazeira</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Água Preta</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Águas Belas</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Alagoinha</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Aliança</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Araçiná</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Belém do São Francisco</td></tr> </table> <table> <tr><th>UF</th><th>Município</th></tr> <tr><td>PE</td><td>Belo Jardim</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Betânia</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Bodocó</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Bom Conselho</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Bom Jardim</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Bonito</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Brejão</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Brejinho</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Brejo da Madre de Deus</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Buique</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Cabrobó</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Caetés</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Calçado</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Capoeiras</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Carnaíba</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Carnaubeira da Penha</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Casinhas</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Catende</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Correntes</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Custódia</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Escada</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Exu</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Floresta</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Gamaleira</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Iati</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Ibimirim</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Iguaracy</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Inajá</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Ingazeira</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Ipupi</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Itacuruba</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Itaíba</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Itambé</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Itapetim</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Jaquira</td></tr> <tr><td>PE</td><td>Jataíba</td></tr> </table> 	UF	Município	BA	Abaré	BA	Acajutiba	BA	Adustina	BA	Antas	BA	Aporá	BA	Araci	BA	Banzaé	BA	Cansanção	BA	Caruós	BA	Chorrochó	BA	Cícero Dantas	BA	Cipó	BA	Coronel João Sá	BA	Crisópolis	BA	Curaçá	BA	Fátima	BA	Helópolis	BA	Inhambupe	BA	Itapicuru	BA	Itáiba	BA	Jaguarari	BA	Jeremoabo	BA	Macururé	BA	Monte Santo	BA	Nordestina	BA	Nova Soute	BA	Novo Triunfo	BA	Oilândia	BA	Paripiranga	BA	Quilângue	BA	Ribeira do Amparo	BA	Ribeira do Pombal	BA	Rio Real	BA	Rodelas	BA	Santaluz	BA	Sérvio Dias	UF	Município	BA	Senhor do Bonfim	BA	Sítio do Quinto	BA	Tucano	BA	Uauá	CE	Acopiara	CE	Alto Santo	CE	Baixio	CE	Banabuiú	CE	Boa Viagem	CE	Cedro	CE	Idó	CE	Iguimirim	CE	Itacema	CE	Itatira	CE	Jaguaretama	CE	Jaguaribara	CE	Jaguaribe	CE	Lavras da Mangabeira	CE	Mombaça	CE	Monsenhor Tabosa	CE	Morada Nova	CE	Orós	CE	Pedra Branca	CE	Pereiro	CE	Quixelô	CE	Santa Quitéria	CE	Senador Pompeu	CE	Umarí	CE	Várzea Alegre	PE	Afogados da Ingazeira	PE	Água Preta	PE	Águas Belas	PE	Alagoinha	PE	Aliança	PE	Araçiná	PE	Belém do São Francisco	UF	Município	PE	Belo Jardim	PE	Betânia	PE	Bodocó	PE	Bom Conselho	PE	Bom Jardim	PE	Bonito	PE	Brejão	PE	Brejinho	PE	Brejo da Madre de Deus	PE	Buique	PE	Cabrobó	PE	Caetés	PE	Calçado	PE	Capoeiras	PE	Carnaíba	PE	Carnaubeira da Penha	PE	Casinhas	PE	Catende	PE	Correntes	PE	Custódia	PE	Escada	PE	Exu	PE	Floresta	PE	Gamaleira	PE	Iati	PE	Ibimirim	PE	Iguaracy	PE	Inajá	PE	Ingazeira	PE	Ipupi	PE	Itacuruba	PE	Itaíba	PE	Itambé	PE	Itapetim	PE	Jaquira	PE	Jataíba
UF	Município																																																																																																																																																																																																																														
BA	Abaré																																																																																																																																																																																																																														
BA	Acajutiba																																																																																																																																																																																																																														
BA	Adustina																																																																																																																																																																																																																														
BA	Antas																																																																																																																																																																																																																														
BA	Aporá																																																																																																																																																																																																																														
BA	Araci																																																																																																																																																																																																																														
BA	Banzaé																																																																																																																																																																																																																														
BA	Cansanção																																																																																																																																																																																																																														
BA	Caruós																																																																																																																																																																																																																														
BA	Chorrochó																																																																																																																																																																																																																														
BA	Cícero Dantas																																																																																																																																																																																																																														
BA	Cipó																																																																																																																																																																																																																														
BA	Coronel João Sá																																																																																																																																																																																																																														
BA	Crisópolis																																																																																																																																																																																																																														
BA	Curaçá																																																																																																																																																																																																																														
BA	Fátima																																																																																																																																																																																																																														
BA	Helópolis																																																																																																																																																																																																																														
BA	Inhambupe																																																																																																																																																																																																																														
BA	Itapicuru																																																																																																																																																																																																																														
BA	Itáiba																																																																																																																																																																																																																														
BA	Jaguarari																																																																																																																																																																																																																														
BA	Jeremoabo																																																																																																																																																																																																																														
BA	Macururé																																																																																																																																																																																																																														
BA	Monte Santo																																																																																																																																																																																																																														
BA	Nordestina																																																																																																																																																																																																																														
BA	Nova Soute																																																																																																																																																																																																																														
BA	Novo Triunfo																																																																																																																																																																																																																														
BA	Oilândia																																																																																																																																																																																																																														
BA	Paripiranga																																																																																																																																																																																																																														
BA	Quilângue																																																																																																																																																																																																																														
BA	Ribeira do Amparo																																																																																																																																																																																																																														
BA	Ribeira do Pombal																																																																																																																																																																																																																														
BA	Rio Real																																																																																																																																																																																																																														
BA	Rodelas																																																																																																																																																																																																																														
BA	Santaluz																																																																																																																																																																																																																														
BA	Sérvio Dias																																																																																																																																																																																																																														
UF	Município																																																																																																																																																																																																																														
BA	Senhor do Bonfim																																																																																																																																																																																																																														
BA	Sítio do Quinto																																																																																																																																																																																																																														
BA	Tucano																																																																																																																																																																																																																														
BA	Uauá																																																																																																																																																																																																																														
CE	Acopiara																																																																																																																																																																																																																														
CE	Alto Santo																																																																																																																																																																																																																														
CE	Baixio																																																																																																																																																																																																																														
CE	Banabuiú																																																																																																																																																																																																																														
CE	Boa Viagem																																																																																																																																																																																																																														
CE	Cedro																																																																																																																																																																																																																														
CE	Idó																																																																																																																																																																																																																														
CE	Iguimirim																																																																																																																																																																																																																														
CE	Itacema																																																																																																																																																																																																																														
CE	Itatira																																																																																																																																																																																																																														
CE	Jaguaretama																																																																																																																																																																																																																														
CE	Jaguaribara																																																																																																																																																																																																																														
CE	Jaguaribe																																																																																																																																																																																																																														
CE	Lavras da Mangabeira																																																																																																																																																																																																																														
CE	Mombaça																																																																																																																																																																																																																														
CE	Monsenhor Tabosa																																																																																																																																																																																																																														
CE	Morada Nova																																																																																																																																																																																																																														
CE	Orós																																																																																																																																																																																																																														
CE	Pedra Branca																																																																																																																																																																																																																														
CE	Pereiro																																																																																																																																																																																																																														
CE	Quixelô																																																																																																																																																																																																																														
CE	Santa Quitéria																																																																																																																																																																																																																														
CE	Senador Pompeu																																																																																																																																																																																																																														
CE	Umarí																																																																																																																																																																																																																														
CE	Várzea Alegre																																																																																																																																																																																																																														
PE	Afogados da Ingazeira																																																																																																																																																																																																																														
PE	Água Preta																																																																																																																																																																																																																														
PE	Águas Belas																																																																																																																																																																																																																														
PE	Alagoinha																																																																																																																																																																																																																														
PE	Aliança																																																																																																																																																																																																																														
PE	Araçiná																																																																																																																																																																																																																														
PE	Belém do São Francisco																																																																																																																																																																																																																														
UF	Município																																																																																																																																																																																																																														
PE	Belo Jardim																																																																																																																																																																																																																														
PE	Betânia																																																																																																																																																																																																																														
PE	Bodocó																																																																																																																																																																																																																														
PE	Bom Conselho																																																																																																																																																																																																																														
PE	Bom Jardim																																																																																																																																																																																																																														
PE	Bonito																																																																																																																																																																																																																														
PE	Brejão																																																																																																																																																																																																																														
PE	Brejinho																																																																																																																																																																																																																														
PE	Brejo da Madre de Deus																																																																																																																																																																																																																														
PE	Buique																																																																																																																																																																																																																														
PE	Cabrobó																																																																																																																																																																																																																														
PE	Caetés																																																																																																																																																																																																																														
PE	Calçado																																																																																																																																																																																																																														
PE	Capoeiras																																																																																																																																																																																																																														
PE	Carnaíba																																																																																																																																																																																																																														
PE	Carnaubeira da Penha																																																																																																																																																																																																																														
PE	Casinhas																																																																																																																																																																																																																														
PE	Catende																																																																																																																																																																																																																														
PE	Correntes																																																																																																																																																																																																																														
PE	Custódia																																																																																																																																																																																																																														
PE	Escada																																																																																																																																																																																																																														
PE	Exu																																																																																																																																																																																																																														
PE	Floresta																																																																																																																																																																																																																														
PE	Gamaleira																																																																																																																																																																																																																														
PE	Iati																																																																																																																																																																																																																														
PE	Ibimirim																																																																																																																																																																																																																														
PE	Iguaracy																																																																																																																																																																																																																														
PE	Inajá																																																																																																																																																																																																																														
PE	Ingazeira																																																																																																																																																																																																																														
PE	Ipupi																																																																																																																																																																																																																														
PE	Itacuruba																																																																																																																																																																																																																														
PE	Itaíba																																																																																																																																																																																																																														
PE	Itambé																																																																																																																																																																																																																														
PE	Itapetim																																																																																																																																																																																																																														
PE	Jaquira																																																																																																																																																																																																																														
PE	Jataíba																																																																																																																																																																																																																														
	Ato contínuo, o Sr. Leandro Guerra passou a reportar as informações quanto ao terceiro item de sua agenda que diz respeito aos <u>municípios com limpeza da faixa de 3,5 GHz concluída no mês de setembro</u>, e, para tanto, projetou o <i>slide</i> abaixo reproduzido que mostra o mapa dos 189 municípios em que a limpeza foi realizada, ressaltando a sua distribuição por Unidades da Federação, bem como o perfil populacional desses municípios por fases do projeto, e o fato de concluírem o estado de Minas Gerais:																																																																																																																																																																																																																														

Item	Descrição								
	3. Municípios com limpeza de faixa concluída 189 municípios aptos para liberação pelo GAISPI do uso da faixa 3.5 GHz. <table><caption>Fase VI - D</caption><thead><tr><th>(<=100k)</th><th>(Pool <=30k)</th></tr></thead><tbody><tr><td>26</td><td>163</td></tr></tbody></table> 189 Localidades <table><tbody><tr><td>BA</td><td>35</td></tr><tr><td>MG</td><td>154</td></tr></tbody></table> EAf	(<=100k)	(Pool <=30k)	26	163	BA	35	MG	154
(<=100k)	(Pool <=30k)								
26	163								
BA	35								
MG	154								
	Nesse cenário, o Sr. Leandro Guerra apresentou a relação dos 189 municípios em apreço, conforme <i>slides</i> a seguir transcritos:								

Item

Descrição

3. Municípios com limpeza da faixa de 3.5 GHz concluída

Setembro/24 – Fase VI D (189 Municípios)

UF	Município
BA	Camacan
BA	Candiba
BA	Carinhanha
BA	Cocos
BA	Condeixa
BA	Cordeiros
BA	Coribe
BA	Feira da Mata
BA	Guanambi
BA	Ibirapuá
BA	Itaju do Colônia
BA	Itambê
BA	Itanhém
BA	Itapetinga
BA	Itarantim
BA	Itooró
BA	Iuku
BA	Jacaraci
BA	Jucuruçu
BA	Lajedão
BA	Licínio de Almeida
BA	Macarani
BA	Malquinique
BA	Mascote
BA	Medeiros Neto
BA	Mortugaba
BA	Palmas de Monte Alto
BA	Pau Brasil
BA	Pindai
BA	Piripá
BA	Potiraguá
BA	Sebastião Laranjeiras
BA	Tremedal
BA	Urundi
BA	Vereda
MG	Abaeté

UF	Município
MG	Água Boa
MG	Águas Formosas
MG	Águas Vermelhas
MG	Alvorada de Minas
MG	Cachoeira de Pajeú
MG	Arapuá
MG	Ataléia
MG	Augusto de Lima
MG	Bandeira
MG	Berilo
MG	Bertópolis
MG	Berizal
MG	Biquinhas
MG	Bocaiúva
MG	Bom Despacho
MG	Bonito de Minas
MG	Botumirim
MG	Brasilândia de Minas
MG	Brasília de Minas
MG	Buenópolis
MG	Campos Altos
MG	Capelinha
MG	Carai
MG	Carbonita
MG	Carlos Chagas
MG	Carmésia
MG	Carmo do Paranaíba
MG	Catuji
MG	Catuti
MG	Cedro do Abaeté
MG	Chapada do Norte
MG	Coluna
MG	Comercinho
MG	Cônego Marinho
MG	Corinto
MG	Coronel Murta

UF	Município
MG	Córrego Danta
MG	Cristália
MG	Cristália
MG	Cruzeiro da Fortaleza
MG	Curral de Dentro
MG	Datas
MG	Dom Joaquim
MG	Dores de Guanhães
MG	Dores do Indaiá
MG	Espinosa
MG	Felício dos Santos
MG	Felisburgo
MG	Felisdândia
MG	Francisco Badurô
MG	Frei Gaspar
MG	Gouveia
MG	Guanhães
MG	Guimarânia
MG	Ibiá
MG	Ibiraí
MG	Icarai de Minas
MG	Indaiabira
MG	Itacarambi
MG	Itaipé
MG	Itamarandiba
MG	Itaobim
MG	Itinga
MG	Jaíba
MG	Janaúba
MG	Januária
MG	Japonvar
MG	Jenipapo de Minas
MG	Jequitinhonha
MG	Joaíma
MG	João Pinheiro
MG	Joãozinho



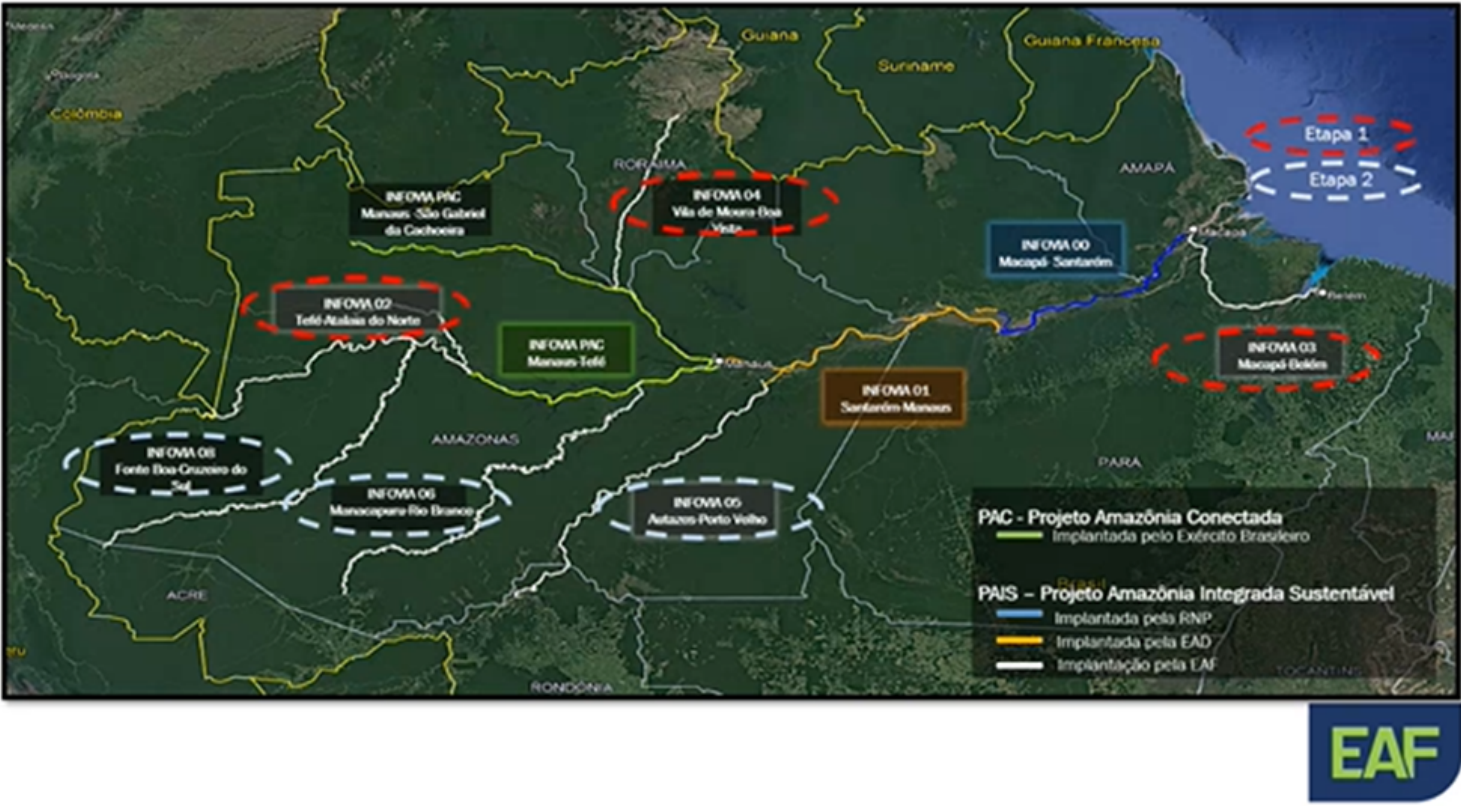
Item	Descrição																																																																																																																																																																								
	3. Municípios com limpeza da faixa de 3.5 GHz concluída Setembro/24 – Fase VI D (189 Municípios) <table><tr><th>UF</th><th>Município</th></tr><tr><td>MG</td><td>Josenópolis</td></tr><tr><td>MG</td><td>Ladainha</td></tr><tr><td>MG</td><td>Lagamar</td></tr><tr><td>MG</td><td>Lagoa Formosa</td></tr><tr><td>MG</td><td>Lassance</td></tr><tr><td>MG</td><td>Leme do Prado</td></tr><tr><td>MG</td><td>Lontra</td></tr><tr><td>MG</td><td>Luislândia</td></tr><tr><td>MG</td><td>Luz</td></tr><tr><td>MG</td><td>Malacacheta</td></tr><tr><td>MG</td><td>Manga</td></tr><tr><td>MG</td><td>Martinho Campos</td></tr><tr><td>MG</td><td>Mata Verde</td></tr><tr><td>MG</td><td>Materlândia</td></tr><tr><td>MG</td><td>Mato Verde</td></tr><tr><td>MG</td><td>Matutina</td></tr><tr><td>MG</td><td>Medina</td></tr><tr><td>MG</td><td>Minas Novas</td></tr><tr><td>MG</td><td>Moema</td></tr><tr><td>MG</td><td>Montalvânia</td></tr><tr><td>MG</td><td>Monte Azul</td></tr><tr><td>MG</td><td>Montezuma</td></tr><tr><td>MG</td><td>Morro da Garça</td></tr><tr><td>MG</td><td>Novo Cruzeiro</td></tr><tr><td>MG</td><td>Oitos-d'Água</td></tr><tr><td>MG</td><td>Ouro Verde de Minas</td></tr><tr><td>MG</td><td>Padre Paraíso</td></tr><tr><td>MG</td><td>Paineiras</td></tr><tr><td>MG</td><td>Paulistas</td></tr><tr><td>MG</td><td>Pavão</td></tr><tr><td>MG</td><td>Pedra Azul</td></tr><tr><td>MG</td><td>Pedras de Maria da Cruz</td></tr><tr><td>MG</td><td>Pirapora</td></tr><tr><td>MG</td><td>Pompéu</td></tr><tr><td>MG</td><td>Ponto Chique</td></tr><tr><td>MG</td><td>Porteirinha</td></tr></table> <table><tr><th>UF</th><th>Município</th></tr><tr><td>MG</td><td>Poté</td></tr><tr><td>MG</td><td>Pratinha</td></tr><tr><td>MG</td><td>Presidente Juscelino</td></tr><tr><td>MG</td><td>Presidente Kubitschek</td></tr><tr><td>MG</td><td>Presidente Olegário</td></tr><tr><td>MG</td><td>Quartel Geral</td></tr><tr><td>MG</td><td>Rio do Prado</td></tr><tr><td>MG</td><td>Rio Paranaíba</td></tr><tr><td>MG</td><td>Rio Pardo de Minas</td></tr><tr><td>MG</td><td>Rio Vermelho</td></tr><tr><td>MG</td><td>Rubelita</td></tr><tr><td>MG</td><td>Rubim</td></tr><tr><td>MG</td><td>Sabãoópolis</td></tr><tr><td>MG</td><td>Salinas</td></tr><tr><td>MG</td><td>Santa Maria do Suaçuí</td></tr><tr><td>MG</td><td>Santa Rosa da Serra</td></tr><tr><td>MG</td><td>Santo Antônio do Itambé</td></tr><tr><td>MG</td><td>Santo Antônio do Jacinto</td></tr><tr><td>MG</td><td>Santo Hipólito</td></tr><tr><td>MG</td><td>São Francisco</td></tr><tr><td>MG</td><td>São Gonçalo do Abaeté</td></tr><tr><td>MG</td><td>São Gotardo</td></tr><tr><td>MG</td><td>São João do Paraíso</td></tr><tr><td>MG</td><td>São João Evangelista</td></tr><tr><td>MG</td><td>São Romão</td></tr><tr><td>MG</td><td>Senador Modestino Gonçalves</td></tr><tr><td>MG</td><td>Senhora do Porto</td></tr><tr><td>MG</td><td>Serra Azul de Minas</td></tr><tr><td>MG</td><td>Serra dos Aimorés</td></tr><tr><td>MG</td><td>Serra do Salitre</td></tr><tr><td>MG</td><td>Serranópolis de Minas</td></tr><tr><td>MG</td><td>Serra</td></tr><tr><td>MG</td><td>Taiboeiras</td></tr><tr><td>MG</td><td>Tapira</td></tr><tr><td>MG</td><td>Tapiraí</td></tr><tr><td>MG</td><td>Tiros</td></tr></table> <table><tr><th>UF</th><th>Município</th></tr><tr><td>MG</td><td>Turmalina</td></tr><tr><td>MG</td><td>Umburatiba</td></tr><tr><td>MG</td><td>Varjão de Minas</td></tr><tr><td>MG</td><td>Várzea da Palma</td></tr><tr><td>MG</td><td>Verdelândia</td></tr><tr><td>MG</td><td>Verdelândia</td></tr><tr><td>MG</td><td>Verecinda</td></tr><tr><td>MG</td><td>Virgem da Lapa</td></tr><tr><td>MG</td><td>Virginópolis</td></tr></table>	UF	Município	MG	Josenópolis	MG	Ladainha	MG	Lagamar	MG	Lagoa Formosa	MG	Lassance	MG	Leme do Prado	MG	Lontra	MG	Luislândia	MG	Luz	MG	Malacacheta	MG	Manga	MG	Martinho Campos	MG	Mata Verde	MG	Materlândia	MG	Mato Verde	MG	Matutina	MG	Medina	MG	Minas Novas	MG	Moema	MG	Montalvânia	MG	Monte Azul	MG	Montezuma	MG	Morro da Garça	MG	Novo Cruzeiro	MG	Oitos-d'Água	MG	Ouro Verde de Minas	MG	Padre Paraíso	MG	Paineiras	MG	Paulistas	MG	Pavão	MG	Pedra Azul	MG	Pedras de Maria da Cruz	MG	Pirapora	MG	Pompéu	MG	Ponto Chique	MG	Porteirinha	UF	Município	MG	Poté	MG	Pratinha	MG	Presidente Juscelino	MG	Presidente Kubitschek	MG	Presidente Olegário	MG	Quartel Geral	MG	Rio do Prado	MG	Rio Paranaíba	MG	Rio Pardo de Minas	MG	Rio Vermelho	MG	Rubelita	MG	Rubim	MG	Sabãoópolis	MG	Salinas	MG	Santa Maria do Suaçuí	MG	Santa Rosa da Serra	MG	Santo Antônio do Itambé	MG	Santo Antônio do Jacinto	MG	Santo Hipólito	MG	São Francisco	MG	São Gonçalo do Abaeté	MG	São Gotardo	MG	São João do Paraíso	MG	São João Evangelista	MG	São Romão	MG	Senador Modestino Gonçalves	MG	Senhora do Porto	MG	Serra Azul de Minas	MG	Serra dos Aimorés	MG	Serra do Salitre	MG	Serranópolis de Minas	MG	Serra	MG	Taiboeiras	MG	Tapira	MG	Tapiraí	MG	Tiros	UF	Município	MG	Turmalina	MG	Umburatiba	MG	Varjão de Minas	MG	Várzea da Palma	MG	Verdelândia	MG	Verdelândia	MG	Verecinda	MG	Virgem da Lapa	MG	Virginópolis
UF	Município																																																																																																																																																																								
MG	Josenópolis																																																																																																																																																																								
MG	Ladainha																																																																																																																																																																								
MG	Lagamar																																																																																																																																																																								
MG	Lagoa Formosa																																																																																																																																																																								
MG	Lassance																																																																																																																																																																								
MG	Leme do Prado																																																																																																																																																																								
MG	Lontra																																																																																																																																																																								
MG	Luislândia																																																																																																																																																																								
MG	Luz																																																																																																																																																																								
MG	Malacacheta																																																																																																																																																																								
MG	Manga																																																																																																																																																																								
MG	Martinho Campos																																																																																																																																																																								
MG	Mata Verde																																																																																																																																																																								
MG	Materlândia																																																																																																																																																																								
MG	Mato Verde																																																																																																																																																																								
MG	Matutina																																																																																																																																																																								
MG	Medina																																																																																																																																																																								
MG	Minas Novas																																																																																																																																																																								
MG	Moema																																																																																																																																																																								
MG	Montalvânia																																																																																																																																																																								
MG	Monte Azul																																																																																																																																																																								
MG	Montezuma																																																																																																																																																																								
MG	Morro da Garça																																																																																																																																																																								
MG	Novo Cruzeiro																																																																																																																																																																								
MG	Oitos-d'Água																																																																																																																																																																								
MG	Ouro Verde de Minas																																																																																																																																																																								
MG	Padre Paraíso																																																																																																																																																																								
MG	Paineiras																																																																																																																																																																								
MG	Paulistas																																																																																																																																																																								
MG	Pavão																																																																																																																																																																								
MG	Pedra Azul																																																																																																																																																																								
MG	Pedras de Maria da Cruz																																																																																																																																																																								
MG	Pirapora																																																																																																																																																																								
MG	Pompéu																																																																																																																																																																								
MG	Ponto Chique																																																																																																																																																																								
MG	Porteirinha																																																																																																																																																																								
UF	Município																																																																																																																																																																								
MG	Poté																																																																																																																																																																								
MG	Pratinha																																																																																																																																																																								
MG	Presidente Juscelino																																																																																																																																																																								
MG	Presidente Kubitschek																																																																																																																																																																								
MG	Presidente Olegário																																																																																																																																																																								
MG	Quartel Geral																																																																																																																																																																								
MG	Rio do Prado																																																																																																																																																																								
MG	Rio Paranaíba																																																																																																																																																																								
MG	Rio Pardo de Minas																																																																																																																																																																								
MG	Rio Vermelho																																																																																																																																																																								
MG	Rubelita																																																																																																																																																																								
MG	Rubim																																																																																																																																																																								
MG	Sabãoópolis																																																																																																																																																																								
MG	Salinas																																																																																																																																																																								
MG	Santa Maria do Suaçuí																																																																																																																																																																								
MG	Santa Rosa da Serra																																																																																																																																																																								
MG	Santo Antônio do Itambé																																																																																																																																																																								
MG	Santo Antônio do Jacinto																																																																																																																																																																								
MG	Santo Hipólito																																																																																																																																																																								
MG	São Francisco																																																																																																																																																																								
MG	São Gonçalo do Abaeté																																																																																																																																																																								
MG	São Gotardo																																																																																																																																																																								
MG	São João do Paraíso																																																																																																																																																																								
MG	São João Evangelista																																																																																																																																																																								
MG	São Romão																																																																																																																																																																								
MG	Senador Modestino Gonçalves																																																																																																																																																																								
MG	Senhora do Porto																																																																																																																																																																								
MG	Serra Azul de Minas																																																																																																																																																																								
MG	Serra dos Aimorés																																																																																																																																																																								
MG	Serra do Salitre																																																																																																																																																																								
MG	Serranópolis de Minas																																																																																																																																																																								
MG	Serra																																																																																																																																																																								
MG	Taiboeiras																																																																																																																																																																								
MG	Tapira																																																																																																																																																																								
MG	Tapiraí																																																																																																																																																																								
MG	Tiros																																																																																																																																																																								
UF	Município																																																																																																																																																																								
MG	Turmalina																																																																																																																																																																								
MG	Umburatiba																																																																																																																																																																								
MG	Varjão de Minas																																																																																																																																																																								
MG	Várzea da Palma																																																																																																																																																																								
MG	Verdelândia																																																																																																																																																																								
MG	Verdelândia																																																																																																																																																																								
MG	Verecinda																																																																																																																																																																								
MG	Virgem da Lapa																																																																																																																																																																								
MG	Virginópolis																																																																																																																																																																								
	Por fim, o Sr. Leandro Guerra projetou o <i>slide</i> que apresenta um panorama geral de liberação da faixa de 3,5 GHz, abaixo reproduzido, e salientou que, considerando a deliberação a ser tomada na presente Reunião Ordinária, a EAF atingirá a marca de 5.191 municípios com a limpeza efetivada, ressaltando os dados constantes do referido <i>slide</i>, e reiterou que o destaque se daria ao estado de Minas Gerais com 100% do território liberado:																																																																																																																																																																								



Item	Descrição																																																						
	3. Panorama Geral Liberação Faixa 3,5 GHz (24/09/2024) 5.191 Localidades <table><tr><td>AC</td><td>22</td></tr><tr><td>AL</td><td>102</td></tr><tr><td>AM</td><td>62</td></tr><tr><td>AP</td><td>16</td></tr><tr><td>BA</td><td>187</td></tr><tr><td>CE</td><td>159</td></tr><tr><td>DF</td><td>1</td></tr><tr><td>ES</td><td>78</td></tr><tr><td>GO</td><td>246</td></tr><tr><td>MA</td><td>217</td></tr><tr><td>MG</td><td>853</td></tr><tr><td>MS</td><td>79</td></tr><tr><td>MT</td><td>141</td></tr><tr><td>PA</td><td>144</td></tr><tr><td>PB</td><td>223</td></tr><tr><td>PE</td><td>93</td></tr><tr><td>PI</td><td>224</td></tr><tr><td>PR</td><td>399</td></tr><tr><td>RJ</td><td>92</td></tr><tr><td>RN</td><td>135</td></tr><tr><td>RO</td><td>52</td></tr><tr><td>RR</td><td>15</td></tr><tr><td>RS</td><td>497</td></tr><tr><td>SC</td><td>295</td></tr><tr><td>SE</td><td>75</td></tr><tr><td>SP</td><td>645</td></tr><tr><td>TO</td><td>139</td></tr></table> REALIZADO – EDITAL Fase I (Capitais) 100% 27 Municípios até 28/10/22 ✓ Fase II (≥500k) 100% 26 Municípios até 01/01/23 ✓ Fase III (≥200k) 100% 102 Municípios até 30/06/23 ✓ Fase IV (≥100k) 100% 171 Municípios até 30/06/24 ✓ Fase VI (≥30k) 724 Municípios 85% 88% (750) 848 Municípios até 01/01/26 ✓ Pool 30k (<30k) 3.952 Municípios 90% 94% (4.115) 4.396 Municípios 25% até 30/06/23 – Fase III; 50% até 30/06/24 – Fase IV; 75% até 30/06/25 – Fase V; 100% até 01/01/26 – Fase VI. ✓ • A EAF realizou a limpeza da faixa de 3.5 GHz e está realizando a migração TVRO em 5.002 municípios • Estados 100% liberados pela EAF – RS, SC, PR, AP, RR, AL, DF, SP, RJ, ES, MA, SE, PB, RO, TO, AC, AM, GO, MS, MT, PA, PI e MG Legenda Cenário com a liberação dos 189 municípios da Fase VI-D totalizando 5.191 municípios EAF	AC	22	AL	102	AM	62	AP	16	BA	187	CE	159	DF	1	ES	78	GO	246	MA	217	MG	853	MS	79	MT	141	PA	144	PB	223	PE	93	PI	224	PR	399	RJ	92	RN	135	RO	52	RR	15	RS	497	SC	295	SE	75	SP	645	TO	139
AC	22																																																						
AL	102																																																						
AM	62																																																						
AP	16																																																						
BA	187																																																						
CE	159																																																						
DF	1																																																						
ES	78																																																						
GO	246																																																						
MA	217																																																						
MG	853																																																						
MS	79																																																						
MT	141																																																						
PA	144																																																						
PB	223																																																						
PE	93																																																						
PI	224																																																						
PR	399																																																						
RJ	92																																																						
RN	135																																																						
RO	52																																																						
RR	15																																																						
RS	497																																																						
SC	295																																																						
SE	75																																																						
SP	645																																																						
TO	139																																																						

Dando prosseguimento ao seu informe, o **Sr. Leandro Guerra** passou para o quarto item da agenda, Planejamento TVRO – Plano de Aceleração de Instalação, e exibiu o gráfico abaixo reproduzido, reforçando que já seria de conhecimento do GAISPI:

Item	Descrição																																																															
	4. Planejamento TVRO – Plano de Aceleração de Instalação INSTALADOS x DEMANDA POTENCIAL Premissas: ▪ Demanda total de 5.1 MM ▪ Capacidade de entrega de Kits pelo mercado ▪ Antecipação da conclusão da Fase VI em NOV/24 Fases I, II e III: 1.610 Municípios Atendidos Fase IV: 2.068 Municípios Atendidos Fase V: 624 Municípios Antecipação Fase VI: 1.268 Municípios <table><caption>Dados do Gráfico: Realizado vs Meta</caption><tr><th>Período</th><th>Realizado (%)</th><th>Meta (%)</th></tr><tr><td>jun/22</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>jul/22</td><td>13,3%</td><td>13,0%</td></tr><tr><td>ago/22</td><td>27,4%</td><td>16,2%</td></tr><tr><td>set/22</td><td>20,6%</td><td>19,3%</td></tr><tr><td>out/22</td><td>24,6%</td><td>23,5%</td></tr><tr><td>nov/22</td><td>25,9%</td><td>24,3%</td></tr><tr><td>dez/22</td><td>29,7%</td><td>26,0%</td></tr><tr><td>jan/23</td><td>34,3%</td><td>28,3%</td></tr><tr><td>fev/23</td><td>38,2%</td><td>31,2%</td></tr><tr><td>mar/23</td><td>43,3%</td><td>36,2%</td></tr><tr><td>abr/23</td><td>51,5%</td><td>49,3%</td></tr><tr><td>mai/23</td><td>57,3%</td><td>52,5%</td></tr><tr><td>jun/23</td><td>67,7%</td><td>60,0%</td></tr><tr><td>jul/23</td><td>70,5%</td><td>65,9%</td></tr><tr><td>ago/23</td><td>70,7%</td><td>65,1%</td></tr><tr><td>set/23</td><td>76,4%</td><td>76,4%</td></tr><tr><td>out/23</td><td>87,0%</td><td>87,0%</td></tr><tr><td>nov/23</td><td>92,4%</td><td>92,4%</td></tr><tr><td>dez/23</td><td>96,1%</td><td>96,1%</td></tr><tr><td>jan/24</td><td>100,0%</td><td>100,0%</td></tr></table>	Período	Realizado (%)	Meta (%)	jun/22	0%	0%	jul/22	13,3%	13,0%	ago/22	27,4%	16,2%	set/22	20,6%	19,3%	out/22	24,6%	23,5%	nov/22	25,9%	24,3%	dez/22	29,7%	26,0%	jan/23	34,3%	28,3%	fev/23	38,2%	31,2%	mar/23	43,3%	36,2%	abr/23	51,5%	49,3%	mai/23	57,3%	52,5%	jun/23	67,7%	60,0%	jul/23	70,5%	65,9%	ago/23	70,7%	65,1%	set/23	76,4%	76,4%	out/23	87,0%	87,0%	nov/23	92,4%	92,4%	dez/23	96,1%	96,1%	jan/24	100,0%	100,0%
Período	Realizado (%)	Meta (%)																																																														
jun/22	0%	0%																																																														
jul/22	13,3%	13,0%																																																														
ago/22	27,4%	16,2%																																																														
set/22	20,6%	19,3%																																																														
out/22	24,6%	23,5%																																																														
nov/22	25,9%	24,3%																																																														
dez/22	29,7%	26,0%																																																														
jan/23	34,3%	28,3%																																																														
fev/23	38,2%	31,2%																																																														
mar/23	43,3%	36,2%																																																														
abr/23	51,5%	49,3%																																																														
mai/23	57,3%	52,5%																																																														
jun/23	67,7%	60,0%																																																														
jul/23	70,5%	65,9%																																																														
ago/23	70,7%	65,1%																																																														
set/23	76,4%	76,4%																																																														
out/23	87,0%	87,0%																																																														
nov/23	92,4%	92,4%																																																														
dez/23	96,1%	96,1%																																																														
jan/24	100,0%	100,0%																																																														
	A respeito do Plano de Aceleração, o Sr. Leandro Guerra reiterou que ele projetava essa curva em vermelho até atingirem 100% da demanda levantada na pesquisa realizada em duas oportunidades e que aponta para 5.1 milhões de beneficiários em parábola na Banda C. Afirmou ainda que a curva em azul representa o que foi realizado, destacando que, no final do mês de agosto, a entidade teria fechado 70,5% acima da previsão projetada para essa curva de aceleração. Informou, para que os membros tivessem uma ideia, que, no mês de setembro, atingirão 73% acima do 70,7% que é possível observar na curva vermelha, ou seja, estariam quase 2,5% acima da previsão de aceleração feita inicialmente. Destacou também, no gráfico, o prazo do fim da dupla iluminação até 31 de dezembro e, a partir daí, o Edital permite continuar por 90 dias a instalação das antenas parabólicas. Passando para o quinto item de sua agenda, <u>Projeto PAIS</u>, o Sr. Leandro Guerra exibiu o <i>slide</i> abaixo reproduzido para mostrar o mapa do projeto Norte Conectado, com as 6 Infovias do Projeto EAF, destacando que a execução ocorre em duas etapas, sendo que as Infovias 02, 03 e 04, compõem a Etapa 1, e as Infovias 05, 06 e 08, compõem a Etapa 2 do projeto:																																																															

Item	Descrição
	5. NORTE CONECTADO - As 6 Infovias do Projeto EAF  The map illustrates the 'NORTE CONECTADO' project, showing six information highways (Infovias) across the northern Amazon. The projects are labeled as follows: - INEOMA 01: Santarém - Manaus - INEOMA 02: Tefé - Atalaia do Norte - INEOMA 03: Macapá - Belém - INEOMA 04: Vila de Moema - Boa Vista - INEOMA 05: Manaus - Tefé - INEOMA 06: Fonte Boa - Cruzeiro do Sul Additional projects shown include INEOMA 00 (Macapá - Santarém), INEOMA PNC (Manaus - São Gabriel da Cachoeira), and INEOMA PNC (Manaus - Tefé). The map also indicates the locations of 'Etapa 1' and 'Etapa 2' in the northeast. A legend in the bottom right corner defines the project types and their implementation: PAC - Projeto Amazônia Conectada - Implantada pelo Exército Brasileiro (Green line) PAIS - Projeto Amazônia Integrada Sustentável - Implantada pela RNP (Blue line) - Implantada pela EAD (Yellow line) - Implantação pela EAF (Black line) The EAF logo is visible in the bottom right corner of the map area.

Em seguida, o Sr. **Leandro Guerra** destacou os pontos de atenção quanto ao prazo do Projeto PAIS, nos termos do *slide* abaixo transcrito:

https://sei.anatel.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=14267358&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001283&infra_hash=8... 15/38

Item	Descrição														
	5. Status PAIS INFOVIAS 03 Rio Amazonas Macapá, Afuá, São Sebastião de Boa Vista, Breves, Bagre, Curralinho, Belém Infovia 03 *As cidades de São Sebastião de Boa Vista/PA e Bagre/PA, foram interligadas somente por cabo de fibra óptica subaquático (sem equipamentos de telecomunicações) nesta primeira fase. **As cidades de Afuá/PA e Ponta de Pedras/PA serão interligadas com previsão para o segundo semestre de 2024. Evolução da infovia <table><tr><th>Estudos de viabilidade</th><th>Aquisição e fabricação de cabos</th><th>Licenciamentos e autorizações ambientais</th><th>Infraestrutura terrestre (IPA, CMAD e Gabinete externo)</th><th>Lançamento do cabo</th><th>Ativação do backbone</th><th>Ativação da rede metropolitana</th></tr><tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>●</td></tr></table> Atividades em Execução: Backbone: ➤ Processo de Emissão da Licença de Operação (LO) – IBAMA (*Out/24) ➤ Processo de Evidências Regulatórias. (*Nov/24) ➤ Transferências da Infraestrutura para o MCom (*Nov/24) Rede Metropolitana: ➤ Belém/PA, em processo de validação pela Concessionária (91% aprovados): ➤ Em mobilização para instalação; ➤ Curralinho/PA e Breves/PA, rede implantada em monitoramento; ➤ 2ª Etapa (Afuá e Ponta de Pedras) – Equipamentos e Cabos em processo de aquisição. * prazo estimado para conclusão ETAPA 1 - Belém, Curralinho, Breves e Macapá LEGENDA ✓ concluído ● execução ○ planejado	Estudos de viabilidade	Aquisição e fabricação de cabos	Licenciamentos e autorizações ambientais	Infraestrutura terrestre (IPA, CMAD e Gabinete externo)	Lançamento do cabo	Ativação do backbone	Ativação da rede metropolitana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	●
Estudos de viabilidade	Aquisição e fabricação de cabos	Licenciamentos e autorizações ambientais	Infraestrutura terrestre (IPA, CMAD e Gabinete externo)	Lançamento do cabo	Ativação do backbone	Ativação da rede metropolitana									
✓	✓	✓	✓	✓	✓	●									

A respeito da Infovia 03, o **Sr. Leandro Guerra** fez os seguintes destaques:

1) Houve o lançamento do cabo subaquático entre o trecho Macapá e Belém, faltando ainda duas pontas (Macapá e Afuá; Belém e Ponta de Pedras); e

2) Houve uma evolução das Redes Metropolitanas, passando a ler as informações sobre Belém/PA contidas no *slide* acima.

Ainda sobre a Infovia 03, o **Sr. Leandro Guerra** exibiu o *slide* a seguir reproduzido que trata do incidente ocorrido no dia 20 de setembro:

https://sei.anatel.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=14267358&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001283&infra_hash=8... 17/38

Item

Descrição

5. Status PAIS

INFOVIAS 03

REDUNDÂNCIA – Trecho Ponta de Pedra/Curralinho (140km)

O diagrama ilustra a infraestrutura de rede de telecomunicações entre Ponta de Pedra e Macapá. A rota principal segue o eixo horizontal: BELÉM (74 km de Ponta de Pedra) → SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA (164 km de Belém) → CURRALINHO (35 km de São Sebastião da Boa Vista) → BAGRE (63 km de Curralinho) → BREVES (61 km de Bagre) → MACAPÁ (264 km de Breves). Há uma conexão lateral de 156 km entre Macapá e AFUÁ. Uma rota alternativa (redundância) conecta Ponta de Pedra diretamente a Curralinho por 140 km. O trecho entre Belém e Curralinho é destacado em cinza, indicando que está em instalação. O trecho entre Ponta de Pedra e Curralinho é destacado em preto, indicando que já está instalado. As legendas indicam que os círculos azuis com 'X' representam 'CAIXA DE ANCORAGEM + DWDM + OMAD' e os círculos amarelos com 'X' representam 'CAIXA DE ANCORAGEM + BYPASS ÓPTICO'.

- Deliberado no 31º GAISPI, o lançamento de um trecho adicional de aproximadamente 140 km entre Ponta de Pedras e Curralinho para garantir maior proteção e resiliência nesta rota até a sua chegada a Belém, com a previsão de lançamento em conjunto com a Fase 2 da Infovia 03.

O **Secretário Executivo do GAISPI** interrompeu a apresentação para questionar ao **Sr. Leandro Guerra** se esse seria o trecho em que houve o rompimento.

O **Sr. Leandro Guerra** confirmou que sim e mostrou, no *slide* acima, que o rompimento ocorreu no trecho de 164 km entre Belém e São Sebastião da Boa Vista, a 60km de Belém, confirmando também que haverá uma redundância justamente nesse trecho, conforme deliberação do GAISPI. O **Sr. Leandro Guerra** lembrou também que essa rota é importante por envolver duas capitais, Belém e Macapá, o que dará redundância no *backbone* atual e, com isso, todo o sistema de telecomunicações das operadoras, no futuro, poderá utilizar. Afirmou que entende que essa redundância seria vital para que tenham maior resiliência nesse trecho entre Belém e São Sebastião da Boa Vista, onde já aconteceram três rompimentos desde que a EAF lançou esse cabo em maio, ou seja, trata-se de um período curto para três rompimentos dessa natureza. Justificou que, nessa região, haveria um maior tráfego de embarcações, o que pode gerar o rompimento tal como ocorrido.

Passando para a Infovia 04, o **Sr. Leandro Guerra** projetou o seguinte *slide* que detalha o seu *status*, com as informações sobre a sua execução em relação à implantação do *Backbone* e da Rede Metropolitana:

Item	Descrição
------	-----------

5. Status PAIS

INFOVIA 04

Rio Branco

Evolução da infovia

Estudos de viabilidade

Aquisição e fabricação de cabos

Licenciamentos e autorizações ambientais

Infraestrutura terrestre (IPA, CMAD e Gabinete externo)

Cabo Subaquático (Vila de Moura-AM / Caracará-RR)

Lançamento do cabo

Ativação do backbone

Ativação da rede metropolitana

Atividades em Execução:

Backbone:

- 23/Ago, concluído implantação do cabo subaquático entre Vila de Moura/AM e Caracará/RR;
- 13/Set, ativado backbone subaquático + DWDM;
- Backbone Terrestre: Processo em análise pelo DNIT para uso da faixa de domínio BR-174 entre Caracará/RR e Boa Vista/RR;
- Implantação cabo terrestre (D+120*);

Rede Metropolitana:

- Implantação concluída: Vila de Moura, Santa Maria Boaçu, Caracará e Boa Vista;

LEGENDA

concluído

execução

planejado

Com relação à Infovia 04, o **Sr. Leandro Guerra** fez os seguintes destaques:

- 1) Houve o lançamento da rede/cabo subaquática entre Vila de Moura e Caracará; toda a infraestrutura terrestre já teria sido montada;
- 2) No trecho Caracará/Boa Vista estaria faltando construir a rede terrestre, conforme está previsto no projeto, e que estariam aguardando, neste momento, o DNIT aprovar o projeto, visto que somente foi possível submetê-lo ao órgão a partir da licença de instalação do Ibama; registrou que o prazo para a implementação é de 120 dias a partir da autorização do DNIT; e
- 3) Todas as Redes Metropolitanas já estariam construídas com os devidos acessos já conectados (escolas, hospitais etc.).

Ato contínuo, o **Sr. Leandro Guerra** exibiu o *slide* abaixo reproduzido que passa a detalhar as informações sobre a execução da Infovia 02:

Item	Descrição														
	5. Status PAIS INFOVIA 02 Rio Solimões  Evolução da infovia <table><tr><td>Estudos de viabilidade</td><td>Aquisição e fabricação de cabos</td><td>Licenciamentos e autorizações ambientais</td><td>Infraestrutura terrestre (IPA, CMAD e Gabinete externo)</td><td>Lançamento do cabo</td><td>Ativação do backbone</td><td>Ativação da rede metropolitana</td></tr><tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>○</td><td>○</td><td>●</td></tr></table> Atividades em Execução: Backbone: ➤ Eletrônica implantadas (DWDM_OLT); ➤ Projeto em análise no DNIT para uso da faixa de domínio BR-307 (Benjamin Constant - AM / Atalaia do Norte -AM) ➤ Implantação do cabo subaquático – planejado para Dez/24; ➤ Ativação do backbone (DWDM) – planejado para Dez/24; Rede Metropolitana: ➤ Implantação concluída: Tefé e Alvarães; ➤ Ativação em andamento: Uarini, Jutai e Tonantins; ➤ Atividades suspensa para as demais 8 localidades, motivados pelo agravamento da vazante do rio; LEGENDA ✓ concluído ● execução ○ planejado 	Estudos de viabilidade	Aquisição e fabricação de cabos	Licenciamentos e autorizações ambientais	Infraestrutura terrestre (IPA, CMAD e Gabinete externo)	Lançamento do cabo	Ativação do backbone	Ativação da rede metropolitana	✓	✓	✓	✓	○	○	●
Estudos de viabilidade	Aquisição e fabricação de cabos	Licenciamentos e autorizações ambientais	Infraestrutura terrestre (IPA, CMAD e Gabinete externo)	Lançamento do cabo	Ativação do backbone	Ativação da rede metropolitana									
✓	✓	✓	✓	○	○	●									

A respeito da Infovia 02, o **Sr. Leandro Guerra** fez os seguintes destaques:

1) Embora tivessem a licença de instalação do Ibama no mês de julho, já não era possível realizar o lançamento, ressaltando que foi uma decisão tomada de forma acertada, em sua visão, porque colocava em risco toda operação em função de a seca ter se acelerado e que estariam aguardando a próxima janela de operação que estaria prevista a partir do mês de dezembro deste ano. Afirmou que a EAF estaria monitorando o nível do rio e que estaria tudo pronto para executar o lançamento; e

2) Há algumas construções da parte terrestre sendo executadas das Redes Metropolitanas, porém afirmou que não conseguiram evoluir mais do que foi feito, porque as condições do rio não somente não permitem o lançamento, como também não permitem a instalação de novos equipamentos pela rota, não havendo possibilidade de qualquer tipo de embarcação se deslocar até o Rio Solimões neste momento.

Em seguida, o **Sr. Leandro Guerra** apresentou as informações sobre o Plano de Implantação da Etapa 1 que envolve as Infovias 02, 03 e 04, cujo cronograma sobre o lançamento dos cabos, com o prazo de duração, previsões de início e de fim, bem como a presença de restrições hidrográficas e outras, encontra-se no *slide* abaixo reproduzido e por ele exibido, com a leitura das informações nele contidas:

A respeito da Infovia 02, o **Sr. Leandro Guerra** fez os seguintes destaques:

1) Embora tivessem a licença de instalação do Ibama no mês de julho, já não era possível realizar o lançamento, ressaltando que foi uma decisão tomada de forma acertada, em sua visão, porque colocava em risco toda operação em função de a seca ter se acelerado e que estariam aguardando a próxima janela de operação que estaria prevista a partir do mês de dezembro deste ano. afirmou que a EAF estaria monitorando o nível do rio e que estaria tudo pronto para executar o lançamento; e

2) Há algumas construções da parte terrestre sendo executadas das Redes Metropolitanas, porém afirmou que não conseguiram evoluir mais do que foi feito, porque as condições do rio não somente não permitem o lançamento, como também não permitem a instalação de novos equipamentos pela rota, não havendo possibilidade de qualquer tipo de embarcação se deslocar até o Rio Solimões neste momento.

Em seguida, o **Sr. Leandro Guerra** apresentou as informações sobre o Plano de Implantação da Etapa 1 que envolve as Infovias 02, 03 e 04, cujo cronograma sobre o lançamento dos cabos, com o prazo de duração, previsões de início e de fim, bem como a presença de restrições hidrográficas e outras, encontra-se no *slide* abaixo reproduzido e por ele exibido, com a leitura das informações nele contidas:

Item

Descrição

5. PAIS ETAPA 01 – Plano de Implantação

✓ Implantação do cabo subaquático

	DURAÇÃO (lançamento do cabo)	INÍCIO	FIM	RESTRIÇÕES HIDROGRÁFICAS	RESTRIÇÕES Licença e Autorizações (Status)	
INFOVIA 03	18 dias	12/03/24	30/03/24**	Sem Restrições	IBAMA Em processo (LO) Emitido (LP) Emitido (LI)	MARINHA Emitido (PIP)
INFOVIA 04	10 dias	14/08/24	23/08/24	SET a MAR	IBAMA Emitido (LI) Emitido (LP)	MARINHA Emitido (PIP)
		PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM			
INFOVIA 02	29 dias	D0+10 dias*	D0+39 dias	JUL a NOV	IBAMA Emitido (LI) Emitido (LP)	MARINHA Emitido (PIP)

* Depende da abertura da janela de operação, devido as condições hidrográficas.

** A Infovia 03 foi implantada com exceção de AFUÁ e PONTA de PEDRAS.



E, da mesma maneira, o Sr. **Leandro Guerra** apresentou as informações sobre o Plano de Implantação da Etapa 2 que envolve as Infovias 05, 06 e 08, cujo cronograma sobre o lançamento dos cabos, com o prazo de duração, previsões de início, restrições hidrográficas e licenças/autorizações, foi exibido no seguinte *slide*:

E, da mesma maneira, o Sr. **Leandro Guerra** apresentou as informações sobre o Plano de Implantação da Etapa 2 que envolve as Infovias 05, 06 e 08, cujo cronograma sobre o lançamento dos cabos, com o prazo de duração, previsões de início, restrições hidrográficas e licenças/autorizações, foi exibido no seguinte *slide*:

Item	Descrição																													
	5. PAIS ETAPA 02 – Plano de Implantação • Infovia 05 – Inspeção Náutica e Terrestre concluída em 20/Set, relatório final em elaboração • Infovia 05 – Cabo óptico subaquático adquirido, com previsão de entrega Fev/25 • Infovia 05 – Licenciamento ambiental, processo iniciado no IBAMA em 03/Set (Ficha de Caracterização da atividade - FCA) • Infovia 06 e 08 – Inspeção náutica, previsão de início em Out/24 • Infovia 06 – Cabo óptico subaquático adquirido, com previsão de entrega Abr/25 • Infovia 08 – Cabo óptico subaquático adquirido, com previsão de entrega Jun/25 <table><thead><tr><th></th><th>DURAÇÃO (lançamento do cabo)</th><th>PREVISÃO INÍCIO</th><th>RESTRIÇÕES HIDROGRÁFICAS</th><th colspan="2">Licença e Autorizações (Status)</th></tr></thead><tbody><tr><td>INFOVIA 05</td><td>30 dias</td><td>D3+15 dias*</td><td>JUN a NOV</td><td>IBAMA</td><td>MARINHA</td></tr><tr><td>INFOVIA 06</td><td>60 dias</td><td>D4+15 dias*</td><td>JUN a NOV</td><td>IBAMA</td><td>MARINHA</td></tr><tr><td>INFOVIA 08</td><td>60 dias</td><td>D5+15 dias*</td><td>JUL a OUT</td><td>IBAMA</td><td>MARINHA</td></tr></tbody></table> *As datas planejadas de início de lançamento dependem essencialmente da emissão das licenças ambientais pelo IBAMA, autorização da Marinha e das condições hidrográficas.  A respeito do cronograma de implantação da Etapa 2, além das informações contidas no <i>slide</i> acima, o Sr. Leandro Guerra fez os seguintes destaques: 1) Acabaram de executar o Estudo de Viabilidade de Rota preliminar, isto é, a inspeção náutica e terrestre, concluída em 20 de setembro, cujo relatório final está em elaboração e, a partir desse relatório, poderão definir o tamanho dos cabos para que o fabricante efetue a produção de forma correta e assertiva; 2) Outro ponto importante da Infovia 05 é que a entidade já teria iniciado o processo de licenciamento junto ao Ibama no dia 03 de setembro; 3) A Infovia 05 teria uma duração de lançamento menor (30 dias) com uma rota de cerca de 1.200 km, já as Infovias 06 e 08 são as maiores desse projeto, com uma rota de praticamente 2.100 km cada uma, com um prazo de execução de 60 dias para cada. Com o objetivo mostrar o processo de evolução da transferência dos ativos das infovias para o Ministério das Comunicações, o Sr. Leandro Guerra exibiu o <i>slide</i> abaixo reproduzido:							DURAÇÃO (lançamento do cabo)	PREVISÃO INÍCIO	RESTRIÇÕES HIDROGRÁFICAS	Licença e Autorizações (Status)		INFOVIA 05	30 dias	D3+15 dias*	JUN a NOV	IBAMA	MARINHA	INFOVIA 06	60 dias	D4+15 dias*	JUN a NOV	IBAMA	MARINHA	INFOVIA 08	60 dias	D5+15 dias*	JUL a OUT	IBAMA	MARINHA
	DURAÇÃO (lançamento do cabo)	PREVISÃO INÍCIO	RESTRIÇÕES HIDROGRÁFICAS	Licença e Autorizações (Status)																										
INFOVIA 05	30 dias	D3+15 dias*	JUN a NOV	IBAMA	MARINHA																									
INFOVIA 06	60 dias	D4+15 dias*	JUN a NOV	IBAMA	MARINHA																									
INFOVIA 08	60 dias	D5+15 dias*	JUL a OUT	IBAMA	MARINHA																									

Item	Descrição
	5. PAIS Procedimento padronizado p/ transferência das infraestruturas Levantamento das infraestruturas Levantamento das garantias HW e prazos de SW  Inventário in loco   Termo de Declaração de Entrega assinado Anexos • Relação das infraestruturas vistoriadas • Detalhamento dos prazos das garantias e renovações de SW     Termo de Declaração de Entrega ajustado para a Infovia 03 – Fase 1 (Versão Final para assinatura do Mcom) Cronograma Infovia 03 Fase1 • Ago/24 – Levantamento das infraestruturas e NF's e evidências de instalação • Ago/24 - Protocolo SEI 12443148 (16/08/24) do Termo de Declaração de entrega e os Anexos p/ ANATEL e MCom • Ago/24 – Encaminhamento para MCom os locais dos Termos de autorização de uso de espaços/terrenos • Set/24 – Versão final do Termo de Declaração Infovia 03 fase 1 – Processo 53500.088928/2021-76 em 19/09 • Set/24 – Apresentação do SER* do módulo Inventário com toda a documentação complementar (garantias/Prazos SW/ Termos etc...) Cronograma Infovia 04 • Set/24 – Também foi iniciado o processo da Infovia 04, com levantamento das infraestruturas e NFs  *Sistema de Evidências Regulatória

Item	Descrição																								
	5. Compras – Aquisição de 10 emendas <table><tr><th colspan="3">Processo EAF_24_066 Aquisição de emendas:</th><th colspan="3">Proposta Final</th></tr><tr><th>Produto</th><th>Unidade Medida</th><th>Qte Estimada</th><th>USD Unitário</th><th>USD Total</th><th>R\$ Total Estimado</th></tr><tr><td>CEOS Modelo - Conjunto de Emenda Óptica Subaquática -</td><td>unitário</td><td>10</td><td>USD 5.310,00</td><td>USD 53.100,00</td><td>R\$ 291.354,39</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td colspan="2">USD 53.100,00</td><td>R\$ 291.354,39</td></tr></table> Taxa dólar 13/08/24 5,4869 https://www.bcb.gov.br/ Considerando o valor total acumulado da aquisição USD 13.117.516,82 (contratações anteriores + presente contratação), há obrigatoriedade de aprovação na AGE da EAF O Sr. Leandro Guerra afirmou que é necessário que esse processo de aquisição passe internamente por aprovação em Assembleia Geral, visto que supera o limite de governança para aprovação, nos termos dos valores apresentados no <i>slide</i> acima. Finalmente, o Sr. Leandro Guerra passou a reportar o sexto e último item de sua agenda, <u>Projeto Rede Privativa de Governo</u>, projetando a tabela abaixo que mostra a evolução das RFPs em andamento e indicadas na última Reunião Ordinária do GAISPI, com a previsão de concluir, até o final do mês de outubro, a análise de todas as propostas técnicas e negociação comercial para posterior adjudicação e contratação desses equipamentos e fornecedores:	Processo EAF_24_066 Aquisição de emendas:			Proposta Final			Produto	Unidade Medida	Qte Estimada	USD Unitário	USD Total	R\$ Total Estimado	CEOS Modelo - Conjunto de Emenda Óptica Subaquática -	unitário	10	USD 5.310,00	USD 53.100,00	R\$ 291.354,39	TOTAL			USD 53.100,00		R\$ 291.354,39
Processo EAF_24_066 Aquisição de emendas:			Proposta Final																						
Produto	Unidade Medida	Qte Estimada	USD Unitário	USD Total	R\$ Total Estimado																				
CEOS Modelo - Conjunto de Emenda Óptica Subaquática -	unitário	10	USD 5.310,00	USD 53.100,00	R\$ 291.354,39																				
TOTAL			USD 53.100,00		R\$ 291.354,39																				

Item	Descrição				
	6. Rede Privativa de Governo - RFPs em andamento				
		Móvel	Fixa		
		MCPTx	SDWAN	ROTEADORES	SWITCH
					Infra de PoPs
	Data de publicação	30/08 ✓	30/08 ✓	30/08 ✓	02/09 ✓
	Envio de questionamentos	06/09 ✓	06/09 ✓	11/09 ✓	06/09 ✓
	Envio de respostas aos fornecedores	13/09 ✓	23/09 ✓	23/09 ✓	23/09 ✓
	Envio de propostas técnica/comercial	25/09	30/09	30/09	30/09
	Análise das propostas técnicas e negociação comercial	23/10	30/10	30/10	30/10
					

Em seguida, com relação à Rede Privativa de Governo - Rede Fixa, o **Sr. Leandro Guerra** exibiu o *slide* abaixo e realizou a leitura das informações nele contidas:

Item	Descrição
	6. Rede Privativa de Governo – Rede Fixa ✓ 13/09/24 - reunião EAF, MCom e Coordenador GT Redes para início da discussão do modelo de contrato para contratação de infraestrutura passiva pela EAF e posterior transferência para a Telebrás ✓ EAF iniciou tratativas para uso da infraestrutura passiva com operadoras/potenciais fornecedoras ✓ 23/09/24 - EAF obteve acesso ao Sistema de Negociação de Oferta de Atacado (SNOA) para consulta de infraestrutura passiva (dutos, caixas de passagem, etc.) para a construção das redes nas capitais ✓ Com base na consulta ao SNOA, a EAF irá avaliar a oportunidade de uso das infraestruturas passivas e respectivas ORPAs e utiliza-las, se necessário, após avaliação técnica Acerca da reunião do dia 13 de setembro de 2024, o Sr. Leandro Guerra afirmou que esse ponto é muito importante porque a passagem de cabos, especialmente da fibra óptica, nas grandes capitais, é sempre um grande desafio para qualquer projeto de rede, de modo que a possibilidade de também poder utilizar uma infraestrutura passiva já existente agilizará e reduzirá os custos, existindo, portanto, uma grande oportunidade nesse sentido. O Secretário Executivo do GAISPI interrompeu a apresentação para registrar que entende que é bastante importante esse ponto, justamente por conta dessa preocupação de possíveis sobreposições desnecessárias de infra e afirmou que foi possível identificar a presença de fibras, em algumas cidades, seja por movimentos/projetos estaduais e/ou municipais ou também pelas operadoras PPPs e PMS, que poderiam passar por essa negociação por meio da locação ou venda de pares de fibra em um estrutura maior. Ainda nesse tema, Secretário Executivo do GAISPI afirmou que a maior preocupação, já externando esse avanço nesse mapeamento, seria justamente o GAISPI não ser pego por uma auditoria, e assim já ocorreu questionamentos da AGU sobre possíveis sobreposições com outras infras de Governo, de modo a evitar problemas de ter que responder a processos de auditoria por gastos desnecessários de infra, ressaltando o quanto é importante essa segurança e de ter o respaldo de que a sobreposição ou gastos desnecessários porque não foi identificada onde teria outra fibra e seja questionado. O Sr. Leandro Guerra manifestou concordância de que esse ponto da sinergia entre as infraestruturas existentes é muito importante e ressaltou também outro aspecto a ser considerado que diz respeito ao prazo de execução imposto pelo Edital para o mês de fevereiro de 2026. Afirmou que a entidade tem que observar/atender esse prazo e que existe uma preocupação em executar o projeto com qualidade, logicamente usando toda a infraestrutura possível e no menor custo possível, porém sem esquecer que há uma data-fim e que isso pode também ser um ponto de decisão. O Sr. Leandro Guerra registrou que a EAF estaria levantado, sim, esses aspectos e que, do lado do regulado, as operadoras que tem PMS e que tem a Oferta Pública, já teriam acesso ao sistema e conseguiriam enxergar a sinergia existente com o projeto da entidade e que logicamente priorizarão esse uso. Aduziu que, do ponto de vista financeiro, esse uso é interessante para o projeto e, também, em termos de prazo de execução, uma vez que o duto está ali disponível e que isso agilizaria a execução. Informou que, quando se fala das redes públicas existentes, governos estaduais e municípios, entende a preocupação levada pelo Secretário Executivo do GAISPI, mas que também colocaria esse ponto do prazo, sob o argumento de que, em um determinado momento, talvez seja necessário ter que tomar uma decisão se seguirão por um caminho ou por outro, alertando esse ponto, portanto ao Grupo, em função da experiência nesse tipo de compartilhamento.

Item	Descrição
	Retomando a sua apresentação, o Sr. Leandro Guerra exibiu o <i>slide</i> a seguir que mostra o cronograma da Rede Privativa Fixa em relação aos 320 pontos nas 27 capitais até o mês de dezembro de 2025: 6. Rede Privativa Fixa – Cronograma ref. 320 Pontos nas 27 capitais • Quando do recebimento dos pontos adicionais, a EAF irá avaliar os impactos técnicos apresentando o cronograma para atendimento • Prazo limite informado na nota técnica do MCom para confirmação dos pontos adicionais Abr/25 Em relação ao cronograma em tela, o Sr. Leandro Guerra informou, quanto aos pontos adicionais, que, de acordo com a deliberação do GAISPI e já informado pelo Ministério das Comunicações, haverá um faseamento da identificação dos demais pontos, de modo que, a medida em que forem recebendo essas informações, serão avaliados os impactos técnicos e também de tempo de execução, concluindo que não daria para tomar uma decisão e ter uma definição se é possível ou não. Lembrou ainda que há uma data final informada pela Nota Técnica do Ministério das Comunicações para confirmação dos pontos adicionais até o mês de abril de 2025, e destacou que teriam que trabalhar a medida em que forem acontecendo as coisas e que voltarão com esse reporte ao GAISPI, sempre que a EAF for recebendo a identificação desses pontos. O Sr. Leandro Guerra reforçou que se receberem o 6.180 pontos adicionais no mês de abril de 2025 ou próximo a essa data, não seria possível executar até o mês de fevereiro de 2026, visto que o volume seria muito grande e provavelmente não seria exequível no prazo do Edital, ressaltando que seria importante receber essas informações ao longo do tempo, para que a entidade possa executar tempestivamente esse projeto. Com relação à Rede Privativa de Governo - Rede Móvel, o Sr. Leandro Guerra exibiu o <i>slide</i> abaixo e, do mesmo modo, realizou a leitura das informações nele contidas:

Item	Descrição
	6. Rede Privativa de Governo – Rede Móvel ✓ EAF contratou a consultoria Accenture para desenvolvimento dos requisitos técnicos necessários para a negociação do acordo de Compartilhamento da Rede de Acesso ✓ 12/09/24 Reunião Accenture, EAF, Mcom e coordenador GT Redes para apresentação/discussão das primeiras considerações/propostas ✓ Previsão de término em meados de Out./2024  Por fim, o Sr. Leandro Guerra destacou a questão da Criptografia, projetando o <i>slide</i> abaixo reproduzido e realizando a leitura de suas informações:

Item	Descrição
	6. Rede Privativa de Governo – Criptografia ✓ 09/09/24 – EAF recebeu o Termo de Acordo de Cooperação Técnica entre ABIN, MCON e Anatel/GAISPI com a finalidade de implantar e implementar a funcionalidade de criptografia e desenvolver solução de comunicação segura para a Rede Privativa de Comunicação da Administração Pública Federal. ✓ 11/09/24 – Abin encaminhou o Ofício n.º 560/2024/GAB/DG/ABIN/CC/PR, com a minuta de Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação ("APPD&I") a ser celebrado entre a União, por intermédio da ABIN, a Universidade Federal do Ceará ("UFC"), a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura ("FCPC") e a EAF para a "cooperação técnica e científica entre os PARCEIROS para desenvolver o projeto DVCOM – "Plataforma de Comunicação Segura da Administração Pública Federal", a ser executado nos termos do plano de trabalho". ✓ 13/09/24 – EAF respondeu o referido ofício cópia em anexo, nos seguintes termos: ▪ Seu entendimento de que o APPD&I, tal como proposto, em razão da sua forma, do seu objeto e dos seus termos, não pode ser assinado pela Associação, na medida em que não se coaduna com o Edital e com o regime jurídico-regulatório que governa a atuação da EAF. ▪ Informa que a EAF pode celebrar contratos de aquisição de produtos/prestação de serviços, inclusive especializados, cujo escopo seja prévia e claramente bem definido e o valor seja pré-estabelecido de maneira adequada, sendo os pagamentos realizados mediante o recebimento do produto/serviço, com a observância de cronograma pormenorizado de entregas previsto contratualmente. <u>Próximos Passos:</u> Evolução no modelo de contratação aderente aos termos indicados pela EAF  Concluída a apresentação, o Secretário Executivo do GAISPI informou, no tocante à Criptografia, que a carta da EAF foi recebida e que concordam com essa preocupação da EAF e de todos, a fim de evitar risco jurídico nesse processo e nesse pagamento. Afirmou que estariam vendo uma proposta em que a governança e o <i>compliance</i> da EAF venham validar e atue de forma correta. Concedida a palavra, o Sr. Antônio Celso Guimarães Teixeira afirmou que o Ministério também estaria acompanhando esse tema da Criptografia e que ocorrerá uma reunião de alto nível para tratar o tema. Aduziu que, no seu ponto de vista, entende que a solução é possível e que é na linha do próprio plano de trabalho do ACT e dos produtos que lá estariam descritos e no aplicativo como algo concreto e entregável, sendo então um ajuste entre as partes, EAF e Abin, e que acredita que é perfeitamente possível de se chegar. Na sequência, o Secretário Executivo do GAISPI questionou se mais algum membro do GAISPI teria interesse em se manifestar. Não havendo manifestações adicionais, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 3 da Pauta.
3	O Secretário Executivo do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Takeshi Ikeda, Coordenador do GT-MIGRAÇÃO, para que fizesse um relato das atividades. O Sr. Takeshi Ikeda cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e deu início à apresentação sobre o relato das atividades do GT-MIGRAÇÃO, informando que no dia 18 de setembro de 2024 foi realizada a 8ª reunião do grupo, cujos assuntos tratados constam do <i>slide</i> por ele exibido e abaixo transcrito:

Item	Descrição
	Relato das atividades do GT-Migração/Mitigação Reunião do Grupo 8ª reunião GT-Migração/Mitigação – realizada em 18/09/2024 Assuntos tratados na reunião ordinária do GT - Instalação de 3,7M de TVRO na Banda Ku (data base: 18/09/2024) - Proposta de antecipação de 189 municípios - Relatórios EAF - 53500.070680/2024-30: todos aptos à antecipação. - TODOS os municípios do Estado de Minas Gerais - totalizando 23 UFs. - Faltam 4 UFs: BA, CE, PE e RN, - Total de 5.191 Municípios liberados. - Testes de Homologação e Qualidade (2182 amostras testadas) - Alteração do prazo de atendimento do item 5.8.1 da Diretriz de Migração - Portaria Anatel 2709 (10966717) – 5 para 15 dias (90% dos caso)   Sobre os assuntos tratados na 8ª reunião do GT-MIGRAÇÃO, o Sr. Takeshi Ikeda destacou, no tocante à alteração do prazo de atendimento do item 5.8.1 da Diretriz de Migração, que trata da questão dos pedidos dos usuários para fazer a migração da TVRO da Banda C para a Banda Ku, com o SLA de 5 para 15 dias em 90% dos casos, que a proposta da EAF foi a retirada total desse item e que, no entanto, durante as discussões do grupo, foi proposta essa flexibilização, com o aumento do prazo para atender esse pedido dos usuários que alegam interferência. Informou que um dos pontos trazidos pela EAF foi a dificuldade de caracterizar que a alegação dos usuários que dizem estar sofrendo interferência realmente estaria ocorrendo as interferências pelas estações do 5G na faixa de 3,5 GHz. Em seguida, o Sr. Takeshi Ikeda projetou o <i>slide</i> a seguir reproduzido que mostra todas as fases e, quanto à Fase 6, destacou que faltam os estados de Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco, representados em amarelo no mapa:

Item	Descrição
	GT-Migração/Mitigação  FASE 1 1.000 municípios liberados 100%  FASE 2 1.000 municípios liberados 100%  FASE 3 1.000 municípios liberados 100%  FASE 4 1.000 municípios liberados 100%  FASE 5 1.000 municípios liberados 100%  FASE 6 1.000 municípios liberados 100%  Na sequência, o Sr. Takeshi Ikeda exibiu o <i>slide</i> abaixo, destacando as informações nele contidas em relação à Fase 6-D, com os 189 municípios liberados no mês de setembro; bem como o mapa do Brasil acima que mostra as Fases 5 e 6 e o mapa do Brasil abaixo que mostra os estados faltantes da Fase 6 (Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte), e registrou que, a partir da deliberação de hoje, faltarão 379 municípios:

Item

Descrição

Relato das atividades do GT-Migração/Mitigação

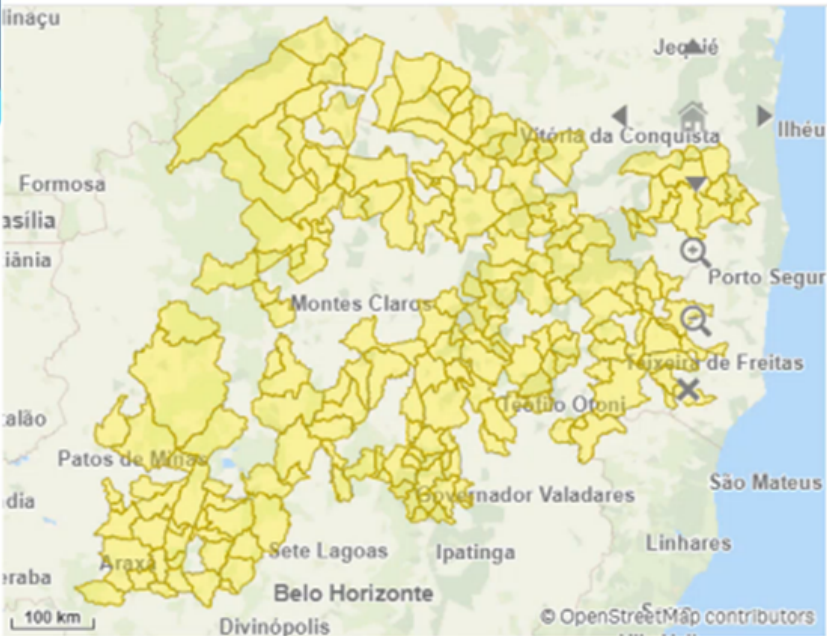
FASE	MÊS DE LIBERAÇÃO	ESTADOS LIBERADOS	QUANTIDADE MUNICÍPIOS
FASE 5 A	abr/24	MA; ES; SE	220
FASE 5 B	mai/24	PB; RO; TO	236
FASE 5 C	jun/24	AC; AM; GO	168
FASE 6 A / 6 B	jul/24	MS	506
FASE 6 C	ago/24	MT; PA; PI	194
FASE 6 D	set/24	MG	189
FASE 6 E	out/24	CE; RN; PE	189
FASE 6 F	nov/24	BA	190

Faltam 379 municípios

Fase 6 – 1.268 municípios

ANATEL

Com o intuito de detalhar a Fase 6-D, o Sr. Takeshi Ikeda projetou o slide abaixo reproduzido, que mostra o mapa do Brasil nessa fase:

Item	Descrição						
	GT-Migração/Mitigação <table><thead><tr><th>UF</th><th>MUNICÍPIOS</th></tr></thead><tbody><tr><td>BA</td><td>35</td></tr><tr><td>MG</td><td>154</td></tr></tbody></table> FASE 6-D 189 Municípios Iniciado TVRO em 02/09/2024 	UF	MUNICÍPIOS	BA	35	MG	154
UF	MUNICÍPIOS						
BA	35						
MG	154						

Ato contínuo, o Sr. Takeshi Ikeda exibiu um gráfico que mostra a evolução da liberação da faixa de 3,5 GHz, destacando as informações nele contidas:

Item	Descrição								
	Relato das atividades do GT-Migração/Mitigação Evolução Liberação da faixa de 3,5 GHz <table><thead><tr><th>Item</th><th>Descrição</th></tr></thead><tbody><tr><td>Municípios Liberados</td><td>5.191 (~93,2% - incluindo deliberação)</td></tr><tr><td>FASE 6-D</td><td>189 Municípios (3,39%)</td></tr><tr><td>FASE 6 - Faltam</td><td>379 Municípios (6,8%)</td></tr></tbody></table> Ainda nesse contexto, o Sr. Takeshi Ikeda finalizou a sua apresentação exibindo o gráfico abaixo que mostra a população nesses municípios:	Item	Descrição	Municípios Liberados	5.191 (~93,2% - incluindo deliberação)	FASE 6-D	189 Municípios (3,39%)	FASE 6 - Faltam	379 Municípios (6,8%)
Item	Descrição								
Municípios Liberados	5.191 (~93,2% - incluindo deliberação)								
FASE 6-D	189 Municípios (3,39%)								
FASE 6 - Faltam	379 Municípios (6,8%)								

Item	Descrição										
	Relato das atividades do GT-Migração/Mitigação Liberação da faixa de 3,5 GHz <table><thead><tr><th>Item</th><th>Descrição</th></tr></thead><tbody><tr><td>Municípios Liberados</td><td>5.191 (~93,2% - incluindo deliberação)</td></tr><tr><td>FASE 6-D</td><td>189 Municípios (3,39%)</td></tr><tr><td>FASE 6 - Faltam</td><td>379 Municípios (6,8%)</td></tr></tbody></table> Concluída a apresentação, o Secretário Executivo do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apresentado. Não havendo manifestações, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 4 da Pauta. <tr><td>4</td><td> O Secretário Executivo do GAISPI registrou que, conforme apresentado pelo Sr. Takeshi Ikeda, Coordenador do GT-MIGRAÇÃO, os requisitos que permitem deliberar a antecipação da liberação da faixa de 3,5 GHz em mais 189 cidades foram atingidos. Prosseguiu afirmando que, de acordo com o item 6.3.1 do Anexo IV do Edital e a alínea “q” do item 9 do Anexo IV-A do Edital, caberia ao GAISPI decidir se o início do uso da faixa de 3,5 GHz poderá ser antecipado, individualmente por grupo ou em polígonos. O Secretário Executivo do GAISPI, dessa forma, considerando o exposto, colocou em deliberação a proposta de antecipação da liberação do uso da faixa de radiofrequências a partir do dia 30 de setembro nas 189 cidades, questionando aos membros do GAISPI se estariam todos de acordo com a proposta. Não havendo manifestações, o Secretário Executivo do GAISPI declarou que fica aprovada a antecipação da liberação do uso da faixa de 3,5 GHz a partir do dia 30 de setembro de 2024 nas 189 novas cidades já apresentadas. Também determinou que a Secretaria Executiva do GAISPI anexasse a lista dessas cidades à Ata da presente Reunião. Na sequência, o Secretário Executivo do GAISPI ressaltou que, com a presente deliberação, todos os municípios do estado de Minas Gerais foram liberados, totalizando 23 estados brasileiros completamente liberados. Informou que, até o momento, já contam com 5.191 municípios liberados para uso do 3,5 GHz com 5G <i>standalone</i>, e que, com isso, a população dessas cidades totaliza aproximadamente 204,6 milhões de brasileiros, representando pouco mais de 96% da população brasileira, que, agora, possui potencial de atendimento pelas prestadoras, nos prazos que seus modelos estratégicos e de investimentos considerarem mais oportunos. </td></tr>	Item	Descrição	Municípios Liberados	5.191 (~93,2% - incluindo deliberação)	FASE 6-D	189 Municípios (3,39%)	FASE 6 - Faltam	379 Municípios (6,8%)	4	O Secretário Executivo do GAISPI registrou que, conforme apresentado pelo Sr. Takeshi Ikeda, Coordenador do GT-MIGRAÇÃO, os requisitos que permitem deliberar a antecipação da liberação da faixa de 3,5 GHz em mais 189 cidades foram atingidos. Prosseguiu afirmando que, de acordo com o item 6.3.1 do Anexo IV do Edital e a alínea “q” do item 9 do Anexo IV-A do Edital, caberia ao GAISPI decidir se o início do uso da faixa de 3,5 GHz poderá ser antecipado, individualmente por grupo ou em polígonos. O Secretário Executivo do GAISPI, dessa forma, considerando o exposto, colocou em deliberação a proposta de antecipação da liberação do uso da faixa de radiofrequências a partir do dia 30 de setembro nas 189 cidades, questionando aos membros do GAISPI se estariam todos de acordo com a proposta. Não havendo manifestações, o Secretário Executivo do GAISPI declarou que fica aprovada a antecipação da liberação do uso da faixa de 3,5 GHz a partir do dia 30 de setembro de 2024 nas 189 novas cidades já apresentadas. Também determinou que a Secretaria Executiva do GAISPI anexasse a lista dessas cidades à Ata da presente Reunião. Na sequência, o Secretário Executivo do GAISPI ressaltou que, com a presente deliberação, todos os municípios do estado de Minas Gerais foram liberados, totalizando 23 estados brasileiros completamente liberados. Informou que, até o momento, já contam com 5.191 municípios liberados para uso do 3,5 GHz com 5G <i>standalone</i>, e que, com isso, a população dessas cidades totaliza aproximadamente 204,6 milhões de brasileiros, representando pouco mais de 96% da população brasileira, que, agora, possui potencial de atendimento pelas prestadoras, nos prazos que seus modelos estratégicos e de investimentos considerarem mais oportunos.
Item	Descrição										
Municípios Liberados	5.191 (~93,2% - incluindo deliberação)										
FASE 6-D	189 Municípios (3,39%)										
FASE 6 - Faltam	379 Municípios (6,8%)										
4	O Secretário Executivo do GAISPI registrou que, conforme apresentado pelo Sr. Takeshi Ikeda, Coordenador do GT-MIGRAÇÃO, os requisitos que permitem deliberar a antecipação da liberação da faixa de 3,5 GHz em mais 189 cidades foram atingidos. Prosseguiu afirmando que, de acordo com o item 6.3.1 do Anexo IV do Edital e a alínea “q” do item 9 do Anexo IV-A do Edital, caberia ao GAISPI decidir se o início do uso da faixa de 3,5 GHz poderá ser antecipado, individualmente por grupo ou em polígonos. O Secretário Executivo do GAISPI, dessa forma, considerando o exposto, colocou em deliberação a proposta de antecipação da liberação do uso da faixa de radiofrequências a partir do dia 30 de setembro nas 189 cidades, questionando aos membros do GAISPI se estariam todos de acordo com a proposta. Não havendo manifestações, o Secretário Executivo do GAISPI declarou que fica aprovada a antecipação da liberação do uso da faixa de 3,5 GHz a partir do dia 30 de setembro de 2024 nas 189 novas cidades já apresentadas. Também determinou que a Secretaria Executiva do GAISPI anexasse a lista dessas cidades à Ata da presente Reunião. Na sequência, o Secretário Executivo do GAISPI ressaltou que, com a presente deliberação, todos os municípios do estado de Minas Gerais foram liberados, totalizando 23 estados brasileiros completamente liberados. Informou que, até o momento, já contam com 5.191 municípios liberados para uso do 3,5 GHz com 5G <i>standalone</i>, e que, com isso, a população dessas cidades totaliza aproximadamente 204,6 milhões de brasileiros, representando pouco mais de 96% da população brasileira, que, agora, possui potencial de atendimento pelas prestadoras, nos prazos que seus modelos estratégicos e de investimentos considerarem mais oportunos.										

Item	Descrição
	Finalmente, o Secretário Executivo do GAISPI registrou que é importante lembrar que essas antecipações não alteram o cronograma de atendimento das obrigações de instalação de ERBs, que continua como previsto no Edital, tanto para cidades maiores quanto para as de menor população. Concluída a deliberação, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 5 da Pauta.
5	O Secretário Executivo do GAISPI propôs que, conforme apresentado pelo Sr. Takeshi Ikeda, Coordenador do GT-MIGRAÇÃO, a alteração do prazo de atendimento de pedidos dos beneficiários elegíveis que possam estar com interferência na faixa de 3,5 GHz, de 5 dias para 15 dias, para colocar o seu kit em Ku. Nesse sentido, o Secretário Executivo do GAISPI destacou que, de acordo com a alínea “b” do item 9 do Anexo IV-A do Edital, caberia ao GAISPI disciplinar e fiscalizar as atividades da EAF, conforme as obrigações previstas. O Secretário Executivo do GAISPI, desta forma, considerando o exposto, colocou em deliberação a proposta apresentada e discutida no GT no sentido de alterar o prazo previsto na Diretriz de atendimento desses possíveis beneficiários de 5 dias para 15 dias, cuja recepção do sinal de TV aberta e gratuita oferecido pelas antenas parabólicas na Banda C possam ter qualquer tipo de prejuízo ou de interferência em seus receptores, para então antecipar o seu kit em Banda Ku, com essa previsão flexível de 5 para 15 dias. Questionou aos membros do GAISPI se estariam todos de acordo com a proposta. Não havendo manifestações, o Secretário Executivo do GAISPI declarou que fica aprovada a alteração do prazo de atendimento de 5 dias para 15 dias dos pedidos dos beneficiários elegíveis, cuja recepção do sinal de TV aberta e gratuita, por meio de antenas parabólicas na Banda C, sofra qualquer interferência em razão da entrada em operação de estações rádio base em 3,5 GHz prevista no item 5.8.1 da Diretriz de Migração. Solicitou à Secretaria Executiva do GAISPI que providenciasse a alteração em Portaria. Concluída a deliberação, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 6 da Pauta.
6	O Secretário Executivo do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Sidney Azeredo Nince, Coordenador do GT-PAIS, para que fizesse um breve relato sobre as atividades no âmbito do GT. O Sr. Sidney Azeredo Nince cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e deu início à apresentação sobre o relato das atividades do GT-PAIS sobre a Infovia 03 (Macapá/Belém), com os seguintes destaques: 1) Informou que já foram feitas as Redes Metropolitanas em Breves e Curralinho, bem como o lançamento da rota expressa Macapá/Belém com 587 km; 2) Afirmou que esta semana será encaminhado o Termo de Declaração e Entrega do que já foi lançado/concluído para o Ministério das Comunicações; 3) Haveria a previsão de uma segunda fase da Infovia 03, que incluirá: duas rotas ramificadas interligando Macapá a Afuá com 156 km, e Ponta de Pedras a Belém com 74 km; bem como as Redes Metropolitanas em Afuá, Ponta de Pedras e Belém; e 4) Destacou a deliberação tomada pelo GAISPI em sua última Reunião, possibilitando a inclusão de um trecho adicional que aumentará bastante a resiliência, fazendo um anel no trecho final da Infovia 03 entre Curralinho e Belém. Reforçou que, coincidentemente, após essa decisão, surgiu um terceiro incidente nesse trecho, o que demonstra o quão acertada foi a deliberação. No que se refere à Infovia 04, o Sr. Sidney Azeredo Nince fez os seguintes destaques: 1) Relembrou que foram concluídas as Redes Metropolitanas em Boa Vista, Caracará, Santa Maria do Boiaçu e Vila de Moura, ou seja, em todas as localidades previstas, bem como o lançamento do trecho subaquático de Vila de Moura até Caracará com 465 km; 2) Aguardam a autorização do DNIT para o lançamento do trecho terrestre ao longo da rodovia entre Caracará e Boa Vista com 140 km de cabos ópticos; e 3) Deram início ao processo de transferência da infraestrutura que já foi concluída para o Ministério das Comunicações. A respeito da Etapa 02, que contempla as três últimas Infovias previstas no projeto PAIS, o Sr. Sidney Azeredo Nince fez os seguintes destaques: 1) Houve a conclusão da inspeção preliminar da Infovia 05 no Rio Madeira, registrando que essa infovia se conecta com a Infovia 01 em Autazes; 2) Afirmou que essa inspeção preliminar foi executada com a navegação <i>in loco</i> no rio com o objetivo de estabelecer alguns parâmetros preliminares para o Estudo de Viabilidade e que o relatório estaria em elaboração, ressaltando, entretanto, que já foi permitido iniciar o licenciamento ambiental da Infovia 05 no Rio Madeira com essas informações preliminares; e 3) Estaria previsto para o mês de outubro essa mesma inspeção preliminar para a Infovia 06 no Rio Juruá e para a Infovia 08 no Rio Purus. Concluída a apresentação, o Secretário Executivo do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apresentado. Não havendo manifestações e considerando que neste item não há deliberações, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 7 da Pauta.

Item	Descrição
7	O Secretário Executivo do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Marcos Vieira Baeta Neves, Coordenador do GT-REDE, para que fizesse um relato das atividades. O Sr. Marcos Vieira Baeta Neves cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e deu início à apresentação sobre o relato das atividades do GT-REDE, ressaltando que o Sr. Leandro Guerra, em sua apresentação, já teria feito um relato pormenorizado e que, portanto, acrescentaria alguns pontos, a saber: 1) Informou que o GT-REDE se reuniu na véspera desta Reunião e, especificamente sobre o acordo com a Abin, registrou que o ACT foi assinado no último dia 06 pelo Ministério, Anatel e Abin, de modo que já estaria definida a Abin como órgão responsável para cumprir os itens do Edital; 2) Estariam trabalhando, paralelamente, conforme previsto no ACT, com a Portaria que será expedida pelo Ministério e complementar o item 1.4.4 que também traz os requisitos de criptografia; 3) Também teriam a questão da definição do contrato e como será feita a contratação entre a EAF e a Abin e que, conforme exposto pelo Sr. Leandro Guerra, teria essa questão em discussão, visto que a forma proposta inicialmente por eles não foi entendida como viável pela EAF, e, portanto, em paralelo, estariam verificando como essa questão será endereçada. Registrou que, conforme manifestação do Sr. Antônio Celso Guimarães Teixeira, também entende que não seria um grande problema, mas, sim, uma questão de afinar os formatos; 4) Afirmou que, inclusive, essa é uma questão que estariam enfrentando em outros pontos, conforme comentado pelo Sr. Leandro Guerra, referente à definição da forma de contrato para a Telebrás assumir, por exemplo, com as distribuidoras de energia, quando fizer compartilhamento de dutos, e até o compartilhamento da rede de acesso para a rede móvel, de modo que afirmou que estariam trabalhando em várias linhas e várias frentes em paralelo; 5) Reiterou, conforme apresentação do Sr. Leandro Guerra, que o procedimento da RFP estaria bem adiantado e andando em ritmo bom, e afirmou que entende que esse passo será cumprido nos próximos dias também, o que seria uma boa notícia, e que ela já considera aquela alteração que foi feita pelo Ministério e que as RFPs já saíram sem a restrição quanto aos fornecedores; 6) Registrou, quanto a outro ponto colocado pelo Secretário Executivo do GAISPI nesta Reunião sobre eventual sobreposição de redes, especialmente redes de governo, que teriam que ter em vista a questão de prazo até o mês de fevereiro de 2026, conforme ponderado pelo Sr. Leandro Guerra, e que estariam trabalhando para verificar uma forma de garantir um atendimento pleno do Edital; e, por fim, 7) Informou que houve um alinhamento sobre o fluxo para a Telebrás encaminhar informações sobre os pontos da rede fixa, definindo um fluxo de discussão com a EAF e depois passar pelo GT. Concluída a apresentação, o Secretário Executivo do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apresentado. Não havendo manifestações e considerando que neste item não há deliberações, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 8 da Pauta.
8	O Secretário Executivo do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Henrique Gomes Pinheiro, Coordenador do GT-COM, para que fizesse um breve relato das atividades em andamento. O Sr. Henrique Gomes Pinheiro cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e deu início à apresentação sobre o relato das atividades do GT-COM, informando que o grupo se reuniu na última sexta-feira, dia 20 de setembro de 2024, ressaltando que se trata de uma reunião realizada bimestralmente, ocasião em que fizeram o acompanhamento do andamento das ações de comunicação e atendimento da EAF, com destaque para o processo de reinstalações no Rio Grande do Sul. Sobre esse processo no Rio Grande do Sul, o Sr. Henrique Gomes Pinheiro informou que ele já teria se iniciado, com a formação de lideranças, a atuação junto aos CRAS e demais agentes públicos, o mapeamento do estado de cada um dos municípios e até de regiões de cada município que já poderiam receber esse agendamento, ressaltando que há regiões em que ainda não é possível realizar a reinstalação. Afirmou que a EAF tem feito esse monitoramento e trabalho para que isso continue. O Sr. Henrique Gomes Pinheiro registrou que, no restante do País, a EAF vem atuando com a comunicação em aproximadamente 1.700 cidades, seguindo para a reta final com números expressivos e crescentes de instalação. Por fim, o Sr. Henrique Gomes Pinheiro destacou que o serviço de atendimento da EAF estaria como finalista do prêmio que está sendo oferecido de atendimento ao consumidor da plataforma “Reclame Aqui”, comprovando, mais uma vez, a qualidade do trabalho executado pela EAF. Concedida a palavra, o Sr. Leandro Guerra registrou que a entidade se orgulha muito de estar nessa reta final do “Reclame Aqui”, por saber que isso não é fácil, ressaltando que é um reconhecimento pela qualidade do atendimento do <i>Call Center</i> e de todos os canais de atendimento da entidade. Esclareceu que se trata de um processo de eleição, em que todo voto conta, de modo que fez um apelo aos colegas para que, quem puder, reforçar essa votação será bem-vindo. Concluiu afirmando, ainda, que somente o fato de a entidade ter sido indicada para essa premiação já seria um ponto de orgulho para a EAF e para todo o processo do GAISPI e de todos os colegas. O Secretário Executivo do GAISPI registrou que é importante destacar e enaltecer o trabalho positivo e que essa é uma boa notícia, questionando quando seria divulgado o resultado.

Item	Descrição
	A Sra. Patrícia de Oliveira Abreu esclareceu que a votação termina no final do mês de outubro e que deve ter um evento de entrega do prêmio em meados de novembro ou início de dezembro, ainda não agendado. Destacou, a título de enriquecimento da informação, que eles elegem as empresas que são as finalistas que irão para voto popular, com base no histórico de notas, registrando que a nota da entidade estaria sempre acima de 8, o que é considerada uma nota boa e que a própria plataforma recomenda a Siga Antenado, denominação que a entidade se apresenta nessa plataforma, em função do atendimento aos beneficiários. A Sra. Patrícia de Oliveira Abreu afirmou que eles avaliam o processo como um todo, tendo um peso muito grande no <i>Call Center</i>, conforme colocado pelo Sr. Leandro Guerra e pelo Sr. Henrique Gomes Pinheiro, e ressaltou que, se há algum ponto a ser tratado, a entidade envolve a rede de instaladores e ali também o atendimento se consolida, entendendo, portanto, que se trata de uma avaliação do fluxo completo de atendimento ao beneficiário. O Sr. Leandro Guerra destacou também que isso foi antes da evolução da entidade como atendimento, visto que acabaram, há pouco mais de 1 mês, de migrar o sistema de CRM para um sistema próprio que melhora ainda mais a qualidade, além de implementar uma plataforma do <i>WhatsApp</i> bem moderna que estaria auxiliando para melhorar e incrementar ainda mais a qualidade do atendimento. Concluída a apresentação, o Secretário Executivo do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apresentado. Não havendo manifestações e considerando que neste item não há deliberações, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 9 da Pauta.
9	O Secretário Executivo do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se possuíam outro assunto que quisessem tratar na presente Reunião. Não havendo manifestações, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 10 da Pauta.
10	O Secretário Executivo do GAISPI propôs que a próxima Reunião Ordinária do GAISPI seja realizada no dia 30 de outubro de 2024 (quarta-feira) às 10:00h, de forma remota, questionando aos membros do GAISPI se estariam todos de acordo com essa data. Não havendo manifestações, o Secretário Executivo do GAISPI declarou que fica definida a data da 33ª Reunião Ordinária do GAISPI para o dia 30 de outubro de 2024 (quarta-feira) às 10:00h, de forma remota. Concluídos os assuntos constantes da Pauta, o Secretário Executivo do GAISPI agradeceu a presença e o empenho de todos os membros e declarou encerrada a 32ª Reunião Ordinária do Grupo.

4. APROVAÇÃO

4.1. Segue a presente Ata de Reunião assinada eletronicamente pelos participantes acima identificados e aprovada na 33ª Reunião Ordinária do GAISPI, realizada em 30 de outubro de 2024.
